

2号機燃料取り出しに向けた工事の進捗について

2025年4月24日


TEPCO

東京電力ホールディングス株式会社

2. 燃料取扱設備の製作状況

- 2025年4月8日に燃料取扱設備の工場出荷前最終試験が完了。
- 2025年5月下旬※の燃料取扱設備工場出荷に向け、海上輸送に備えた梱包を実施中。
- 燃料取扱設備を海上輸送にて1F港湾に搬入し、1F港湾からスーパーキャリアで2号機燃料取り出し用構台近傍に運搬。その後、燃料取り出し用構台にクレーンで吊り込む計画。

※気象条件（波・風）により日程変更の可能性有

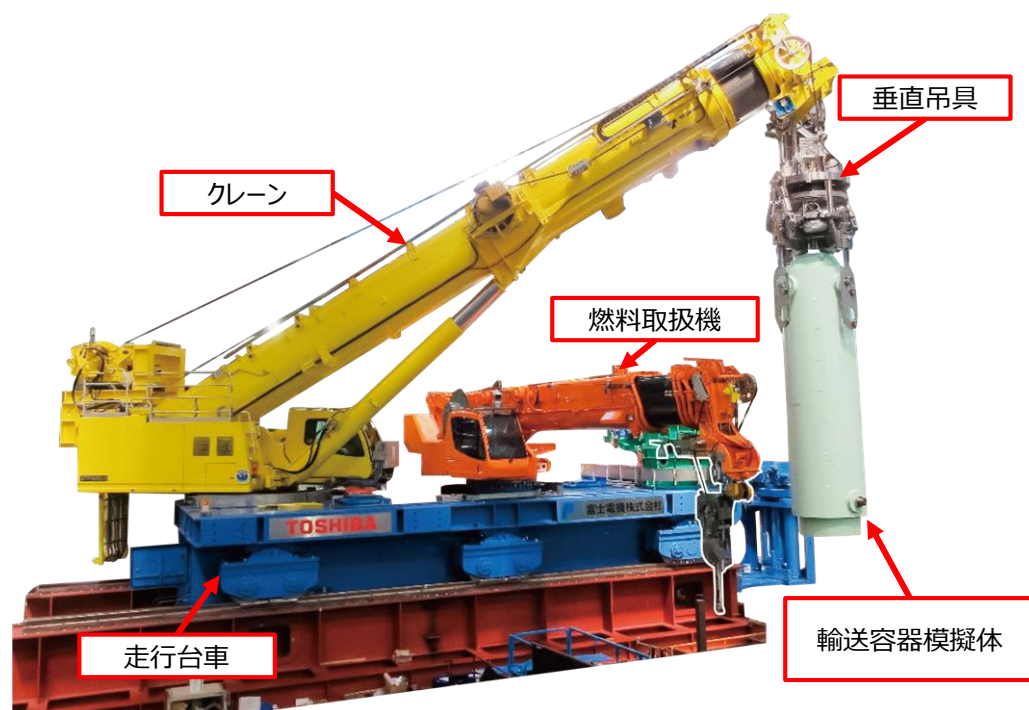

燃料取扱設備




3. 使用済燃料プール浄化装置設置工事


- 2025年4月14日から使用済燃料プール浄化装置の設置作業を開始。
- 4月18日に設置作業が完了し，4月21日に試運転を行い使用可能であることを確認。



浄化装置設置箇所

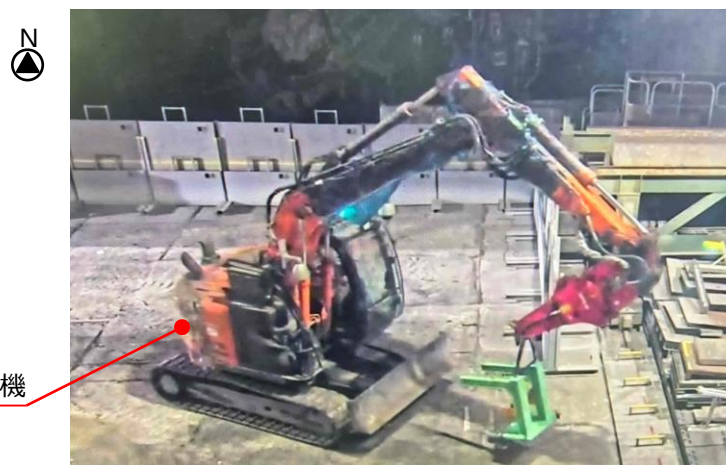

浄化装置設置状況（撮影2025.4.15）

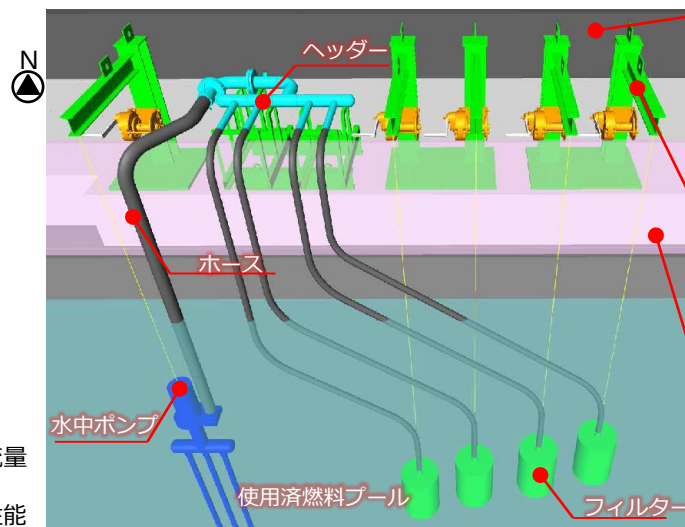


側から見た浄化装置イメージ

Box遮蔽

フィルタ交換治具

設置治具

異物混入防止フェンス

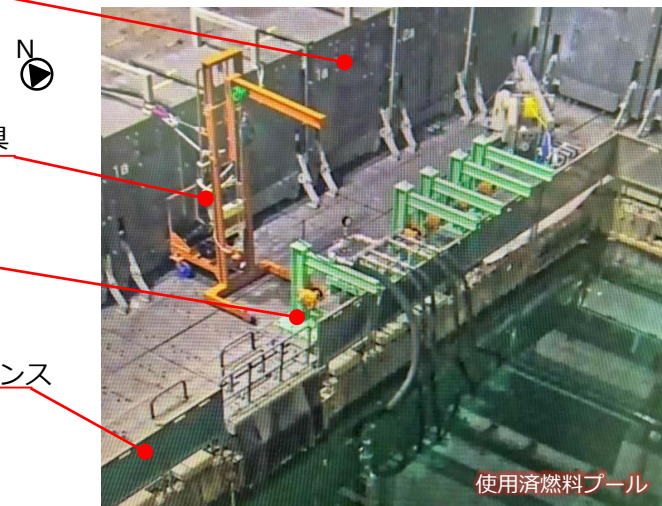


浄化装置設置状況（撮影2025.4.22）

装置仕様
水中ポンプ流量
45m³/h
フィルター性能
3～5μm

4. 今後のスケジュール

- 2026年度までに開始する燃料取り出し作業に向けて、現時点で順調に進捗。
- 安全最優先に作業を進めてまいります。

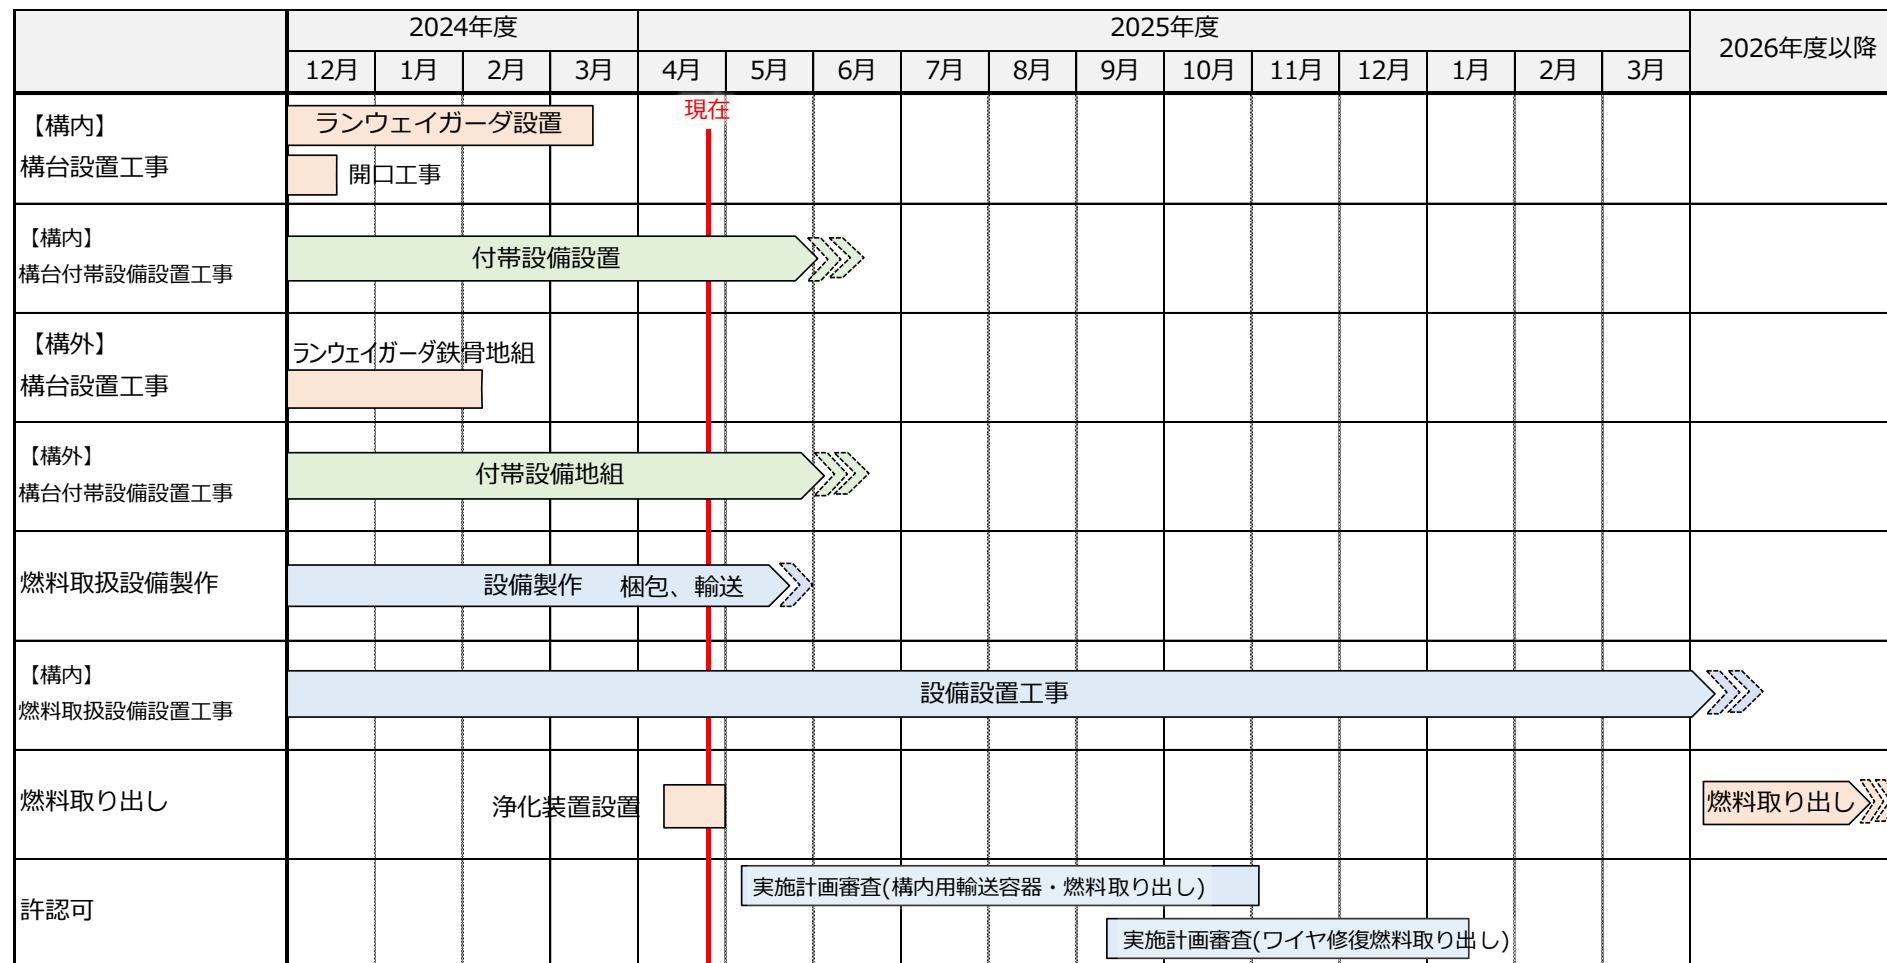

※工程の進捗により変更する可能性有

※線表については、準備・片付け作業期間含む
