


汚染水対策スケジュール（1/2）

出 発 点	迄 り	汚染水 対 策 分 野	実施中長期実行プラン2025目標工程	対象設備・ 作業内容	これまで1ヶ月の動きと今後6ヶ月の予定	9月						10月						11月			12月			1月			2月			3月			4月以降	備 考
						1	7	14	21	28	1	5	12	19	26	1	9	17	1	9	17	1	9	17	1	9	17	1	9	17				
汚染水 対 策 分 野	●建屋滞留水の処理	建屋内滞留水		【1～4号機 滞留水移送装置】 （実績） ・1～4号機滞留水移送装置運転 （予定） ・1～4号機滞留水移送装置運転	現場作業	1～4号機滞留水移送装置設置 運転																								（継続運転）			プロセス主建屋・高温焼却炉建屋滞留水移送装置の設置に係る実施計画変更（2025年6月27日認可）	
				【α核種除去設備検討】	設計・工事	詳細設計・工事																								（2027年度工事完了予定）			α核種除去設備の設置に係る実施計画変更（2024年6月27日申請）	
				【1～4号機 T/B床面スラッジ等の回収方法検討】	設計・検討	設計検討																												
				【滞留水－特貯留設備】	設計・工事	詳細設計・工事																								（2026年度工事完了予定）			建屋滞留水－特貯留設備の設置に係る実施計画変更（2025年1月21日認可）	
				【プロセス主建屋・高温焼却建屋セオライト土質の検討】	容器封入作業 詳細設計・工事 集積作業 詳細設計・工事	暫手時期調整中																								容器封入作業 実績確認モックアップ（2023年9月～） 容器封入作業 実施計画変更（2023年3月31日申請） 容器封入作業の暫手時期は1年程度の遅れとなる見込みであるが、現在精査中。 集積作業開始（2025年3月20日）				
汚染水 対 策 分 野	●汚染水発生量を 50～70m3/日程度に 抑制(2028年度末)	浄化設備		【施設多核種除去設備】 【高性能多核種除去設備】 【増設多核種除去設備】 （実績） ・処理運転 （予定） ・処理運転	現場作業	処理運転（処理水の状況に応じて適宜運転または処理停止）																								（継続運転）			前処理水及びタンクのインサービス状況に応じて適宜運転 または処理停止 増設多核種除去設備 前処理設備改造に係る実施計画変更申請（2022年4月28日認可） 使用前検査終了証受領 2024年5月31日 濃縮液の試験的先行処理実施中 前処理設備改造後のH-T試験を実施中	
				【サブドレン浄化設備】 （実績） ・処理運転 （予定） ・処理運転	現場作業	処理運転																								（継続運転）				
				【地下水バイパス設備】 （実績） ・運転 （予定） ・運転	現場作業	運転																								（継続運転）			2026年7月4日、排水弁の点検完了、母液再結晶済み	
				【セシウム吸着装置】 【第二セシウム吸着装置】 【第三セシウム吸着装置】 （実績） ・処理運転 （予定） ・処理運転	現場作業	処理運転																								（継続運転）				
				【RO-3】 【建屋内FO 処理設備】 （実績） ・運転 （予定） ・運転	現場作業	運転																								（継続運転）				
		陸側逆水壁		（実績） ・維持管理運転 （予定） ・維持管理運転	現場作業	維持管理運転																								（継続運転）				
					フェーシング（陸側逆水壁内エリア）	現場作業	2号機建屋西側、1／2号機東側																											
					1-4号機建屋周辺トレンチ調査	現場作業																												2025年5月1日 2025年度調査開始 2025年6月30日 2025年度調査完了
					建屋間ギャップ部止水対策	現場作業																									【3号機】 2026年3月：完了予定			2024年7月16日準備工事開始 （2025年度：6箇所/6箇所完了予定）
					●タンク関連	タンク解体	H4エリアNo. 5タンクからの漏えい対策	（実績・予定） ・汚染の拡散状況把握	現場作業	モニタリング																								（継続実施）
タンク解体	（実績） ・解体基数 48基/49基 ・Eエリアフランジタンク（D1）内の残水回収（スラッジ含む） 実施中 （予定） ・Eエリアフランジタンク解体工事 ：49基解体予定（2026年3月頃） ・Eエリアフランジタンク（D1）内の残水回収	現場作業	Eエリアフランジタンク解体工事 Eエリアフランジタンク（D1）内の残水回収																								（2025年度タンク解体完了予定） *D 1タンク以外は解体完了済み			2018年9月10日 E エリアにおける中低濃度タンクの撤去等について（実施計画変更認可） 2024年7月17日：D 2タンク解体完了 2025年1月9日：E エリアD1タンク内のスラッジ回収作業開始 2025年3月21日：タンク内でのスラッジ回収作業開始 2025年7月以降も回収作業を継続				
	（実績） ・J 9エリアタンク解体基数 12基/12基 （予定） ・J&J9エリアタンク解体工事	現場作業	タンク解体作業 （9/3）J 9エリアタンク：12基目解体完了																											2025年2月3日：実施計画認可 2025年2月14日：解体作業開始 2025年9月3日：J 9エリアタンク解体完了				
	（実績） ・解体基数 10基/367基 （予定） ・横置きタンク解体工事	現場作業																												横置きタンクの解体に係る実施計画変更（2024年5月17日認可） 2024年10月10日未使用タンクの搬入実施 2024年11月：未使用タンクから除染解体試験開始 10基/28基 未使用タンク解体完了 2025年2月3日に発生した火災トラブルにより現場作業中断中。（再開時期未定） 6月12日 火災発生原因と対策の方向性について公表。				
●自然災害対策	津波対策	○サブドレン集水設備高台機能移転（実績・予定）ろ過水タンク西側設備工事実施（完了） 増設改修（完了） 集水設備設置（10基）（完了） 移送設備設置	現場作業	サブドレン集水設備高台機能移転工事																								実施期間調整中			2023年10月20日 サブドレン集水設備及び地下水ドレン設備の津波対策に伴うT.P.33.5m壁への移設について（実施計画変更申請）→ 2024年11月1日 変更申請認可 2025年3月17日～19日 使用前検査一部受検完了（高台集水タンク） 2025年6月25日 建設作業完了 8.5m壁受けタンク設置エリアの見直し（検討中）に伴う工事期間の延伸			

廃炉中長期実行プラン2025

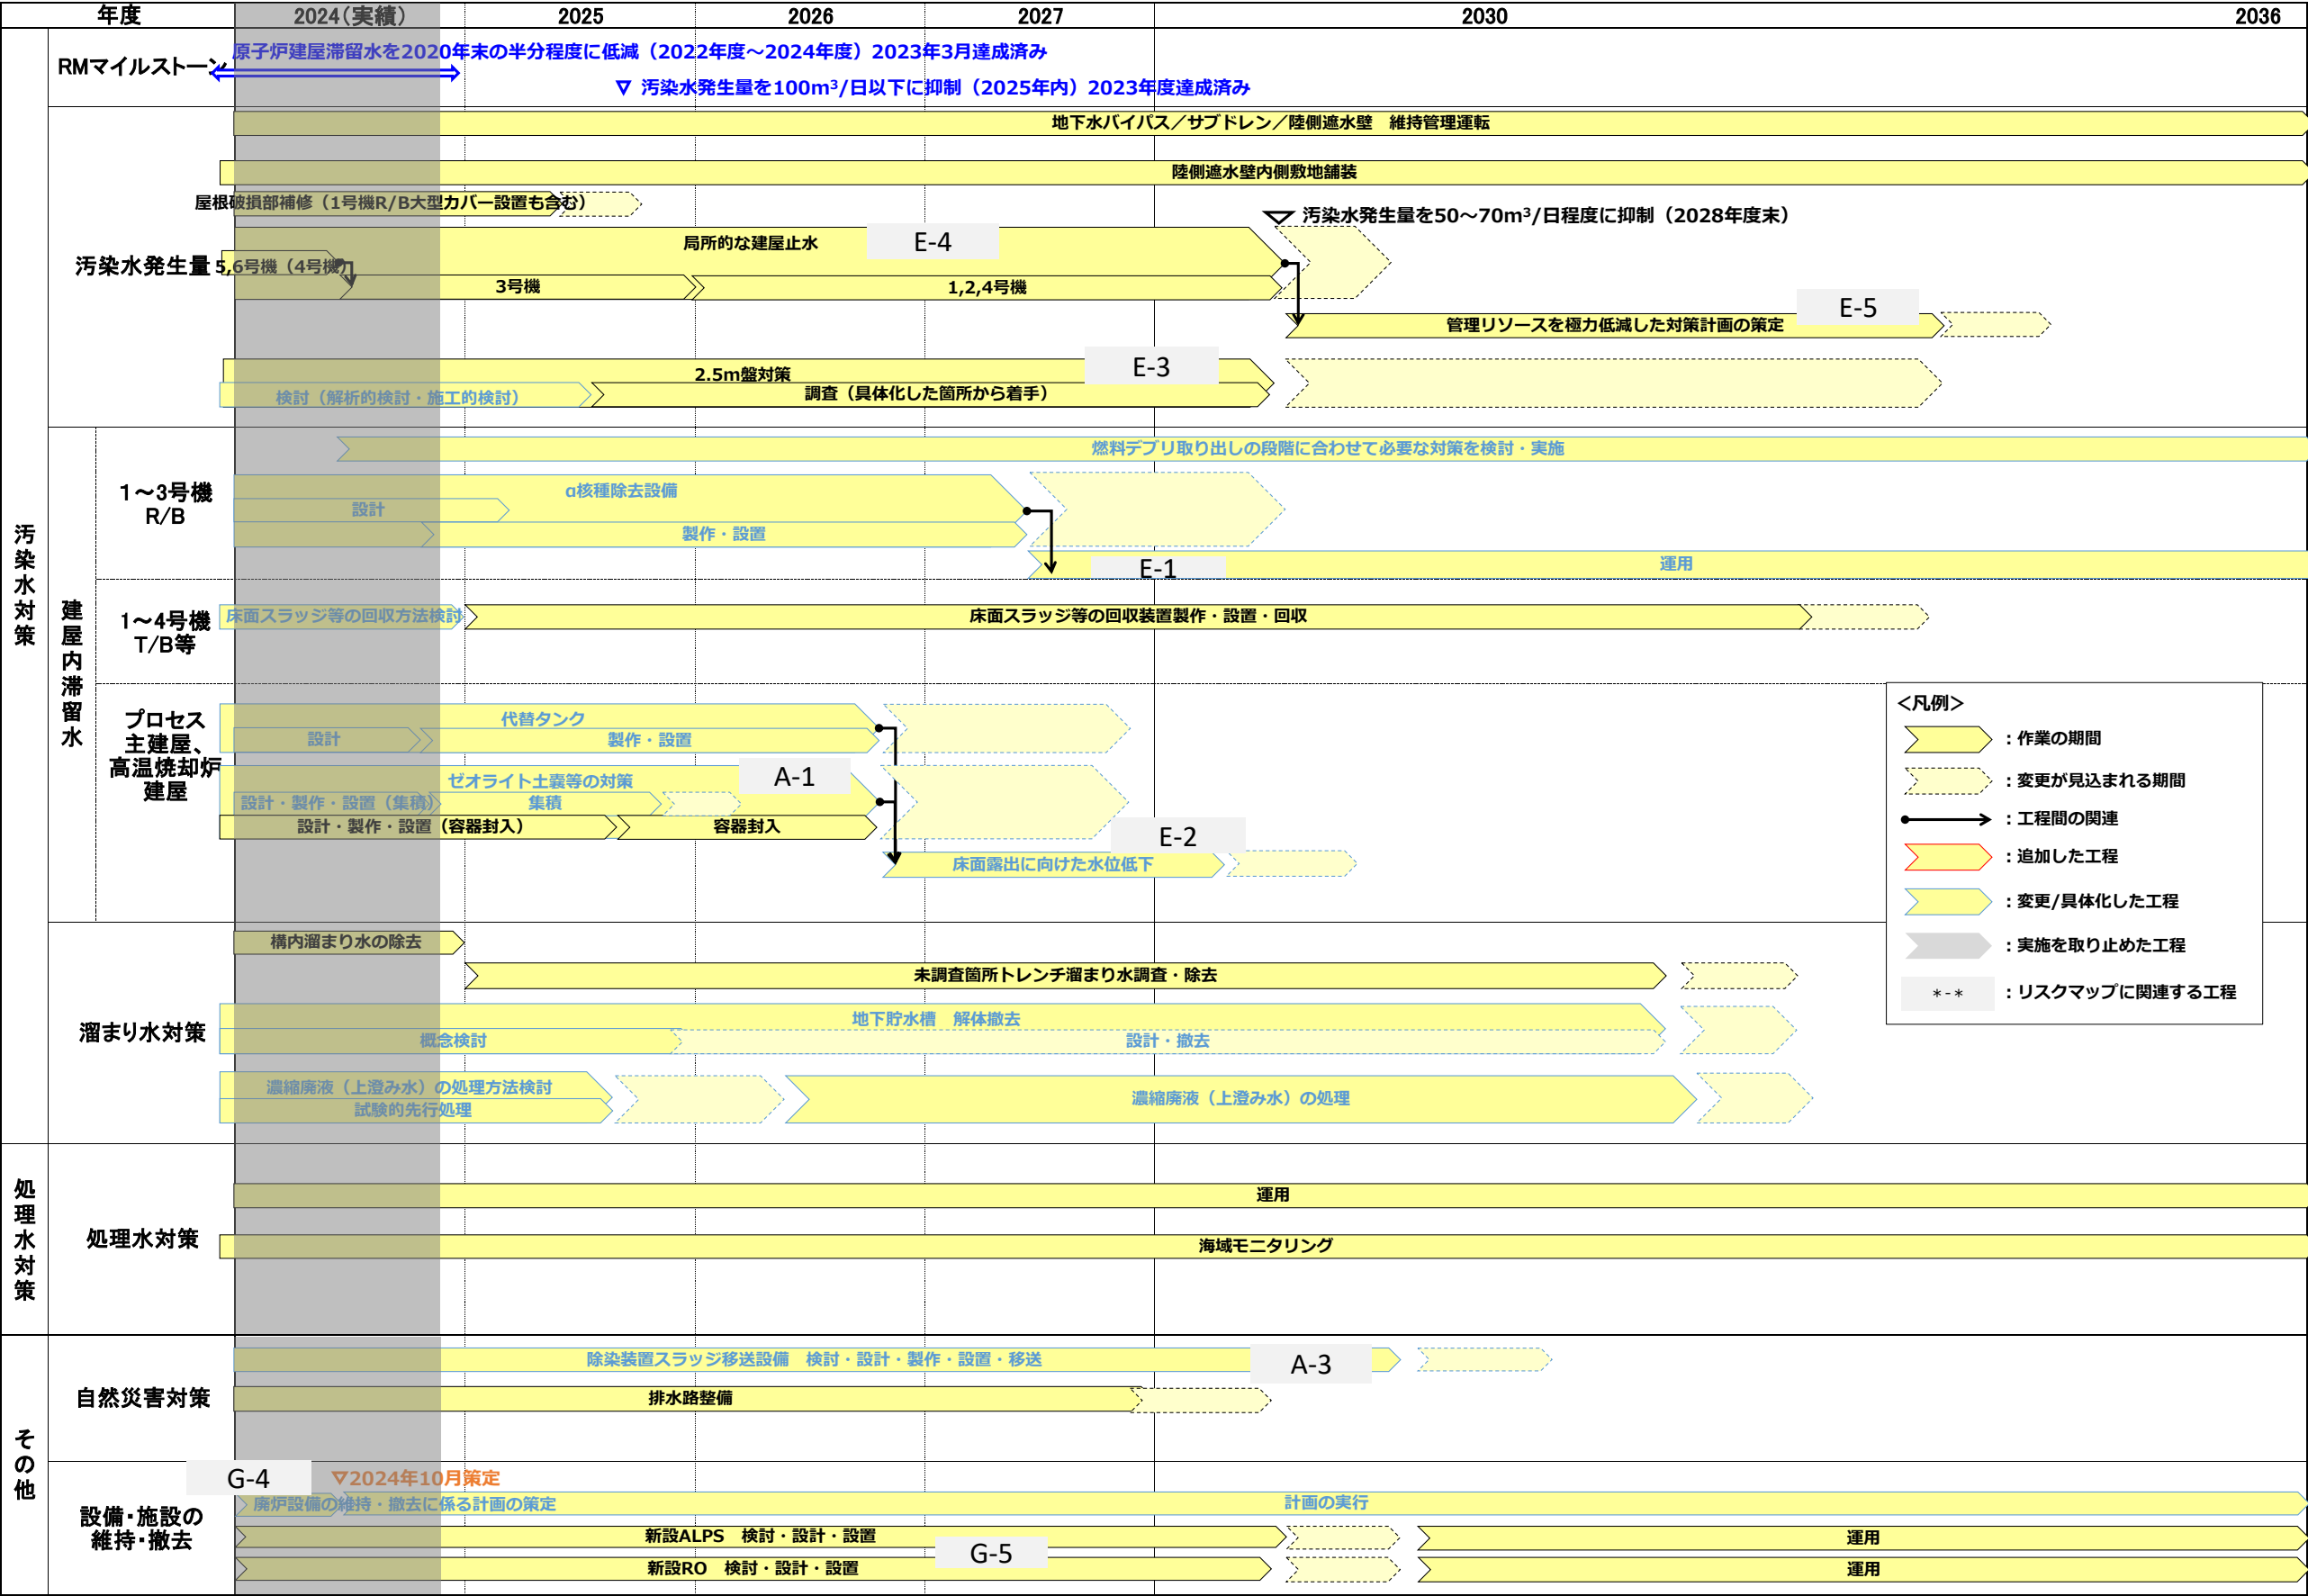

注：今後の検討に応じて、記載内容には変更があり得る
