


汚染水対策スケジュール（1/2）

分野 名	活 り	実施中長期実行プラン2025目標工程	対象設備・ 作業内容	これまで1ヶ月の動きと今後6ヶ月の予定	10月						11月						12月				1月	2月	3月	4月	5月以降	備 考
					1	5	12	19	26		1	2	9	16	23	30	1	8	15	22	2	9	16	23		
汚 染 水 対 策 分 野	●建屋滞留水の処理	建屋内滞留水	【1～4号機 滞留水移送装置】 （実績） ・1～4号機滞留水移送装置運転 （予定） ・1～4号機滞留水移送装置運転	現 場 作 業																						（継続運転） フロセス主建屋・高温焼却炉建屋滞留水移送装置の設置に係る実施計画変更（2025年6月27日認可）
			【α核種除去設備検討】	設 計 ・ 工 事								詳細設計・工事														（2027年度 工事完了予定） α核種除去設備の設置に係る実施計画変更（2024年6月27日申請）
			【1～4号機 T/B床面スラッジ等の回収方法検討】	設 計 ・ 検 討								設計検討														
			【滞留水一時貯留設備】	設 計 ・ 工 事								詳細設計・工事														（2026年度 工事完了予定） 建屋滞留水一時貯留設備の設置に係る実施計画変更（2025年1月21日認可）
			【プロセス主建屋・高温焼却建屋ゼオライト工費の検討】	容 器 封 入 集 積 作 業								容器封入作業 詳細設計・工事														（継続運転） 容器封入作業 実績模モックアップ（2023年9月～） 容器封入作業に係る実施計画変更申請（2025年11月18日認可） 容器封入作業の暫手期間は1年程度の見込みであるが、現在精査中。 集積作業開始（2025年3月26日）
	●汚染水発生量を 50～70m3/日程度に 抑制(2028年度末)	浄化設備	【仮設多核種除去設備】 【高性能多核種除去設備】 【建設多核種除去設備】 （実績） ・処理運転 （予定） ・処理運転	現 場 作 業								処理運転（処理水の状況に応じて適宜運転または処理停止）														（継続運転） 処理水及びタンクのインサービス状況に応じて適宜運転 または処理停止 増設多核種除去設備 前処理設備改造に係る実施計画変更申請（2022年4月28日認可） 使用開始直前了証受領 2024年5月31日 濃縮減量の試験的先行処理実施中 前処理設備改造後のWOT試験を実施中
			【サブドレン浄化設備】 （実績） ・処理運転 （予定） ・処理運転	現 場 作 業								処理運転														（継続運転）
			【地下水バイパス設備】 （実績） ・運転 （予定） ・運転	現 場 作 業								運転														（継続運転）
			【セシウム吸着装置】 【第一セシウム吸着装置】 【第三セシウム吸着装置】 （実績） ・処理運転 （予定） ・処理運転	現 場 作 業								処理運転														（継続運転）
			【NO-3】 【建屋内FO 循環設備】 （実績） ・運転 （予定） ・運転	現 場 作 業								運転														（継続運転）
		陸側排水壁	（実績） ・維持管理運転 （予定） ・維持管理運転	現 場 作 業								維持管理運転														（継続運転）
		フェーシング（陸側排水壁内エリア）	【本土建内フェーシング（全6万㎡）】 ・2号機建屋西側 ・1/2号機東側	現 場 作 業								2号機建屋西側、1/2号機東側														
		1-4号機建屋周辺トレンチ調査	（実績・予定） ・6箇所の調査実施（2025年度） ・2025年5月 調査開始 ・2025年6月 調査完了	現 場 作 業																						2025年6月1日：2025年度調査開始 2025年6月30日：2025年度調査完了
		建屋間ギャップ漏れ止水対策	（実績・予定） ・3号機：6箇所(2025年度) 〃 ・	現 場 作 業																						2024年7月16日準備工事開始 (2025年度：6箇所/6箇所完了予定)
	●タンク関連	H4エリアNo.5タンクからの漏れ対策	（実績・予定） ・汚染の拡散状況把握	現 場 作 業								モニタリング														（継続実施）
		タンク解体	【Eエリアフランジタンク解体工事】 （実績） ・解体基盤 48基/49基 ・Eエリアフランジタンク（D1）内の残水回収（スラッジ含む）完了 （予定） ・Eエリアフランジタンク解体工事 （タンク内洗浄・排水）：49基解体予定 →Eエリアフランジタンク（D4）内の残水回収	現 場 作 業								Eエリアフランジタンク（D1）内の残水回収														（2025年度タンク解体完了予定） D1タンク以外に解体完了済み
			【J8/J9エアータンク解体工事】 （実績） ・J9エアータンク解体基盤 12基/12基 （予定） ・J8エアータンク解体工事	現 場 作 業																						2025年2月3日：実施計画認可 2025年2月14日：解体作業開始 2025年9月3日：J9エアータンク解体完了 2025年11月20日：J8エアータンクサービス
			【横置きタンク解体工事】 （実績） ・解体基盤 10基/367基 （予定） ・横置きタンク解体工事	現 場 作 業																						横置きタンクの解体に係る実施計画変更（2024年5月17日認可） 2024年10月10日未使用タンクの搬入実施 2024年11月：未使用タンクから除去除去試験開始 10基/28基 未使用タンク解体完了 2025年2月3日に発生した火災トラブルにより関連作業中断中。（再開時期未定） 6月12日 火災発生原因と対策の方向性について公表。
		津波対策	○サブドレン集水設備高台機能移転 （実績・予定）ろ過水タンク西側型機工事実施（完了） 機能改良（完了） 集水設備設置（10基）（完了） 移送設備設置	現 場 作 業								サブドレン集水設備高台機能移転工事														2023年10月20日 サブドレン集水設備及び地下水ドレン設備の津波対策に伴うT.P.33.5mへの移設について（実施計画変更申請）→ 2024年11月1日 変更申請認可 2025年3月17日～19日 使用前検査一部受検完了（高台集水タンク） 2025年6月25日 施設撤去完了 8.5m留受けタンク設置エリアの見直し（検討中）に伴う工事期間の延伸

廃炉中長期実行プラン2025

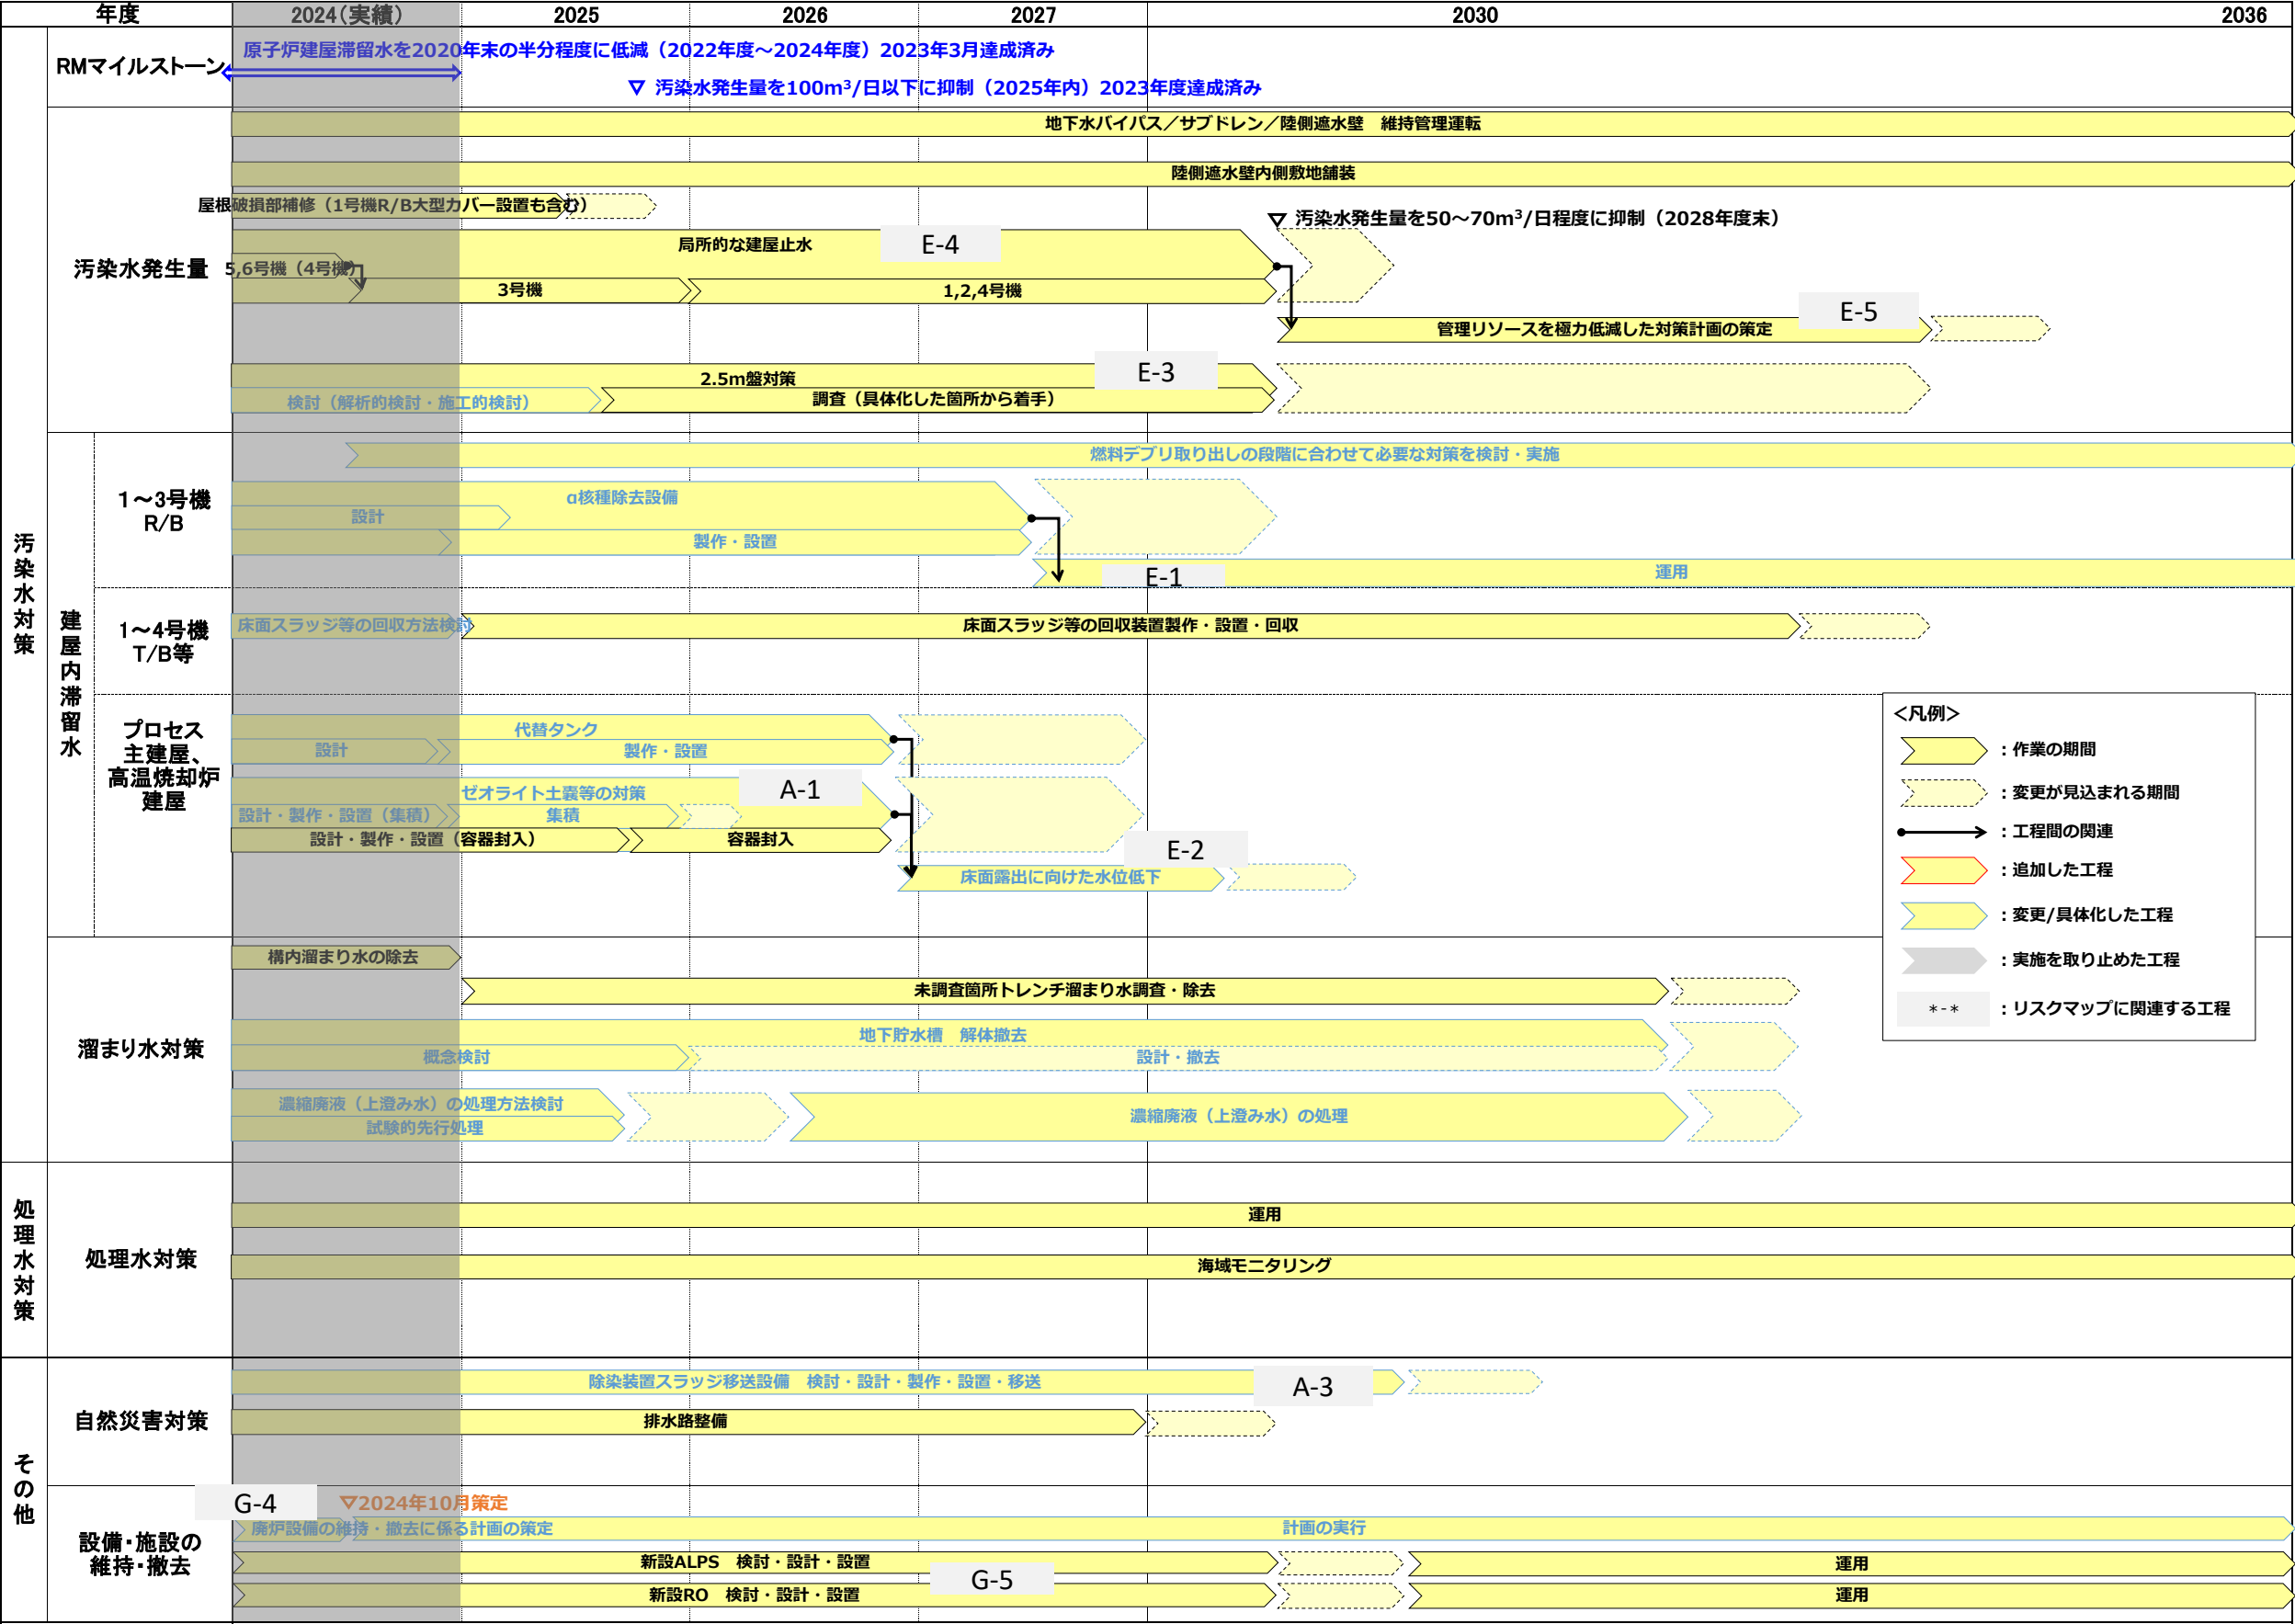

<凡例>

- 作業の期間
- 変更が見込まれる期間
- 工程間の関連
- 追加した工程
- 変更/具体化した工程
- 実施を取り止めた工程
- *** : リスクマップに関連する工程

注：今後の検討に応じて、記載内容には変更があり得る
