


分野名	活り	作業内容	これまで1ヶ月の動きと今後6ヶ月の予定		11月		12月		1月		2月		3月		4月		5月		6月以降		備考				
					23	30	7	14	21	28		4	11	18	下	上	中	下	上	中		下			
使用済燃料プール対策	●1号機大型カバの設置完了(2023年度頃)	燃料取り出し用カバの詳細設計の検討 原子炉建屋上部のガレキの撤去 燃料取り出し用カバの設置工事	1号機	検討・設計	大型カバ、ガレキ撤去の検討・設計																		(2026年度頃完了予定)	【主要工程】 ○ガレキ撤去 ・ガレキ撤去：'18/1/22～20/11/24（大型カバ設置後に再開予定） ・ウェルフラグ調査：'19/7/17～'19/8/26 ・SFP内干渉物等調査：'19/8/2、'19/9/4～6 9/20、27 ・SFPゲートカバ設置：'20/3/16～'20/3/18 ・SFP養生設置（準備作業含む）：'20/3/20～'20/6/18 ・FHM支保設置（準備作業含む）：'20/9/15～'20/10/23 ・天井クレーン支保設置（準備作業含む）：'20/10/28～'20/11/24 ○大型カバ設置 ・大型カバ仮設構台等設置：'21/8/28～'24/4/11 ・本体鉄骨（下部架構）設置：'23/6/19～'24/11/4 ・本体鉄骨（上部架構）設置：'24/11/15～'25/8/28 ・本体鉄骨（ボックスリング）設置：'25/5/21～'25/10/12 ・本体鉄骨（可動屋根）設置：'25/11/7～ ・大型カバ換気設備他設置工事：'24/12/16～ ・外周鉄骨撤去：'24/10/29～'25/9/5 【規制庁関連】 ・オペレーティングフロア床上ガレキの一部撤去等 実施計画変更認可（'19/3/1） ・大型カバ 実施計画変更認可（'23/3/23） ・大型カバ換気設備他 実施計画変更認可（'22/10/27） ※○番号は、別紙配置図と対応	
					①現地調査等（'13/7/25～）																				(2026年度頃完了予定)
					②作業ヤード整備、構外ヤード地組等																				
				現場作業	③本体鉄骨運方、ガレキ撤去用天井クレーン設置等																		ガレキ撤去		
					④【構内】大型カバ換気設備他設置工事																				
	●1号機燃料取り出しの開始（2027～2028年度） ●2号機燃料取り出しの開始（2024～2026年度） ●1～6号機燃料取り出し完了（2031年内）	燃料取扱設備	クレーン／燃料取扱機的设计・製作 プール内ガレキの撤去、燃料調査等	1号機	検討・設計	燃料取り出し設備の検討・設計・製作																		(2026年度頃完了予定)	【主要工程】 ・燃料取り出し計画の選択：2014年10月 →プール燃料取り出しに特化したプランを選択 ・ガレキ撤去計画継続検討 ・燃料取り出し計画の選択：'19/12/19 【規制庁関連】 ・燃料取扱設備他 実施計画変更認可（'25/9/8）
						現場作業	③4号機燃料取扱機搬出																		
					2号機		検討・設計	燃料取扱設備の検討・設計・製作																	
			現場作業	⑤燃料取扱設備設置/試運転/訓練																		【主要工程】 ・燃料取扱設備の設置・試運転：'25/5/30～ 【規制庁関連】 ・燃料取扱設備 実施計画変更認可（'22/12/23） ※○番号は、別紙配置図と対応			
				2号機		現場作業	燃料取り出し																		
			5号機		現場作業		使用済燃料取り出し作業（1号機・2号機燃料取り出しに影響のない範囲で実施）																		
6号機	現場作業	新燃料搬出（準備作業含む）																		【主要工程】 ・6号機新燃料搬出（6号機→海外燃料工場）：'25/9/9～ (2031年までに完了予定)					
		●その他プール燃料取り出し関連作業	共用プール	燃料受け入れ	2号機	現場作業	使用済燃料受け入れ作業																		【主要工程】 ・5号機使用済燃料受け入れ（5号機→共用プール）：'25/7/28～ 【154/1,374体完了（2025/11/28）】 ・6号機使用済燃料受け入れ（6号機→共用プール）：'22/9/19～'25/4/16 【1,456/1,456体完了（2025/4/16）】 ・SFPサイフォン防止配管修理工事：'24/2/26～2/28
乾式キャスク製作	調達						乾式キャスク製作・検査																		
				共用プール空き容量確保（既設仮保管設備受入）	現場作業	乾式キャスク運搬作業 乾式キャスク仮保管設備エリア増設工事																		(2027年度頃完了予定) (2026年度頃完了予定)	
乾式貯蔵設備（共用プール用）検討・設計・設置工事	検討・設計					乾式貯蔵設備（共用プール用）検討																			継続検討中
			高線量機器取り出し	3号機	検討・設計	高線量機器取り出し方法の検討、取り出し機器・容器等の設計・製作																		(2028年度頃完了予定)	
現場作業	⑥-1 プール内ガレキ撤去準備・ガレキ撤去 ⑥-2 高線量機器取り出し																		(2028年度頃完了予定) (2026年度頃完了予定)						
	4号機	検討・設計		高線量機器取り出し方法の検討、取り出し機器・容器等の設計・製作																		(継続検討)	【主要工程】 ○4号機 使用済燃料プールからの高線量機器取り出し：'25/3/24～ （保管先確保後、再開予定） ※○番号は、別紙配置図と対応		
現場作業				⑦高線量機器取り出し																				(2036年度以降完了予定)	

廃炉中長期実行プラン2025

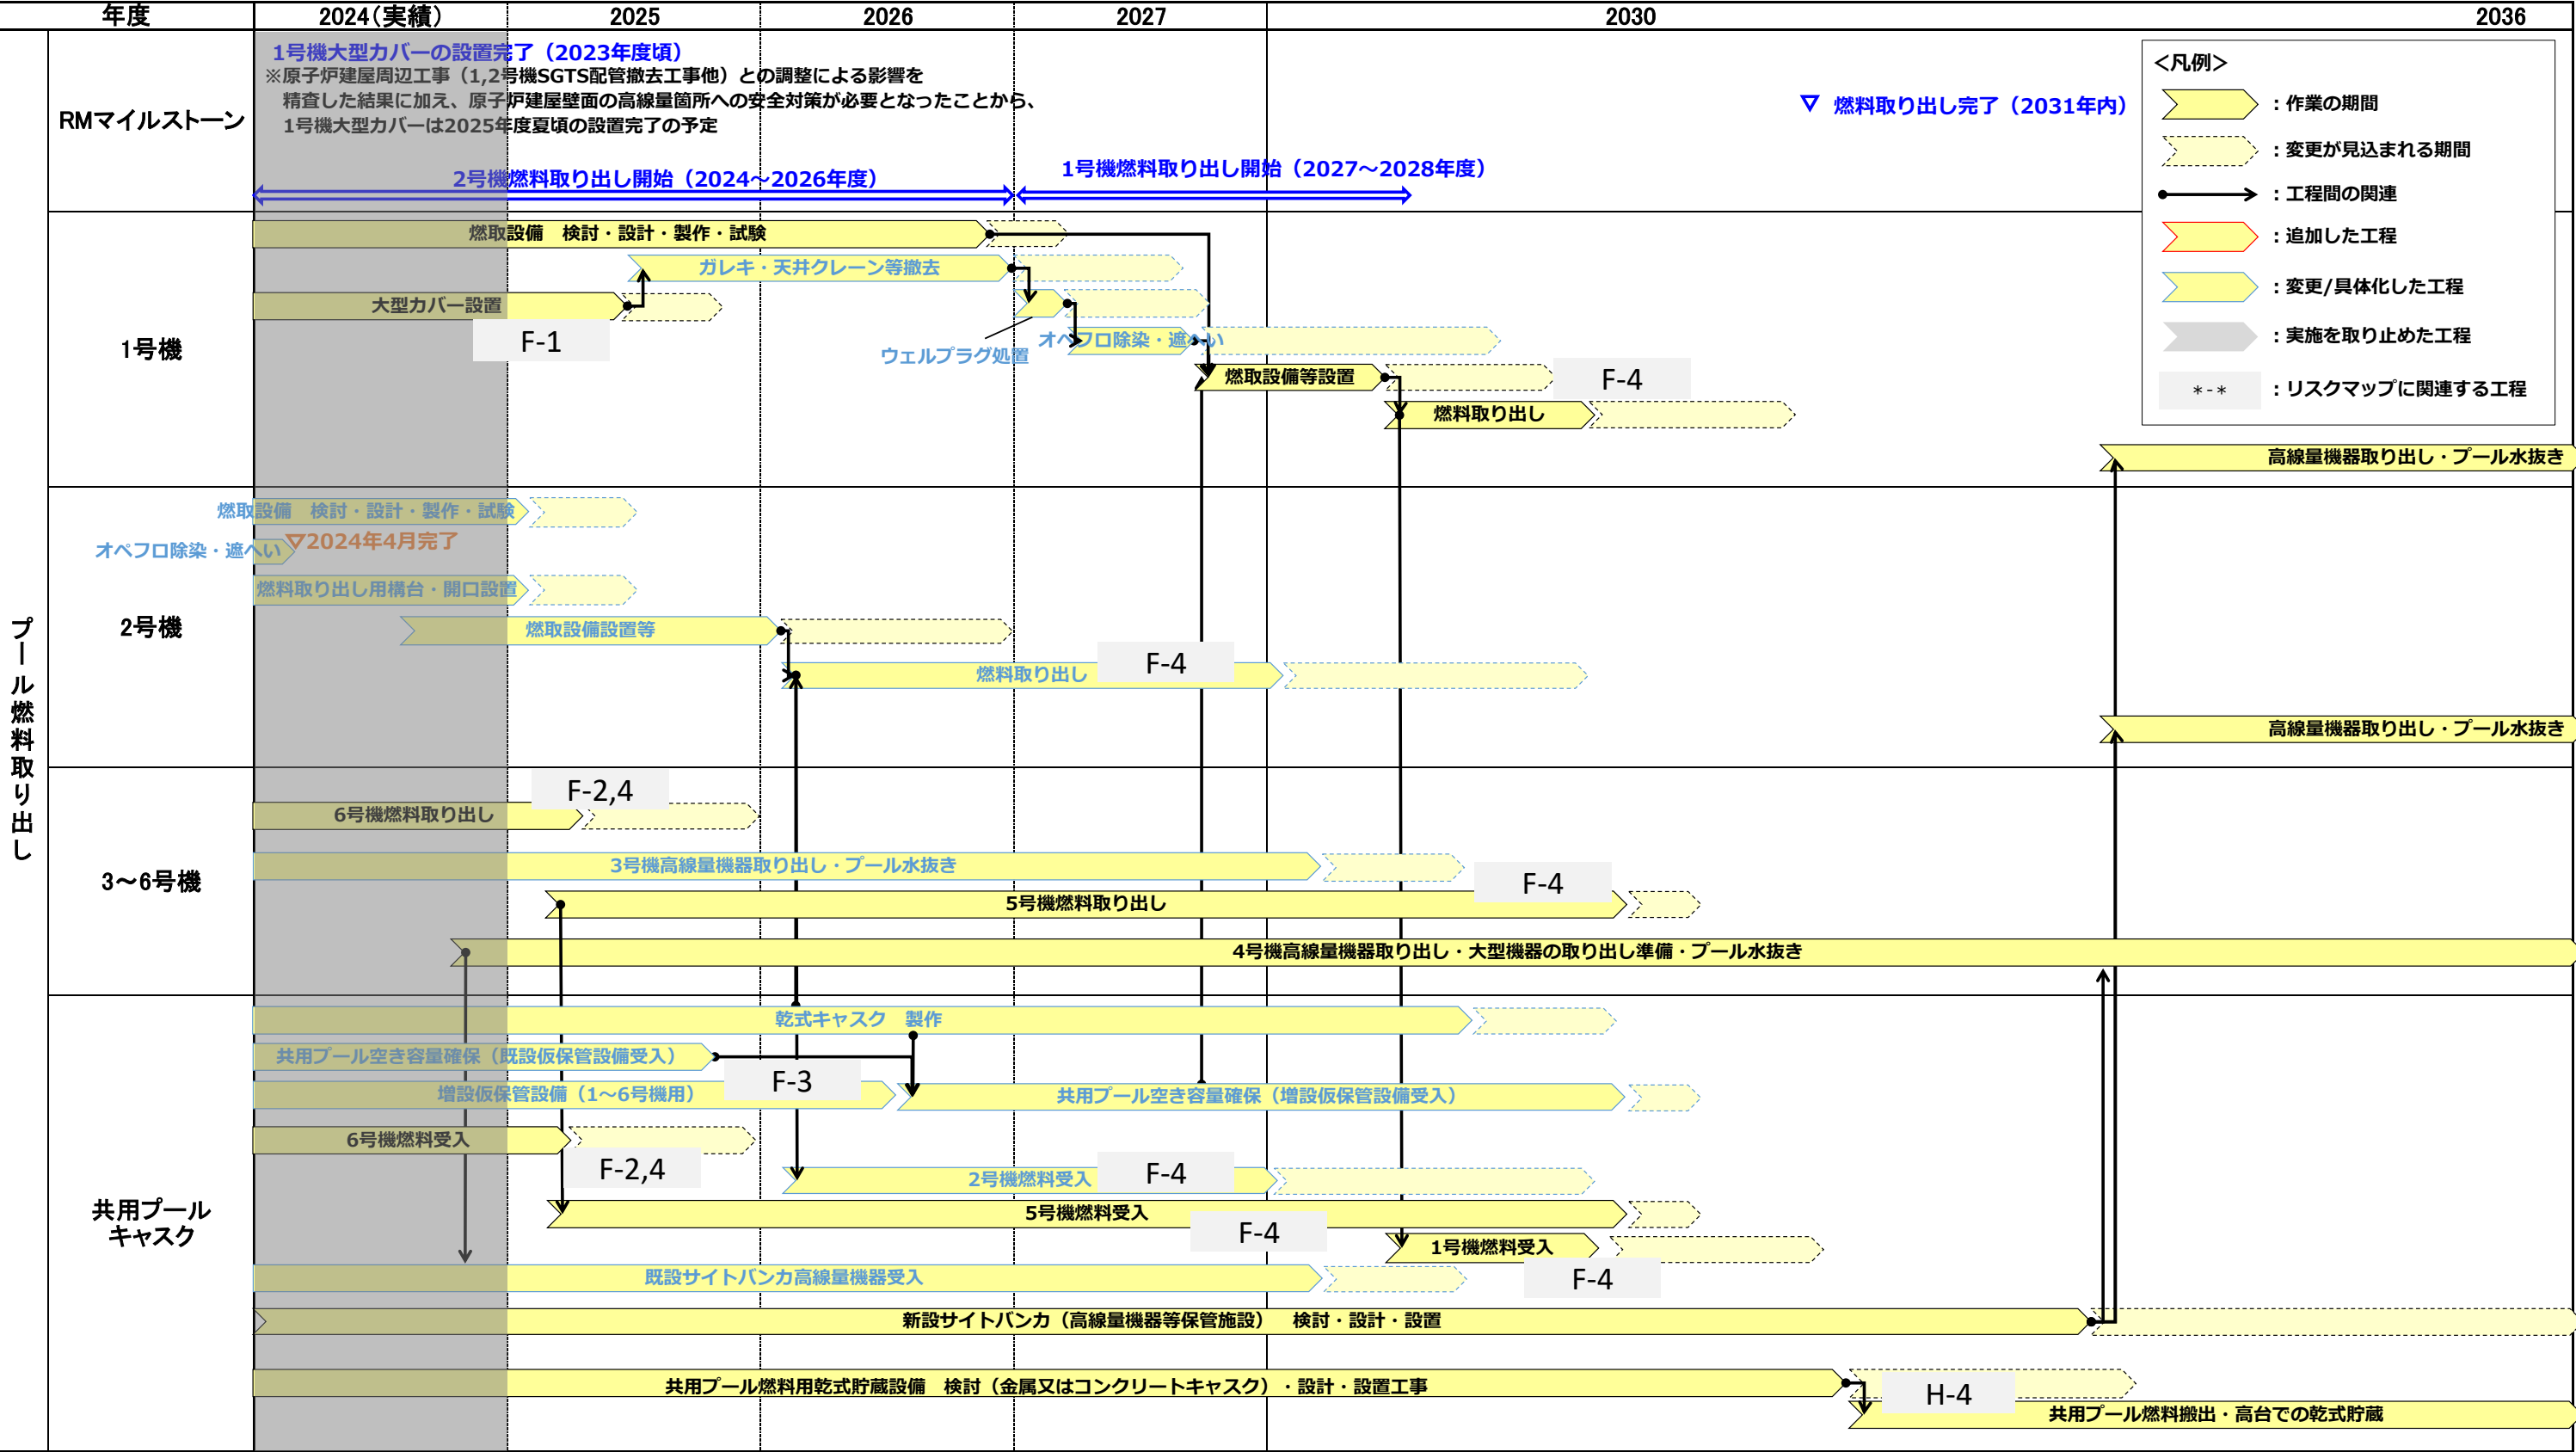

注：今後の検討に応じて、記載内容には変更があり得る
