


汚染水対策スケジュール（1/2）

分野 名	経 り	実施中長期実行プラン2025目標工程	対象設備・ 作業内容	これまで1ヶ月の動きと今後6ヶ月の予定	1月					2月					3月			4月			5月			6月			7月			8月以降	備 考
					1	4	11	18	25	1	4	11	18	22	1	4	7	1	4	7	1	4	7	1	4	7	1	4	7		
汚 染 水 対 策 分 野	●建屋滞留水の処理	建屋内滞留水	【1～4号機 滞留水移送装置】 （実績） ・1～4号機滞留水移送装置運転 （予定） ・1～4号機滞留水移送装置運転	現場作業 1～4号機滞留水移送装置設置 運転																										《継続運転》	プロセス主建屋・高温焼却炉建屋滞留水移送装置の設置に係る実施計画変更（2025年6月27日認可）
			【α核種除去設備検討】	設計・工事 詳細設計・工事																										《2027年度工事完了予定》	α核種除去設備の設置に係る実施計画変更（2024年6月27日申請）
			【1～4号機 T/B床面スラッジ等の回収方法検討】	設計・検討 設計検討																											
			【滞留水一時貯留設備】	設計・工事 詳細設計・工事																										《2026年度工事完了予定》	建屋滞留水一時貯留設備の設置に係る実施計画変更（2025年1月21日認可）
			【プロセス主建屋・高温焼却建屋ゼオライト工費の検討】	容器封入作業 集積作業 詳細設計・工事 詳細設計・工事																											容器封入作業 実現機モックアップ（2023年9月～） 容器封入作業に係る実施計画変更申請（2025年11月18日認可） 容器封入作業の着手時期は2027年度後半 集積作業開始（2025年3月26日）
	●汚染水発生量を 50～70m3/日程度に 抑制(2028年度末)	浄化設備	【既設多核種除去設備】 【高性能多核種除去設備】 【増設多核種除去設備】 （実績） ・処理運転 （予定） ・処理運転	現場作業 処理運転（処理水の状況に応じて適宜運転または処理停止）																										《継続運転》	処理水及びタンクのインサービス状況に応じて適宜運転または処理停止 増設多核種除去設備 前処理設備改造に係る実施計画変更申請（2022年4月28日認可） 使用前検査終了証受領 2024年5月31日 濃縮廃液の試験的先行処理実施中 前処理設備改造後のH-O-T試験を実施中
			【サブドレン浄化設備】 （実績） 処理運転 （予定） ・処理運転	現場作業 処理運転																										《継続運転》	
			【地下水バイパス設備】 （実績） ・運転 （予定） ・運転	現場作業 運転																										《継続運転》	
			【セシウム吸着装置】 【第二セシウム吸着装置】 【第三セシウム吸着装置】 （実績） ・処理運転 （予定） ・処理運転	現場作業 処理運転																										《継続運転》	
			【RO-3】 【建屋内RO 濃縮設備】 （実績） ・運転 （予定） ・運転	現場作業 運転																										《継続運転》	
			陸側逆水壁 （実績） ・維持管理運転 （予定） ・維持管理運転	現場作業 維持管理運転																										《継続運転》	・点検に伴うプラント1系統停止（2026年3月中旬～4月 最長10日間） ・点検に伴うプラント2系統停止（2026年3月中旬～4月 最長3日間）
		フェーシング（陸側逆水壁内エリア）	【東土壁内フェーシング（全6万㎡）】 （実績・予定） ・2号機建屋西側 ・1ノ2号機東側	現場作業 2号機建屋西側、1ノ2号機東側																											
			1-4号機建屋周辺トレench調査 （実績・予定） ・5箇所の調査実施（2025年度） ・2026年5月 調査開始 ・2025年6月 調査完了	現場作業 5箇所の調査実施（2025年度） 2026年5月 調査開始 2025年6月 調査完了																											2025年5月1日 2025年度調査開始 2025年6月30日 2025年度調査完了
			建屋間ギャップ端部止水対策 （実績・予定） ・3号機：6箇所（2025年度） ・4号機：3箇所	現場作業 【3号機】 ▼2026年2月9日完了																											2024年7月16日準備工事開始 3号機：6箇所 6箇所完了予定 4号機：2箇所 3箇所完了、4号機V/B：2026年2月10日現場着手
	●タンク関連	タンク解体	H4エリアNo. 5タンクからの漏えい対策 （実績・予定） ・汚染の拡散状況把握	現場作業 モニタリング																										《継続実施》	
			【Eエリアフランジタンク解体工事】 （実績） ・解体基数 48基/49基 ・Eエリアフランジタンク（D1）内の残水回収（スラッジ含む）完了 （予定） ・Eエリアフランジタンク解体工事（タンク内洗浄・除染）：49基解体予定	現場作業 Eエリアフランジタンク解体工事																										《2026年度工事完了予定》 *D1タンク以外は解体完了済み	2018年9月10日 Eエリアにおける中低濃度タンクの撤去（実施計画変更認可） 2025年1月9日：EエリアD1タンク内のスラッジ回収作業開始 2025年3月21日：タンク内でのスラッジ回収作業開始 2025年11月17日：D1タンク内スラッジ回収完了 2026年1月14日：D1タンクアウトサービス 2026年2月2日：D1タンク除染に向けた準備作業開始
			【J8/J9エリアタンク解体工事】 （実績・予定） ・J9エリアタンク解体基数 12基/12基 ・J8エリアタンク解体工事 1基/9基	現場作業 ▼1ノ20 J8エリアタンク解体開始 ▼2ノ17 1基目解体完了																											2025年2月3日：実施計画認可 2025年2月14日：解体作業開始 2025年9月3日：J9エリアタンク解体完了 2025年11月20日：J8エリアアウトサービス 2026年1月20日：J8エリアタンク解体開始
			【横置きタンク解体工事】 （実績） ・解体基数 14基/367基 （予定） ・横置きタンク解体工事	現場作業																											横置きタンクの解体に係る実施計画変更（2024年5月17日認可） 2024年10月10日未使用タンクの搬入実施 2024年11月：未使用タンクから除染解体試験開始 14基/28基 未使用タンク解体完了 2025年2月3日に発生した火災トラブルにより現場作業中断。 6月12日 火災発生原因と対策の方向性について公表。 2026年1月21日から作業再開
		●自然災害対策	津波対策 ○サブドレン集水設備高台機能移転 （実績・予定）ろ過水タンク西側設備工事実施（完了） 地盤改良（完了） 集水設備設置（10基）（完了） 移送設備設置	現場作業 サブドレン集水設備高台機能移転工事																											2024年11月1日：変更申請認可 2025年3月17日～19日 使用前検査一部受検完了（高台集水タンク） 8.5m盛受けタンク設置エリアの見直し（検討中）に伴う工事期間の延伸 2026年1月21日～22日 使用前検査一部受検完了（高台集水タンク側）

廃炉中長期実行プラン2025

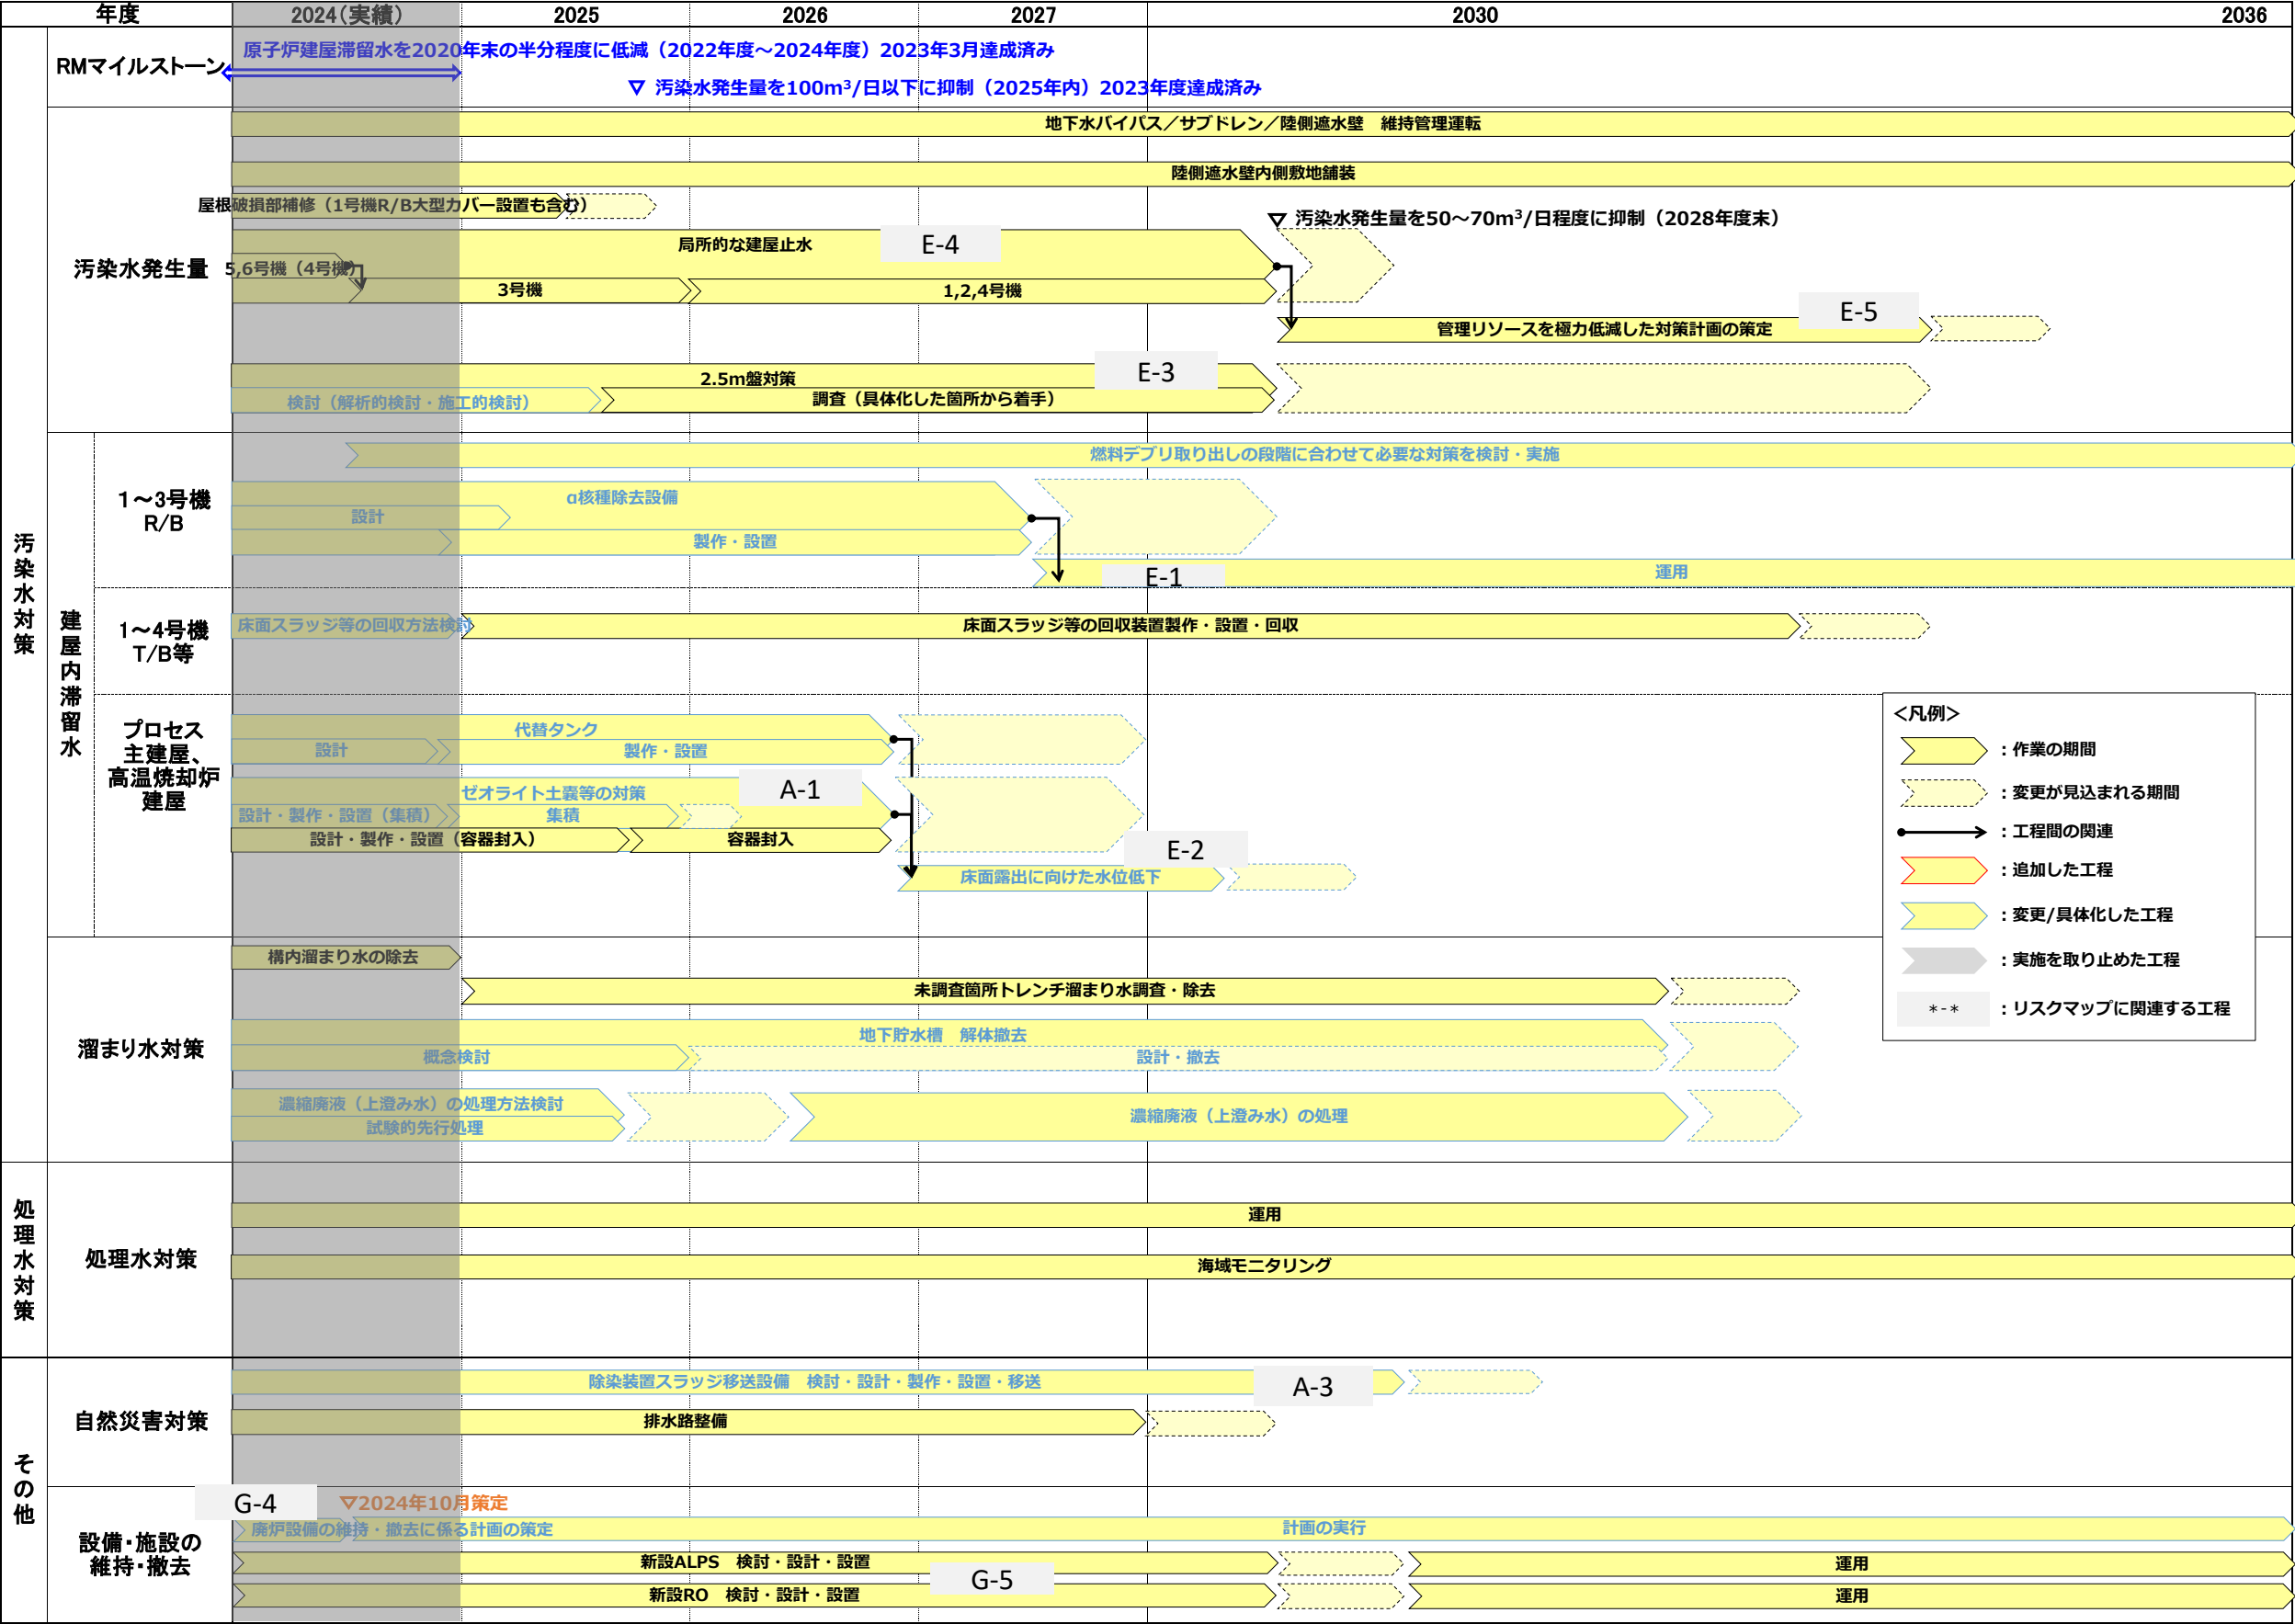

注：今後の検討に応じて、記載内容には変更があり得る
