


汚染水対策スケジュール（1/2）

分野 名称	経 理	計画 内容	対象設備・ 作業内容	これまで1ヶ月の動きと今後6ヶ月の予定	2月				3月				4月			5月			6月			7月			8月			9月以降	備 考	
					1	8	15	22	1	8	15	22	29	1	8	15	1	8	15	1	8	15	1	8	15	1	8			15
汚 染 水 対 策 分 野	●建屋滞留水の処理	建屋内滞留水	【1～4号機 滞留水移送装置】 （実績） ・1～4号機滞留水移送装置運転 （予定） ・1～4号機滞留水移送装置運転	現場 作業	1～4号機滞留水移送装置設置 運転																								（継続運転）	プロセス主建屋・高温焼却炉建屋滞留水移送装置の設置に係る実施計画変更（2025年6月27日認可）
			【α核種除去設備検討】	設計・ 工事	詳細設計・工事																								（2027年度 工事完了予定）	α核種除去設備の設置に係る実施計画変更（2024年6月27日申請）
			【1～4号機 T/B床面スラッジ等の回収方法検討】	設計・ 検討	設計検討																									
			【滞留水一時貯留設備】	設計・ 工事	詳細設計・工事																								（2027年度 工事完了予定）	建屋滞留水一時貯留設備の設置に係る実施計画変更（2025年1月21日認可）
			【プロセス主建屋・高温焼却建屋ゼオライト工費の検討】	容器封入 集積作業	容器封入作業 詳細設計・工事																									容器封入作業 実規模モックアップ（2023年9月～） 容器封入作業に係る実施計画変更申請（2025年11月18日認可） 容器封入作業の着手時期は2027年度後半 集積作業開始（2025年3月26日）
	●汚染水発生量を 50～70m3/日程度に 抑制(2028年度末)	浄化設備	【既設多核種除去設備】 【高性能多核種除去設備】 【増設多核種除去設備】 （実績） ・処理運転 （予定） ・処理運転	現場 作業	処理運転（処理水の状況に応じて適宜運転または処理停止）																								（継続運転）	処理水及びタンクのインサービス状況に応じて適宜運転 または処理停止 増設多核種除去設備 前処理設備改造に係る実施計画変更申請（2022年4月28日認可） 使用前検査終了証受領 2024年5月31日 濃縮濃液の試験的先行処理実施中 前処理設備改造後のHOT試験完了（2026年3月19日）
			【サブドレン浄化設備】 （実績） ・処理運転 （予定） ・処理運転	現場 作業	処理運転																								（継続運転）	
			【地下水バイパス設備】 （実績） ・運転 （予定） ・運転	現場 作業	運転																								（継続運転）	
			【セシウム吸着装置】 【第二セシウム吸着装置】 【第三セシウム吸着装置】 （実績） ・処理運転 （予定） ・処理運転	現場 作業	処理運転																								（継続運転）	
			【RO-3】 【建屋内RO 総理設備】 （実績） ・運転 （予定） ・運転	現場 作業	運転																								（継続運転）	
	●タンク関連	タンク解体	陸側遮水壁 （実績） ・維持管理運転 （予定） ・維持管理運転	現場 作業	維持管理運転																								（継続運転）	・点検に伴うプラント1系統停止（2026年3月中旬～4月 最長10日間） ・点検に伴うプラント2系統停止（2026年3月中旬～4月 最長3日間）
			フェーシング（陸側遮水壁内エリア） （実績・予定） ・2号機建屋西側 ・1ノ2号機東側	現場 作業	2号機建屋西側、1ノ2号機東側																									
			1-4号機建屋周辺トレンチ調査 （実績・予定） ・5箇所の調査実施（2025年度） ・2025年5月 調査開始 ・2025年6月 調査完了	現場 作業																										2025年5月1日 2025年度調査開始 2025年6月30日 2025年度調査完了
			建屋間ギャップ端部止水対策 （実績・予定） ・3号機：6箇所（2025年度） ・4号機：3箇所	現場 作業	【3号機】 ▼2026年2月9日完了																									2024年7月16日準備工事開始 3号機：6箇所/6箇所完了 4号機：2箇所/3箇所完了、4号機R/B：2026年2月10日現場着手
			H4エリアNo. 5タンクからの漏えい対策 （実績・予定） ・汚染の拡散状況把握	現場 作業	モニタリング																								（継続実施）	
●自然災害対策	津波対策	○サブドレン集水設備高台機能移転 （実績・予定）ろ過水タンク西側整備工事実施（完了） 地盤改良（完了） 集水設備設置（10基）（完了） 移送設備設置	現場 作業	サブドレン集水設備高台機能移転工事																								（2026年度上旬タンク解体完了予定） *D1タンク以外は解体完了済み	2018年9月10日：Eエリアにおける中低濃度タンクの撤去（実施計画変更認可） 2025年1月9日：EエリアD1タンク内のスラッジ回収作業開始 2025年3月21日：タンク内でのスラッジ回収作業開始 2025年11月17日：D1タンク内スラッジ回収完了 2026年1月14日：D1タンクアウトサービス 2026年2月2日：D1タンク除染に向けた準備作業開始 2026年3月19日からD1タンク除染作業開始	
			現場 作業	▼2/17 1基目解体完了 ▼2/27 2基目解体完了 ▼3/9 3基目解体完了																									2025年2月3日：実施計画認可 2025年2月14日：解体作業開始 2025年9月3日：J9エリアタンク解体完了 2025年11月20日：J8エリアアウトサービス 2026年1月20日：J8エリアタンク解体開始	
			現場 作業																										横置きタンクの解体に係る実施計画変更（2024年5月17日認可） 2024年10月10日未使用タンクの撤入実施 2024年11月：未使用タンクから除染解体試験開始 22基/28基 未使用タンク解体完了 2025年2月3日に発生した火災トラブルにより現場作業中断。 6月12日 火災発生原因と対策の方向性について公表。 2026年1月21日から作業再開	

廃炉中長期実行プラン2025

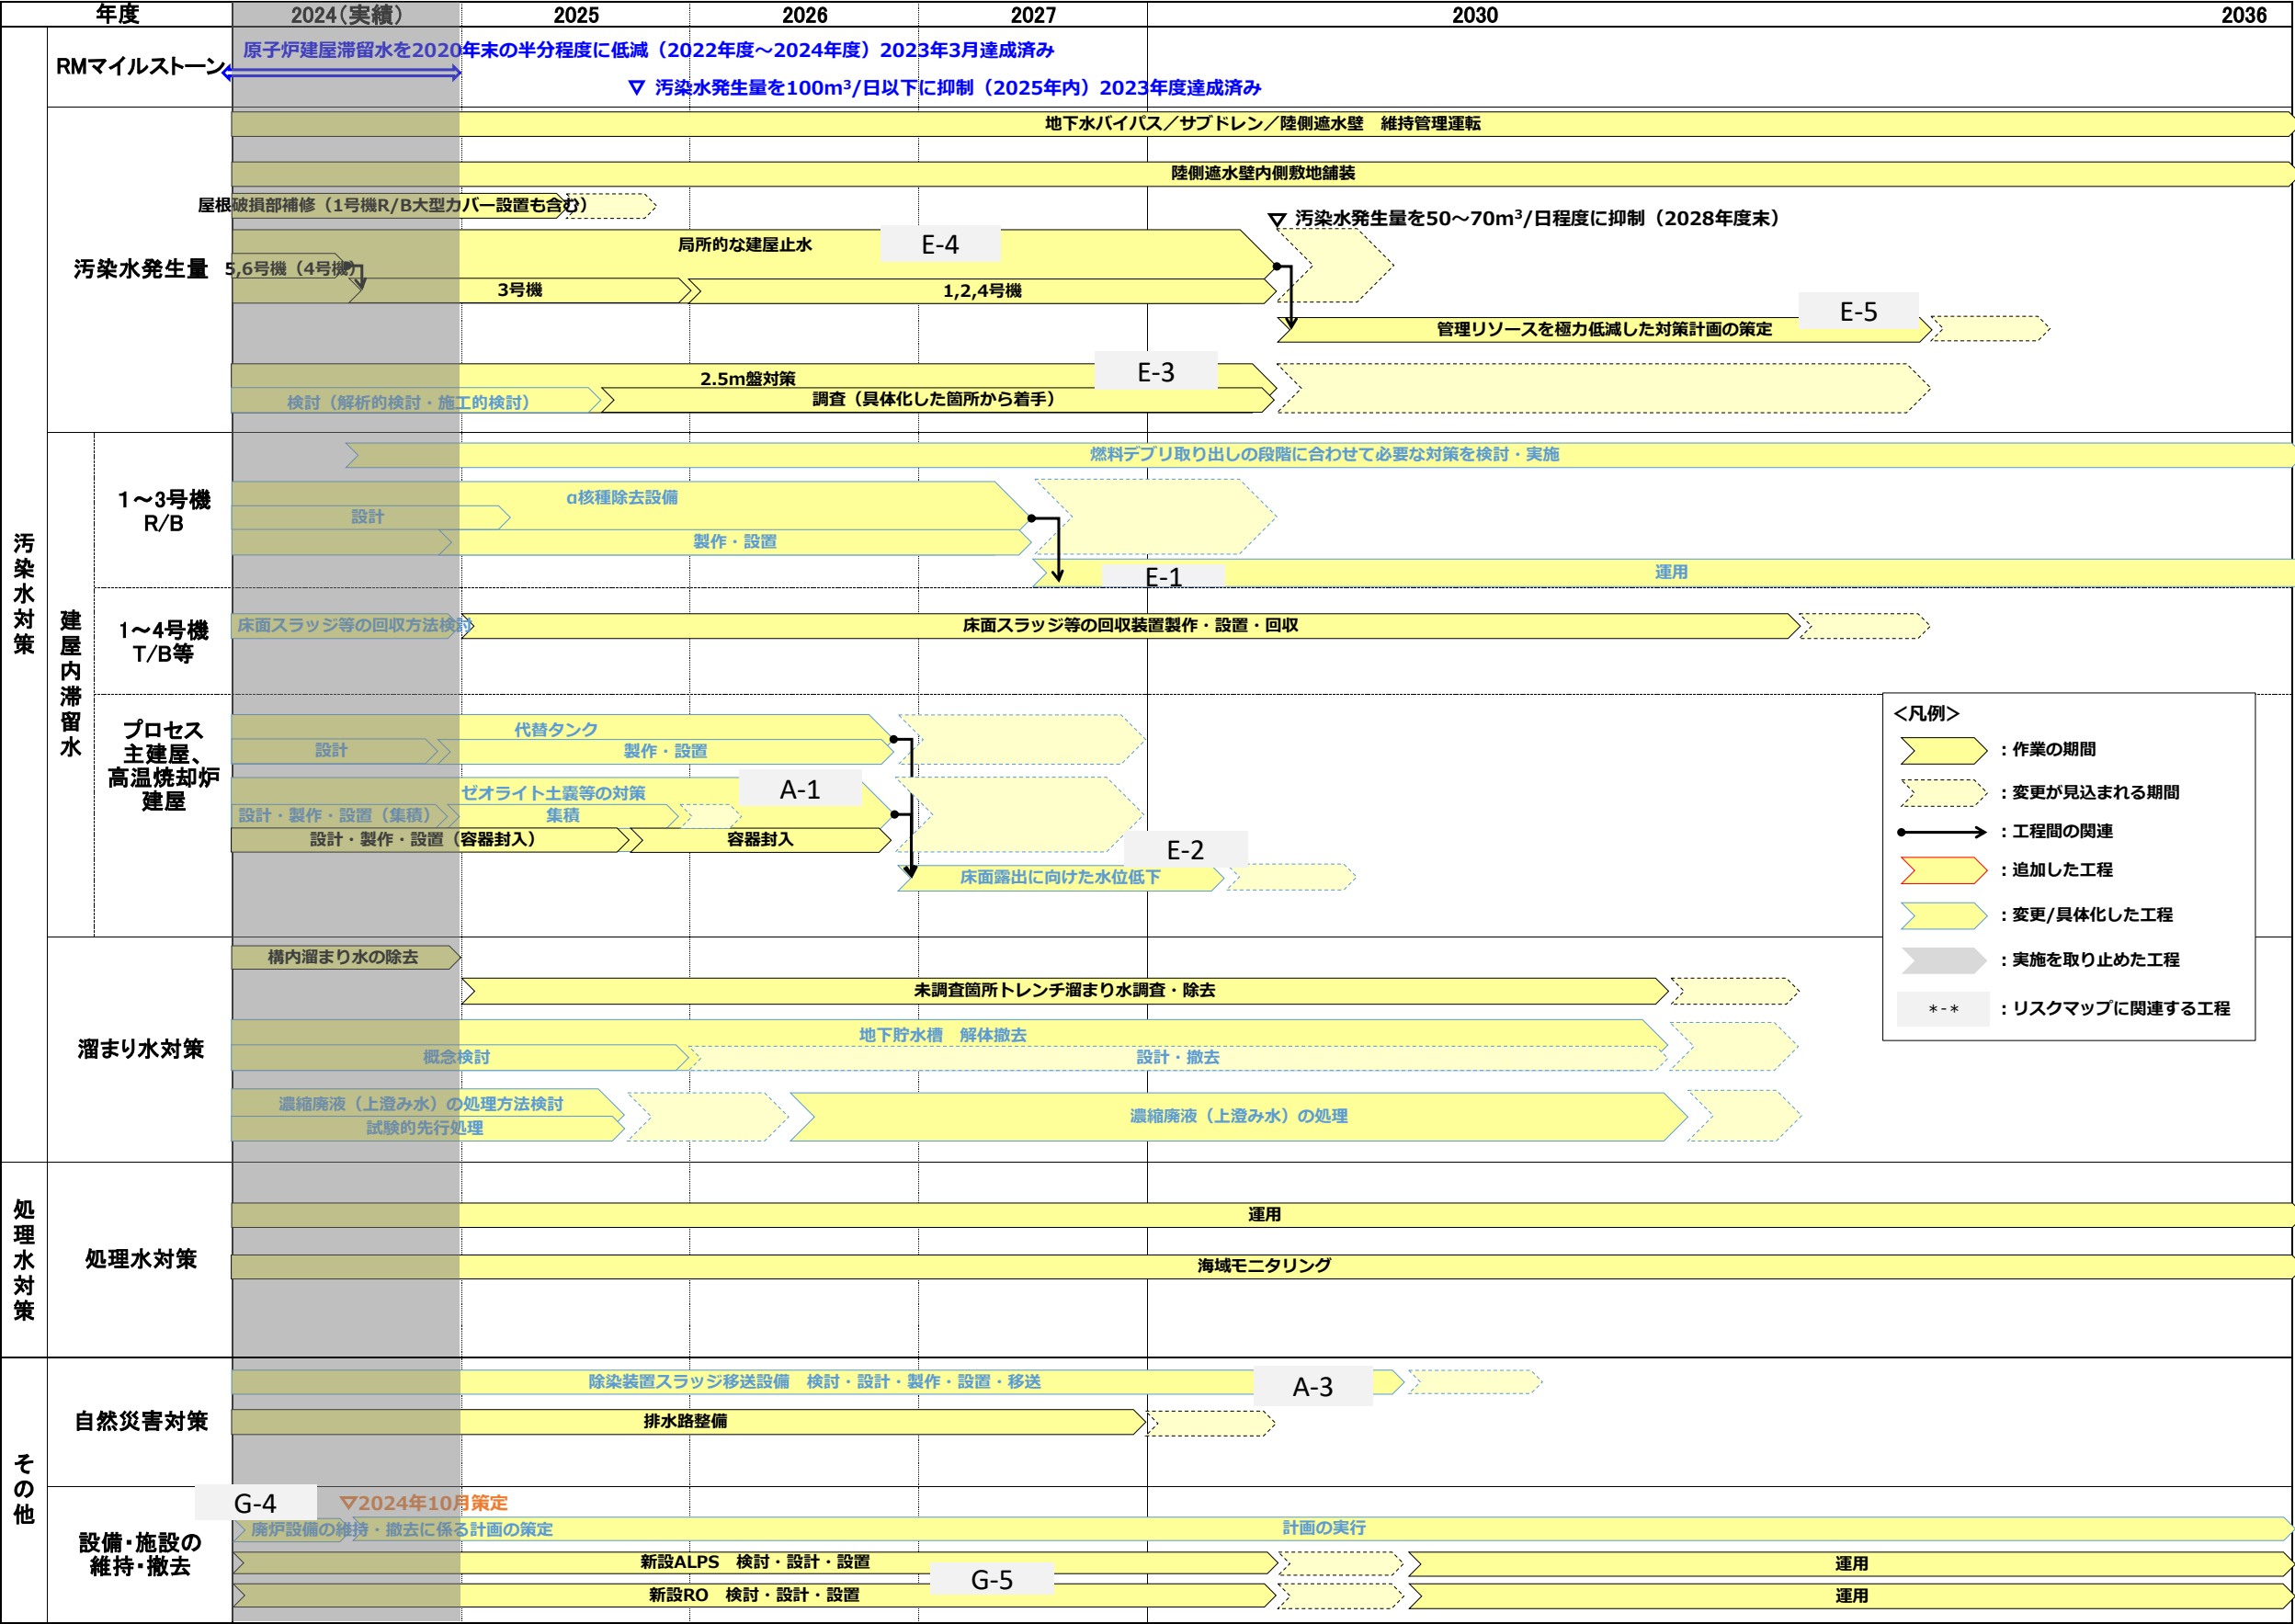

注：今後の検討に応じて、記載内容には変更があり得る
