


分野名	廃炉中長期実行プラン2025 目標工程	括り	作業内容	これまで1ヶ月の動きと今後6ヶ月の予定	2月		3月				4月			5月			6月			7月			8月			9月 以降			備 考																
					22	1	8	15	22	29		5	12	19	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下																		
使用済燃料プール対策	●1号機大型カバーの設置完了(2023年度頃) ●1号機燃料取り出しの開始(2027～2028年度) ●2号機燃料取り出しの開始(2024～2026年度) ●1～6号機燃料取り出し完了(2031年内)	カバ－	燃料取り出し用カバーの詳細設計の検討 原子炉建屋上部のガレキの撤去 燃料取り出し用カバーの設置工事	1号機 (実 績) ・大型カバー、ガレキ撤去の検討・設計 ・現地調査等 ・作業ヤード整備 ・ガレキ撤去用天井クレーン設置 ・【構内】大型カバー換気設備他設置工事 (予 定) ・大型カバー、ガレキ撤去の検討・設計 ・現地調査等 ・作業ヤード整備 ・【構内】大型カバー換気設備他設置工事 ・ガレキ撤去	検討・設計	大型カバー、ガレキ撤去の検討・設計																												(2026年度頃完了予定)	【主要工程】 ○ガレキ撤去 ・ガレキ撤去：'18/1/22～20/11/24（大型カバー設置後に再開予定） ・ウェルフラグ調査：'19/7/17～'19/8/26 ・SFP内干渉物等調査：'19/8/2、'19/9/4～6 9/20、27 ・SFPゲートカバー設置：'20/3/16～'20/3/18 ・SFP養生設置（準備作業含む）：'20/3/20～'20/6/18 ・FHM支保設置（準備作業含む）：'20/9/15～'20/10/23 ・天井クレーン支保設置（準備作業含む）：'20/10/28～'20/11/24 ○大型カバー設置 ・大型カバー仮設構台等設置：'21/8/28～'24/4/11 ・本体鉄骨（下部架構）設置：'23/6/19～'24/11/4 ・本体鉄骨（上部架構）設置：'24/11/15～'25/8/28 ・本体鉄骨（ボックスリング）設置：'25/5/21～'25/10/12 ・本体鉄骨（可動屋根）設置：'25/11/7～'26/1/19 ・ガレキ撤去用天井クレーン設置：'26/1/20～'26/3/19 ・大型カバー換気設備他設置工事：'24/12/16～ ・外周鉄骨撤去：'24/10/29～'25/9/5 【規制庁関連】 ・オペレーティングフロア床上ガレキの一部撤去等 実施計画変更認可（'19/3/1） ・大型カバー 実施計画変更認可（'23/3/23） ・大型カバー換気設備他 実施計画変更認可（'22/10/27） ※○番号は、別紙配置図と対応										
						燃料取扱設備	クレーン／燃料取扱機の設計・製作 プール内ガレキの撤去、燃料調査等	1号機	(実 績) ・燃料取り出し設備の検討・設計・製作 (予 定) ・燃料取り出し設備の検討・設計・製作	検討・設計	燃料取り出し設備の検討・設計・製作																												(2026年度頃完了予定)	【主要工程】 ・燃料取り出し計画の選択：2014年10月 →フル燃料取り出しに特化したプランを選択 ・ガレキ撤去計画継続検討 ・燃料取り出し計画の選択：'19/12/19 【規制庁関連】 ・燃料取扱設備他 実施計画変更認可（'25/9/8）					
											燃料取扱機撤出	現場作業	⑧4号機燃料取扱機撤出																												工場との受け入れ時期調整により工程見直し				
													燃料取扱機設置/試運転	現場作業	⑤燃料取扱機設置/試運転																												⑤燃料取り出し訓練		
		燃料取り出し	2号機燃料取り出し	2号機	(予 定) ・燃料取り出し	現場作業	⑤燃料取り出し作業																												(2028年度頃完了予定)	【主要工程】 ・燃料取扱機撤出 ・燃料取扱機撤出：'25/11/4～ ※○番号は、別紙配置図と対応									
							5号機使用済燃料取り出し	5号機	(実 績) ・使用済燃料取り出し (予 定) ・使用済燃料取り出し	現場作業	使用済燃料取り出し作業（1号機・2号機燃料取り出しに影響のない範囲で実施）																												(2031年までに完了予定)	【主要工程】 ・5号機使用済燃料取り出し（5号機→共用プール）：'25/7/23～ 【154/1,374体完了（2025/11/28）】					
											6号機新燃料の搬出	6号機	(実 績) ・準備作業 (予 定) ・準備作業 ・新燃料搬出	現場作業	新燃料搬出（準備作業含む）																												(2031年までに完了予定)	【主要工程】 ・6号機新燃料搬出（6号機→海外燃料工場）：'25/9/9～	
							燃料受け入れ	乾式カスク製作	共用プール	燃料受け入れ 乾式カスク製作・検査 共用プール空き容量確保（既設仮保管設備受入） 乾式貯蔵設備（共用プール用）検討・設計・設置工事					現場作業 調達 現場作業	使用済燃料受け入れ作業																													(2028年度頃完了予定)
		乾式カスク製作・検査																												継続製作中	【主要工程】 ・実施計画変更認可（'20/9/29） 【規制庁関連】 ・基数変更及び収納燃料追加 実施計画変更認可（'24/1/15）														
		乾式カスク運搬作業																														(2027年度頃完了予定)	【主要工程】 ・乾式カスク運搬作業開始（'22/5/11～） ・乾式カスク運搬作業(6号機用22基中22基目完了（'24/2/16）】 ・乾式カスク運搬作業(5号機用20基中6基目完了（'25/7/8）】 ・乾式カスク仮保管設備エリア増設（'22/6～'23/4/21） ・乾式カスク仮保管設備エリア増設準備工事（'23/10/18～'24/5/31） ・乾式カスク仮保管設備エリア増設工事（'24/2/9～） 【規制庁関連】 ・設備増設 実施計画変更認可（'25/8/20）												
		乾式貯蔵設備（共用プール用）検討																												継続検討中	【主要工程】 ○3号機 使用済燃料プール内調査：'21/7/15～'21/10/6 ○3号機 使用済燃料プール内ガレキ撤去準備・ガレキ撤去：'21/10/7～ ○3号機 使用済燃料プールからの高線量機器取り出し：'23/3/7～ ※○番号は、別紙配置図と対応														
		高線量機器取り出し	制御棒等高線量機器取り出し	3号機	(実 績) ・高線量機器取り出し方法の検討 ・プール内ガレキ撤去 ・高線量機器取り出し (予 定) ・高線量機器取り出し方法の検討 ・プール内ガレキ撤去 ・高線量機器取り出し	現場作業	⑥-1 プール内ガレキ撤去準備・ガレキ撤去																												(2028年度頃完了予定)	【主要工程】 ○3号機 使用済燃料プール内調査：'21/7/15～'21/10/6 ○3号機 使用済燃料プール内ガレキ撤去準備・ガレキ撤去：'21/10/7～ ○3号機 使用済燃料プールからの高線量機器取り出し：'23/3/7～ ※○番号は、別紙配置図と対応									
⑥-2 高線量機器取り出し																												(2028年度頃完了予定)	【主要工程】 ○4号機 使用済燃料プールからの高線量機器取り出し：'25/3/24～ （保管先確保後、再開予定） ※○番号は、別紙配置図と対応																
高線量機器取り出し方法の検討、取り出し機器・容器等の設計・製作																														(2026年度以降完了予定)	【主要工程】 ○4号機 使用済燃料プールからの高線量機器取り出し：'25/3/24～ （保管先確保後、再開予定） ※○番号は、別紙配置図と対応														
高線量機器取り出し方法の検討、取り出し機器・容器等の設計・製作																												(2026年度以降完了予定)	【主要工程】 ○4号機 使用済燃料プールからの高線量機器取り出し：'25/3/24～ （保管先確保後、再開予定） ※○番号は、別紙配置図と対応																

廃炉中長期実行プラン2025

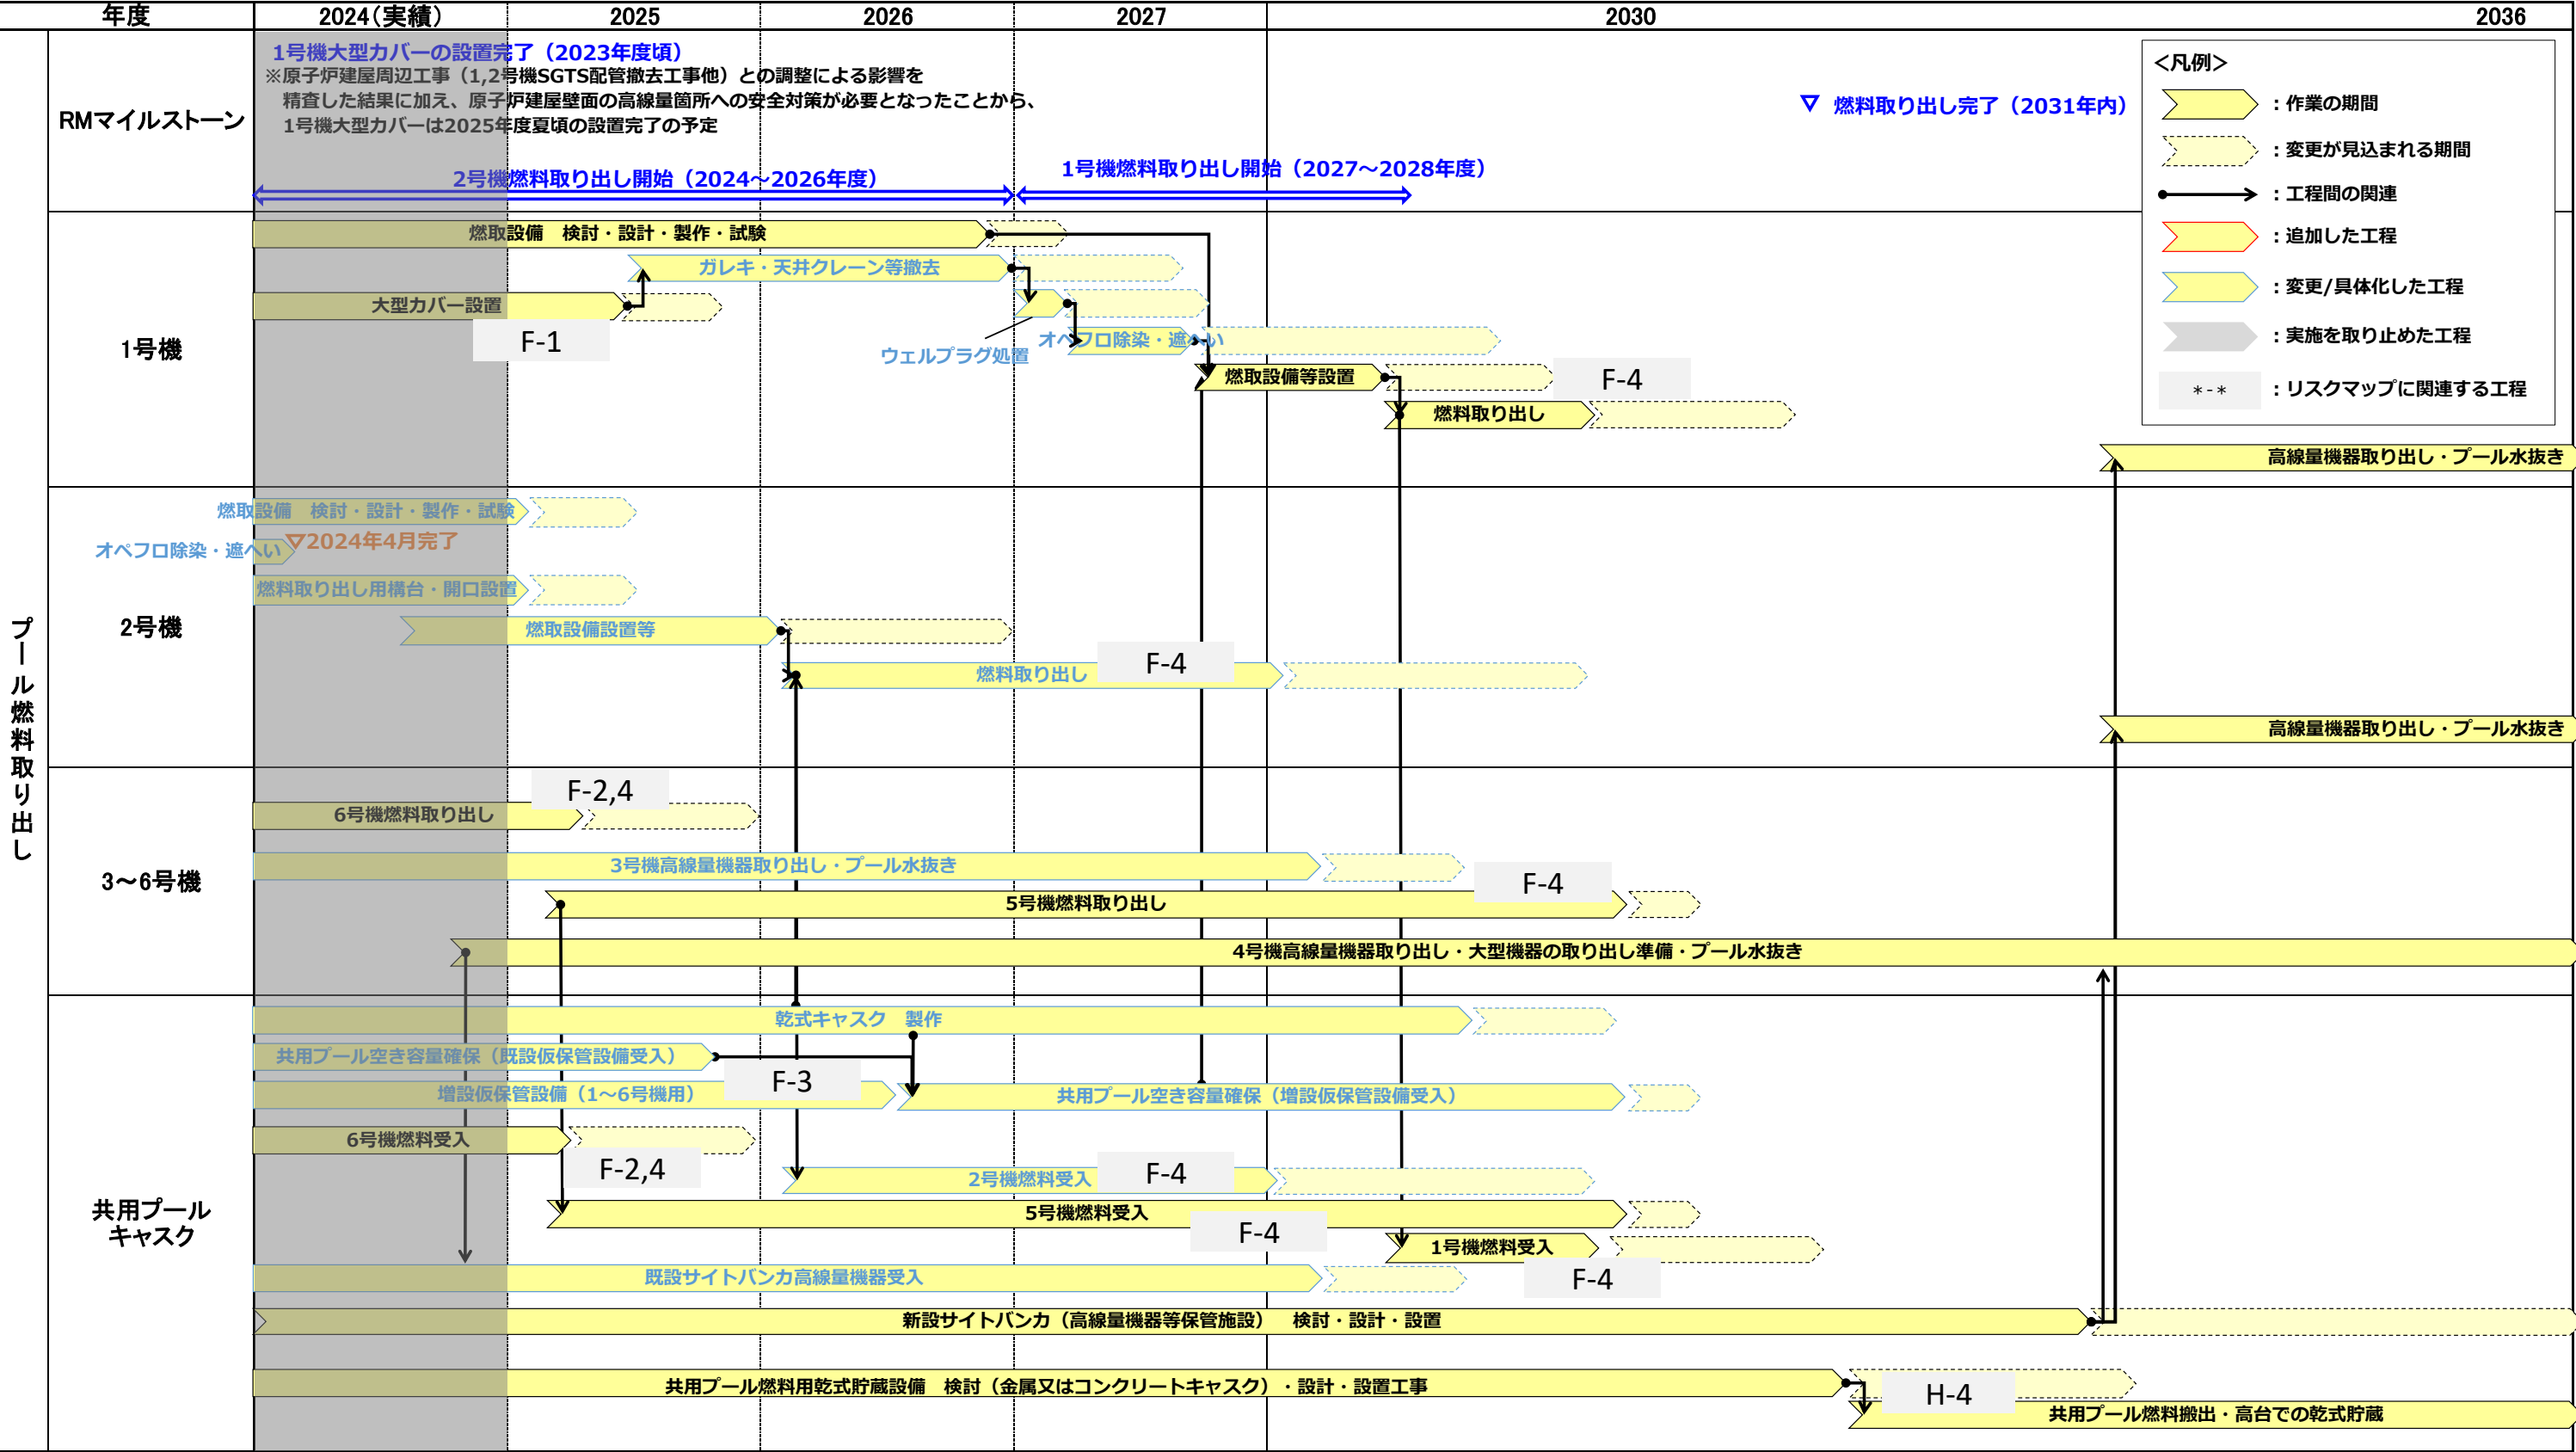

注：今後の検討に応じて、記載内容には変更があり得る
