


汚染水対策スケジュール（1/2）

汚染水対策分野	経路の概要	対象設備・作業内容	これまで1ヶ月の動きと今後6ヶ月の予定	3月					4月					5月			6月		7月		8月		9月		10月以降	備考	
				1	8	15	22	29	1	5	12	19	26	1	8	15	1	8	15	1	8	15	22	29			
●建屋滞留水の処理		建屋内滞留水	【1～4号機 滞留水移送装置】 （実績） ・1～4号機滞留水移送装置運転 （予定） ・1～4号機滞留水移送装置運転	現場作業 1～4号機滞留水移送装置設置 運転																					（継続運転）	プロセス主建屋・高温焼却炉建屋滞留水移送装置の設置に係る実施計画変更（2025年6月27日認可）	
			【α核種除去設備検討】	設計・工事						詳細設計・工事																（2027年度工事完了予定）	α核種除去設備の設置に係る実施計画変更（2024年6月27日申請）
			【1～4号機 T/B床面スラッジ等の回収方法検討】	設計・検討						設計検討																	
			【滞留水一時貯留設備】	設計・工事						詳細設計・工事																（2027年度工事完了予定）	建屋滞留水一時貯留設備の設置に係る実施計画変更（2025年1月21日認可）
			【プロセス主建屋・高温焼却建屋ゼオライト工費の検討】	容器封入集積作業						容器封入作業 詳細設計・工事																	
●汚染水発生量を50～70m3/日程度に抑制(2028年度末)		浄化設備	【既設多核種除去設備】 【高性能多核種除去設備】 【増設多核種除去設備】 （実績） ・処理運転 （予定） ・処理運転	現場作業 処理運転（処理水の状況に応じて適宜運転または処理停止）																				（継続運転）	処理水及びタンクのインサービス状況に応じて適宜運転または処理停止 増設多核種除去設備 前処理設備改造に係る実施計画変更申請（2022年4月28日認可） 一使用前検査終了後稼働（2024年6月31日） 濃縮液の試験的先行処理実施中（予定していた先行処理は完了し、現在分析実施中） 前処理設備改造後の401試験終了（2026年3月19日）		
			【サブドレン浄化設備】 （実績） ・処理運転 （予定） ・処理運転	現場作業 処理運転																						（継続運転）	
			【地下水バイパス設備】 （実績） ・運転 （予定） ・運転	現場作業 運転																						（継続運転）	
			【セシウム吸着装置】 【第二セシウム吸着装置】 【第三セシウム吸着装置】 （実績） ・処理運転 （予定） ・処理運転	現場作業 処理運転																						（継続運転）	
			【RO-3】 【建屋内RO 濃縮設備】 （実績） ・運転 （予定） ・運転	現場作業 運転																						（継続運転）	
		陸側遮水壁	（実績） ・維持管理運転 （予定） ・維持管理運転	現場作業 維持管理運転																						（継続運転）	・点検に伴うプラント1系統停止期間（2026/3/17～2026/3/26） ・点検に伴うプラント2系統停止期間（2026/3/17～2026/3/19）
			【東土屋内フェーシング（全6万㎡）】 （実績・予定） ・3号機西側エリア ・2号機建屋西側 ・1号機東側	現場作業						3号機西側エリア2号機建屋西側・1号機東側																	
			（実績・予定） ・2箇所の調査検討実施（2026年度） ・2026年4月 検討開始	現場作業																						2026年4月 調査検討開始	
			（実績・予定） 2号機・4箇所（2026年度） ・ ・4号機：3箇所 ・2号機：4箇所	現場作業																						2024年7月16日事業工事開始 2号機・4箇所・4箇所完了 4号機：2箇所/3箇所完了、4号機R/B：2026年2月10日現場着手	
			●タンク関連	タンク解体	（実績・予定） ・汚染の拡散状況把握	現場作業 モニタリング																					（継続実施）
【Eエリアフランジタンク解体工事】 （実績） ・解体基数 48基/49基 ・Eエリアフランジタンク（D1）内の残水回収（スラッジ含む）完了 （予定） ・Eエリアフランジタンク解体工事（タンク内洗浄・廃棄）：49基解体予定	現場作業 Eエリアフランジタンク解体工事																							（2026年度上期タンク解体完了予定） *D1タンク以外は解体完了済み	2018年9月10日：Eエリアにおける中低濃度タンクの撤去（実施計画変更認可） 2025年1月9日：EエリアD1タンク内のスラッジ回収作業開始 2025年3月21日：タンク内でのスラッジ回収作業開始 2025年11月17日：D1タンク内スラッジ回収完了 2026年1月14日：D1タンクアウトサービス 2026年2月2日：D1タンク除去に向けた準備作業開始 2026年4月10日：D1タンク除去作業完了		
【J8/J9エリアタンク解体工事】 （実績・予定） ・J9エリアタンク解体基数 12基/12基 ・J8エリアタンク解体工事 6基/9基	現場作業 ▼3/9 3基目解体完了								▼4/3 4基目解体完了																2025年2月3日：実施計画認可 2025年2月14日：解体作業開始 2025年9月3日：J9エリアタンク解体完了 2025年11月20日：J8エリアアウトサービス 2026年1月20日：J8エリアタンク解体開始		
【搬置きタンク解体工事】 （実績） ・解体基数 22基/367基 （予定） ・搬置きタンク解体工事	現場作業																								搬置きタンクの解体に係る実施計画変更（2024年5月17日認可） 2024年10月10日未使用タンクの搬入実施 2024年11月：未使用タンクから除染解体試験開始 22基/28基 未使用タンク解体完了 2025年2月3日に発生した火災トラブルにより現場作業中断。 2025年6月12日、火災発生原因と対策の方向性について公表。 2026年1月21日から作業再開		
●自然災害対策	津波対策	○サブドレン集水設備高台機能移転 （実績・予定）ろ過水タンク西側整備工事実施（完了） 地盤改良（完了） 集水設備設置（10基）（完了） 移送設備設置	現場作業 サブドレン集水設備高台機能移転工事																				2030年度竣工予定	2024年11月1日：変更申請認可 2025年3月17日～19日 使用前検査一部受検完了（高台集水タンク） 8.5m崖受けタンク設置エリアの見直し（検討中）に伴う工事期間の延伸 2026年1月21日～22日 使用前検査一部受検完了（高台集水タンク室）			

廃炉中長期実行プラン2026

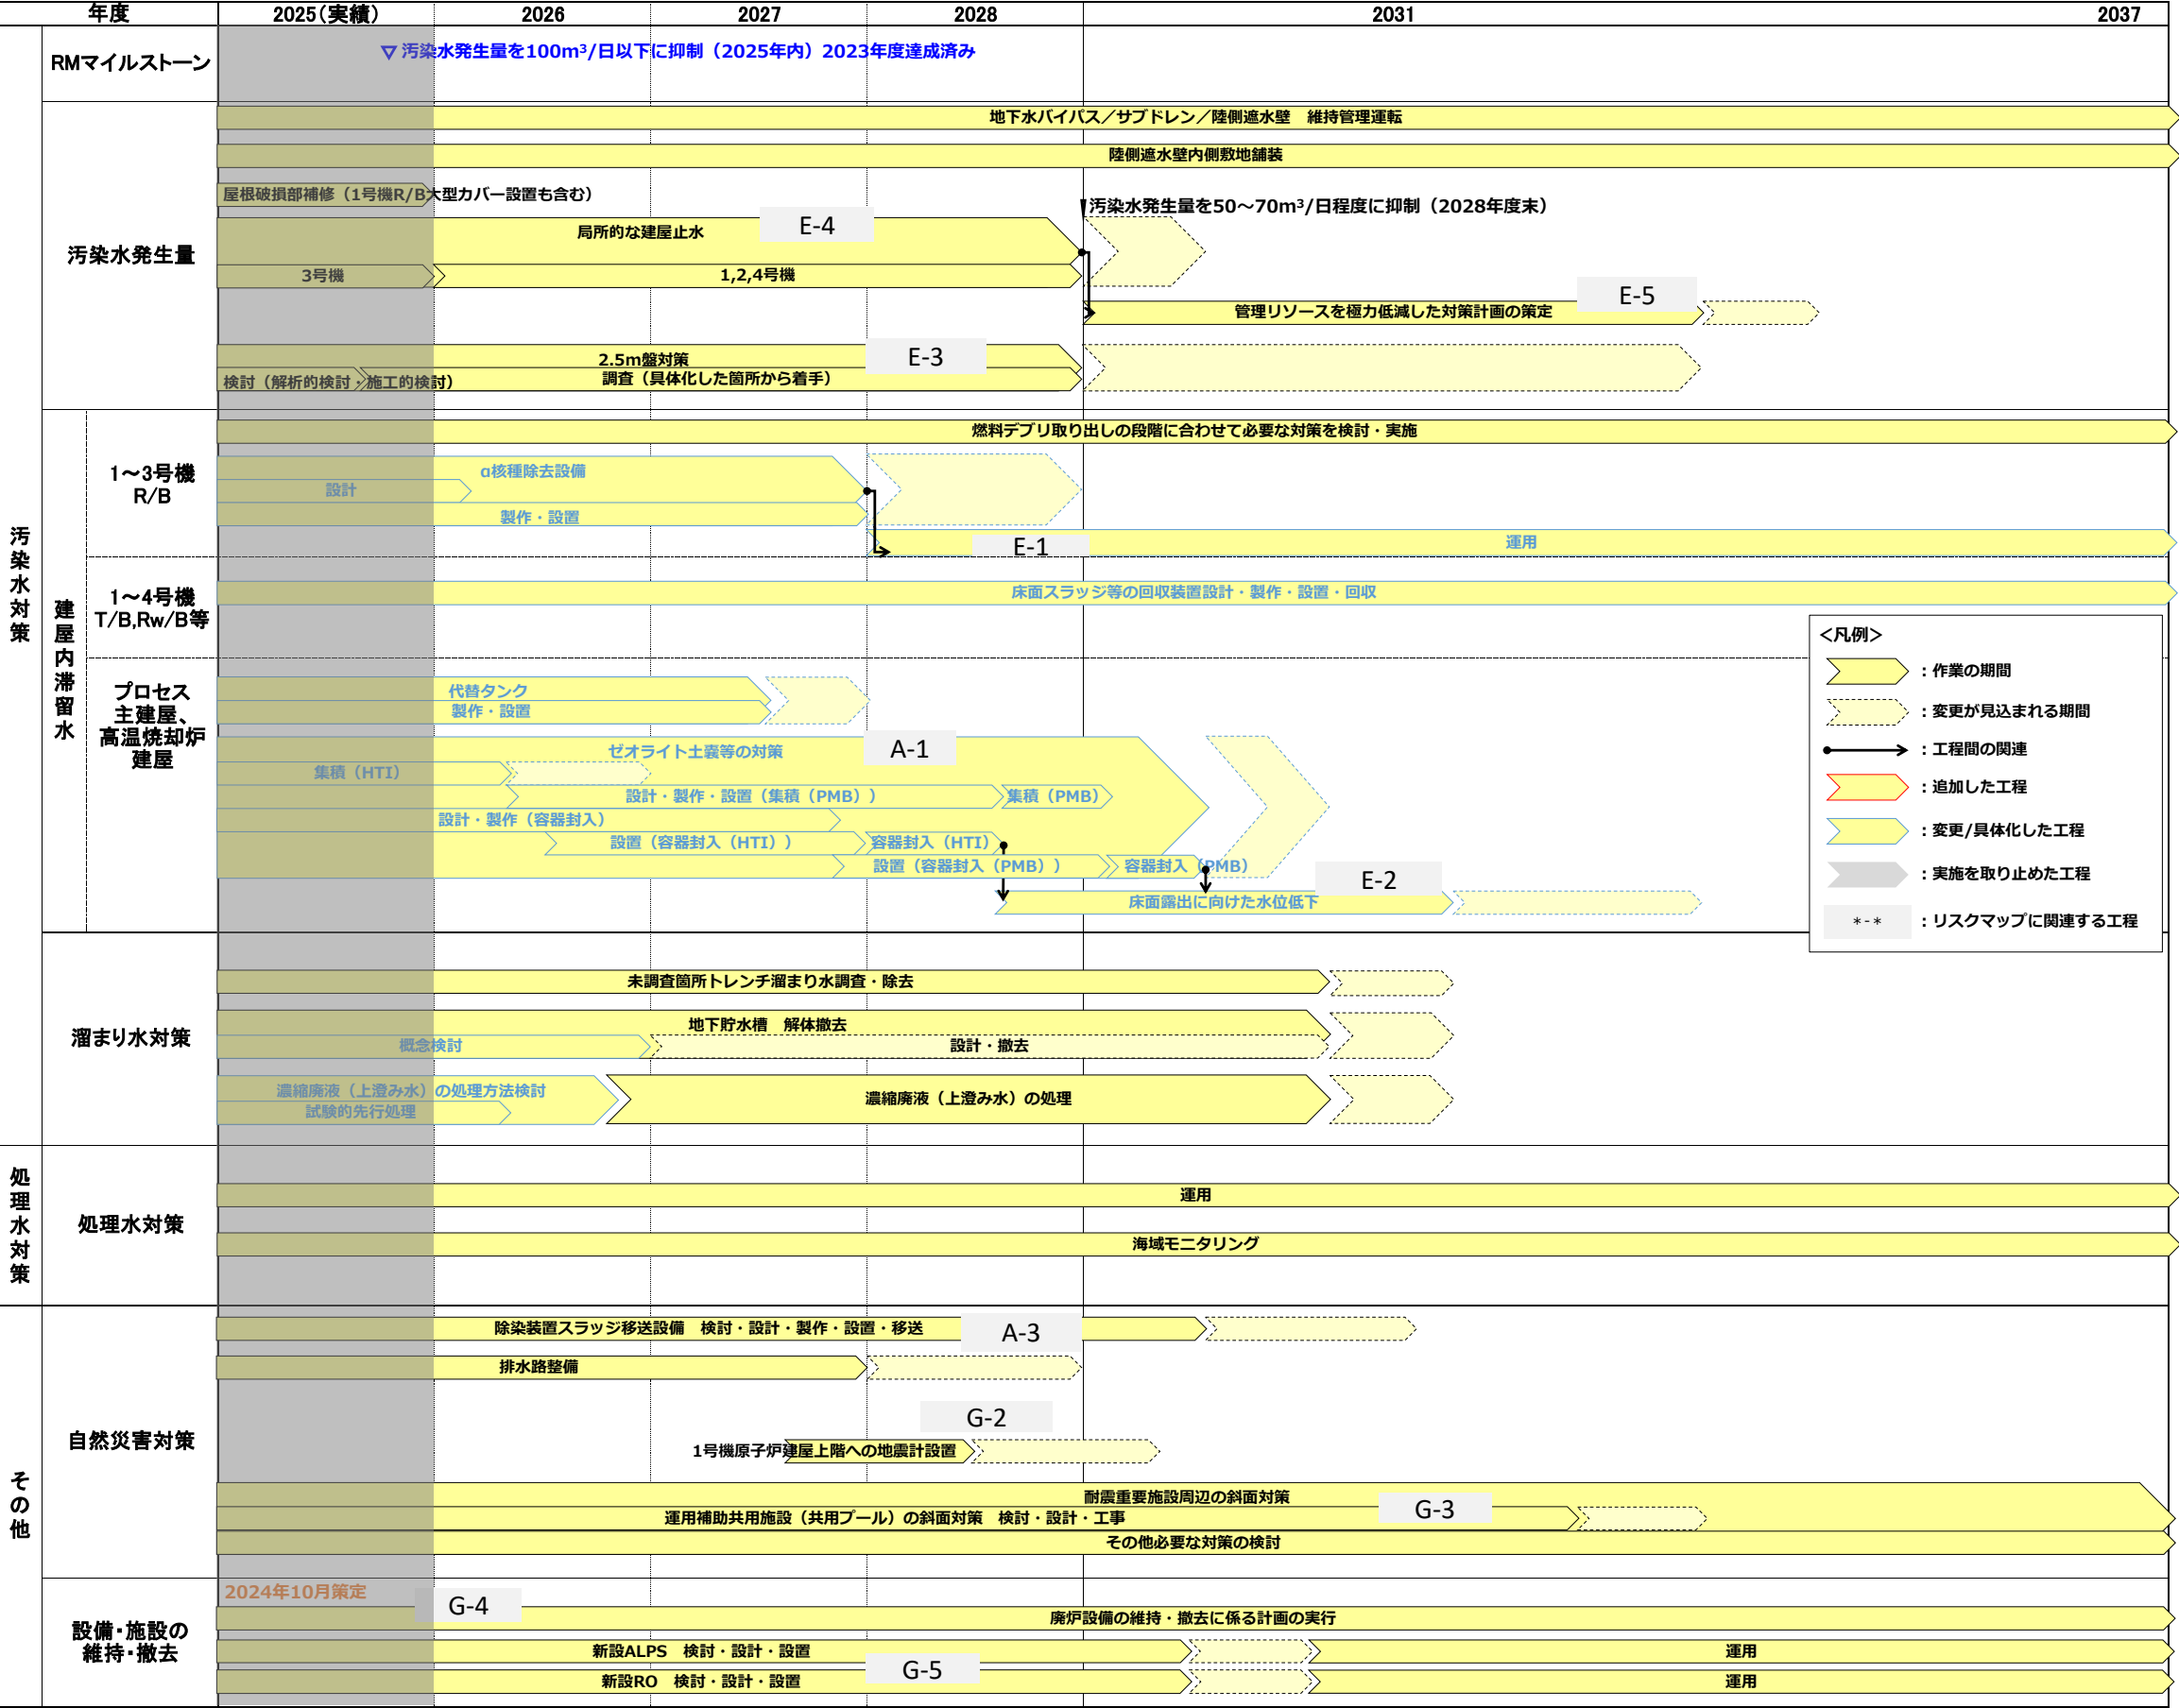

注：今後の検討に応じて、記載内容には変更があり得る
