


分野名	施設中長期実行プラン2026 目標工程	括り	作業内容	これまで1ヶ月の動きと今後6ヶ月の予定	3月		4月		5月			6月			7月			8月			9月			10月 以降	備 考		
					22	29		5	12	19	26		3	10	17	下	上	中	下	上	中	下	上			中	下
使用済燃料プール対策	●1号機大型カバーの設置完了(2023年度頃) ●1号機燃料取り出しの開始(2027～2028年度) ●2号機燃料取り出しの開始(2024～2026年度) ●1～6号機燃料取り出し完了(2031年内)	カバ－	燃料取り出し用カバーの詳細設計の検討 原子炉建屋上部のガレキの撤去 燃料取り出し用カバーの設置工事	1号機 (実 績) ・大型カバー、ガレキ撤去の検討・設計 ・現地調査等 ・【構内】大型カバー換気設備他設置工事 (予 定) ・大型カバー、ガレキ撤去の検討・設計 ・現地調査等 ・ガレキ撤去	検討・設計	大型カバー、ガレキ撤去の検討・設計																			(2027年度完了予定)	【主要工程】 ○ガレキ撤去 ・ガレキ撤去：'18/1/22～20/11/24（大型カバー設置後に再開予定） ・ウェルプラグ調査：'19/7/17～'19/8/26 ・SFP内干渉物等調査：'19/8/2、'19/9/4～6 9/20、27 ・SFPゲートカバー設置：'20/3/16～'20/3/18 ・SFP養生設置（準備作業含む）：'20/3/20～'20/6/18 ・FHM支保設置（準備作業含む）：'20/9/15～'20/10/23 ・天井クレーン支保設置（準備作業含む）：'20/10/28～'20/11/24 ○大型カバー設置 ・大型カバー仮設構台等設置：'21/8/28～'24/4/11 ・本体鉄骨（下部架構）設置：'23/6/19～'24/11/4 ・本体鉄骨（上部架構）設置：'24/11/15～'25/8/28 ・本体鉄骨（ボックスリング）設置：'25/5/21～'25/10/12 ・本体鉄骨（可動屋根）設置：'25/11/7～'26/1/19 ・ガレキ撤去用天井クレーン設置：'26/1/20～'26/3/19 ・大型カバー換気設備他設置工事：'24/12/16～'26/4/8 ・外周鉄骨撤去：'24/10/29～'25/9/5 【規制庁関連】 ・オペレーティングフロア床上ガレキの一部撤去等 実施計画変更認可（'19/3/1） ・大型カバー 実施計画変更認可（'23/3/23） ・大型カバー換気設備他 実施計画変更認可（'22/10/27） ※○番号は、別紙配置図と対応	
					現場作業	①現地調査等（'13/7/25～） ガレキ撤去で調査継続 【構内】大型カバー換気設備他設置工事 実績反映 ②ガレキ撤去																			(2027年度完了予定)		
					燃料取扱設備																				(2027年度完了予定)		
		燃料取り出し	燃料取扱設備	クレーン／燃料取扱機の設計・製作 プール内ガレキの撤去、燃料調査等	1号機 (実 績) ・燃料取り出し設備の検討・設計・製作 (予 定) ・燃料取り出し設備の検討・設計・製作 (実 績) ・4号機燃料取扱機搬出（燃料取扱機の有効活用）	検討・設計	燃料取り出し設備の検討・設計・製作																			(2027年度完了予定)	【主要工程】 ・燃料取り出し計画の選択：2014年10月ーフル燃料取り出しに特化したプランを選択 ・ガレキ撤去計画継続検討 ・燃料取り出し計画の選択：'19/12/19 【規制庁関連】 ・燃料取扱設備他 実施計画変更認可（'25/9/8） 【主要工程】 ・4号機燃料取扱機搬出：'25/11/4～'26/4/9 ※○番号は、別紙配置図と対応
						現場作業	4号機燃料取扱機搬出 実績反映																				
						2号機	③燃料取り出し訓練																				
		燃料取り出し	燃料取り出し	2号機燃料取り出し	2号機 (予 定) ・燃料取り出し	現場作業	④燃料取り出し作業																			(2028年度完了予定)	【主要工程】 ・燃料取扱設備の設置・試運転 ・燃料取り出し訓練：'26/3/25～ 【規制庁関連】 ・燃料取扱設備 実施計画変更認可（'22/12/23） ※○番号は、別紙配置図と対応
						5号機	燃料取り出し全体計画の反映																			(2031年までに完了予定)	
						6号機	新燃料搬出（準備作業含む）																			(2031年までに完了予定)	
	●その他プール燃料取り出し関連作業	共用プール	燃料受け入れ	(実 績) ・使用済燃料受け入れ (予 定) ・使用済燃料受け入れ	現場作業	使用済燃料受け入れ作業																				【主要工程】 ・5号機使用済燃料受け入れ（5号機→共用プール）：'25/7/28～【154/1,374体完了（2025/11/28）】 ・6号機使用済燃料受け入れ（6号機→共用プール）：'22/9/19～'25/4/16【1,456/1,456体完了（2025/4/16）】 ・SFPサイフォン防止配管修理工事：'24/2/26～'2/28	
					調達	乾式キャスク製作・検査																			継続製作者中		
					現場作業	乾式キャスク運搬作業 乾式キャスク仮保管設備エリア増設工事																			(2027年度完了予定)		
					検討・設計	乾式貯蔵設備（共用プール用）検討 (予 定) ・乾式貯蔵設備（共用プール用）検討																			継続検討中		
		高線量機器取り出し	制御棒等高線量機器取り出し	3号機 (実 績) ・高線量機器取り出し方法の検討 ・プール内ガレキ撤去 ・高線量機器取り出し (予 定) ・高線量機器取り出し方法の検討 ・プール内ガレキ撤去 ・高線量機器取り出し	検討・設計	高線量機器取り出し方法の検討、取り出し機器・容器等の設計・製作																			(2028年度完了予定)	【主要工程】 ○3号機 使用済燃料プール内調査：'21/7/15～'21/10/6 ○3号機 使用済燃料プール内ガレキ撤去準備・ガレキ撤去：'21/10/7～ ○3号機 使用済燃料プールからの高線量機器取り出し：'23/3/7～ ※○番号は、別紙配置図と対応	
					現場作業	⑤-1 プール内ガレキ撤去準備・ガレキ撤去 ⑤-2 高線量機器取り出し																			(2028年度完了予定)		
4号機 (実 績) ・高線量機器取り出し方法の検討 (予 定) ・高線量機器取り出し方法の検討				検討・設計	高線量機器取り出し方法の検討、取り出し機器・容器等の設計・製作																			(継続検討)	【主要工程】 ○4号機 使用済燃料プールからの高線量機器取り出し：'25/3/24～（保管先確保後、再開予定） ※○番号は、別紙配置図と対応		
				現場作業	⑥高線量機器取り出し																			(2037年度以降完了予定)			

廃炉中長期実行プラン2026

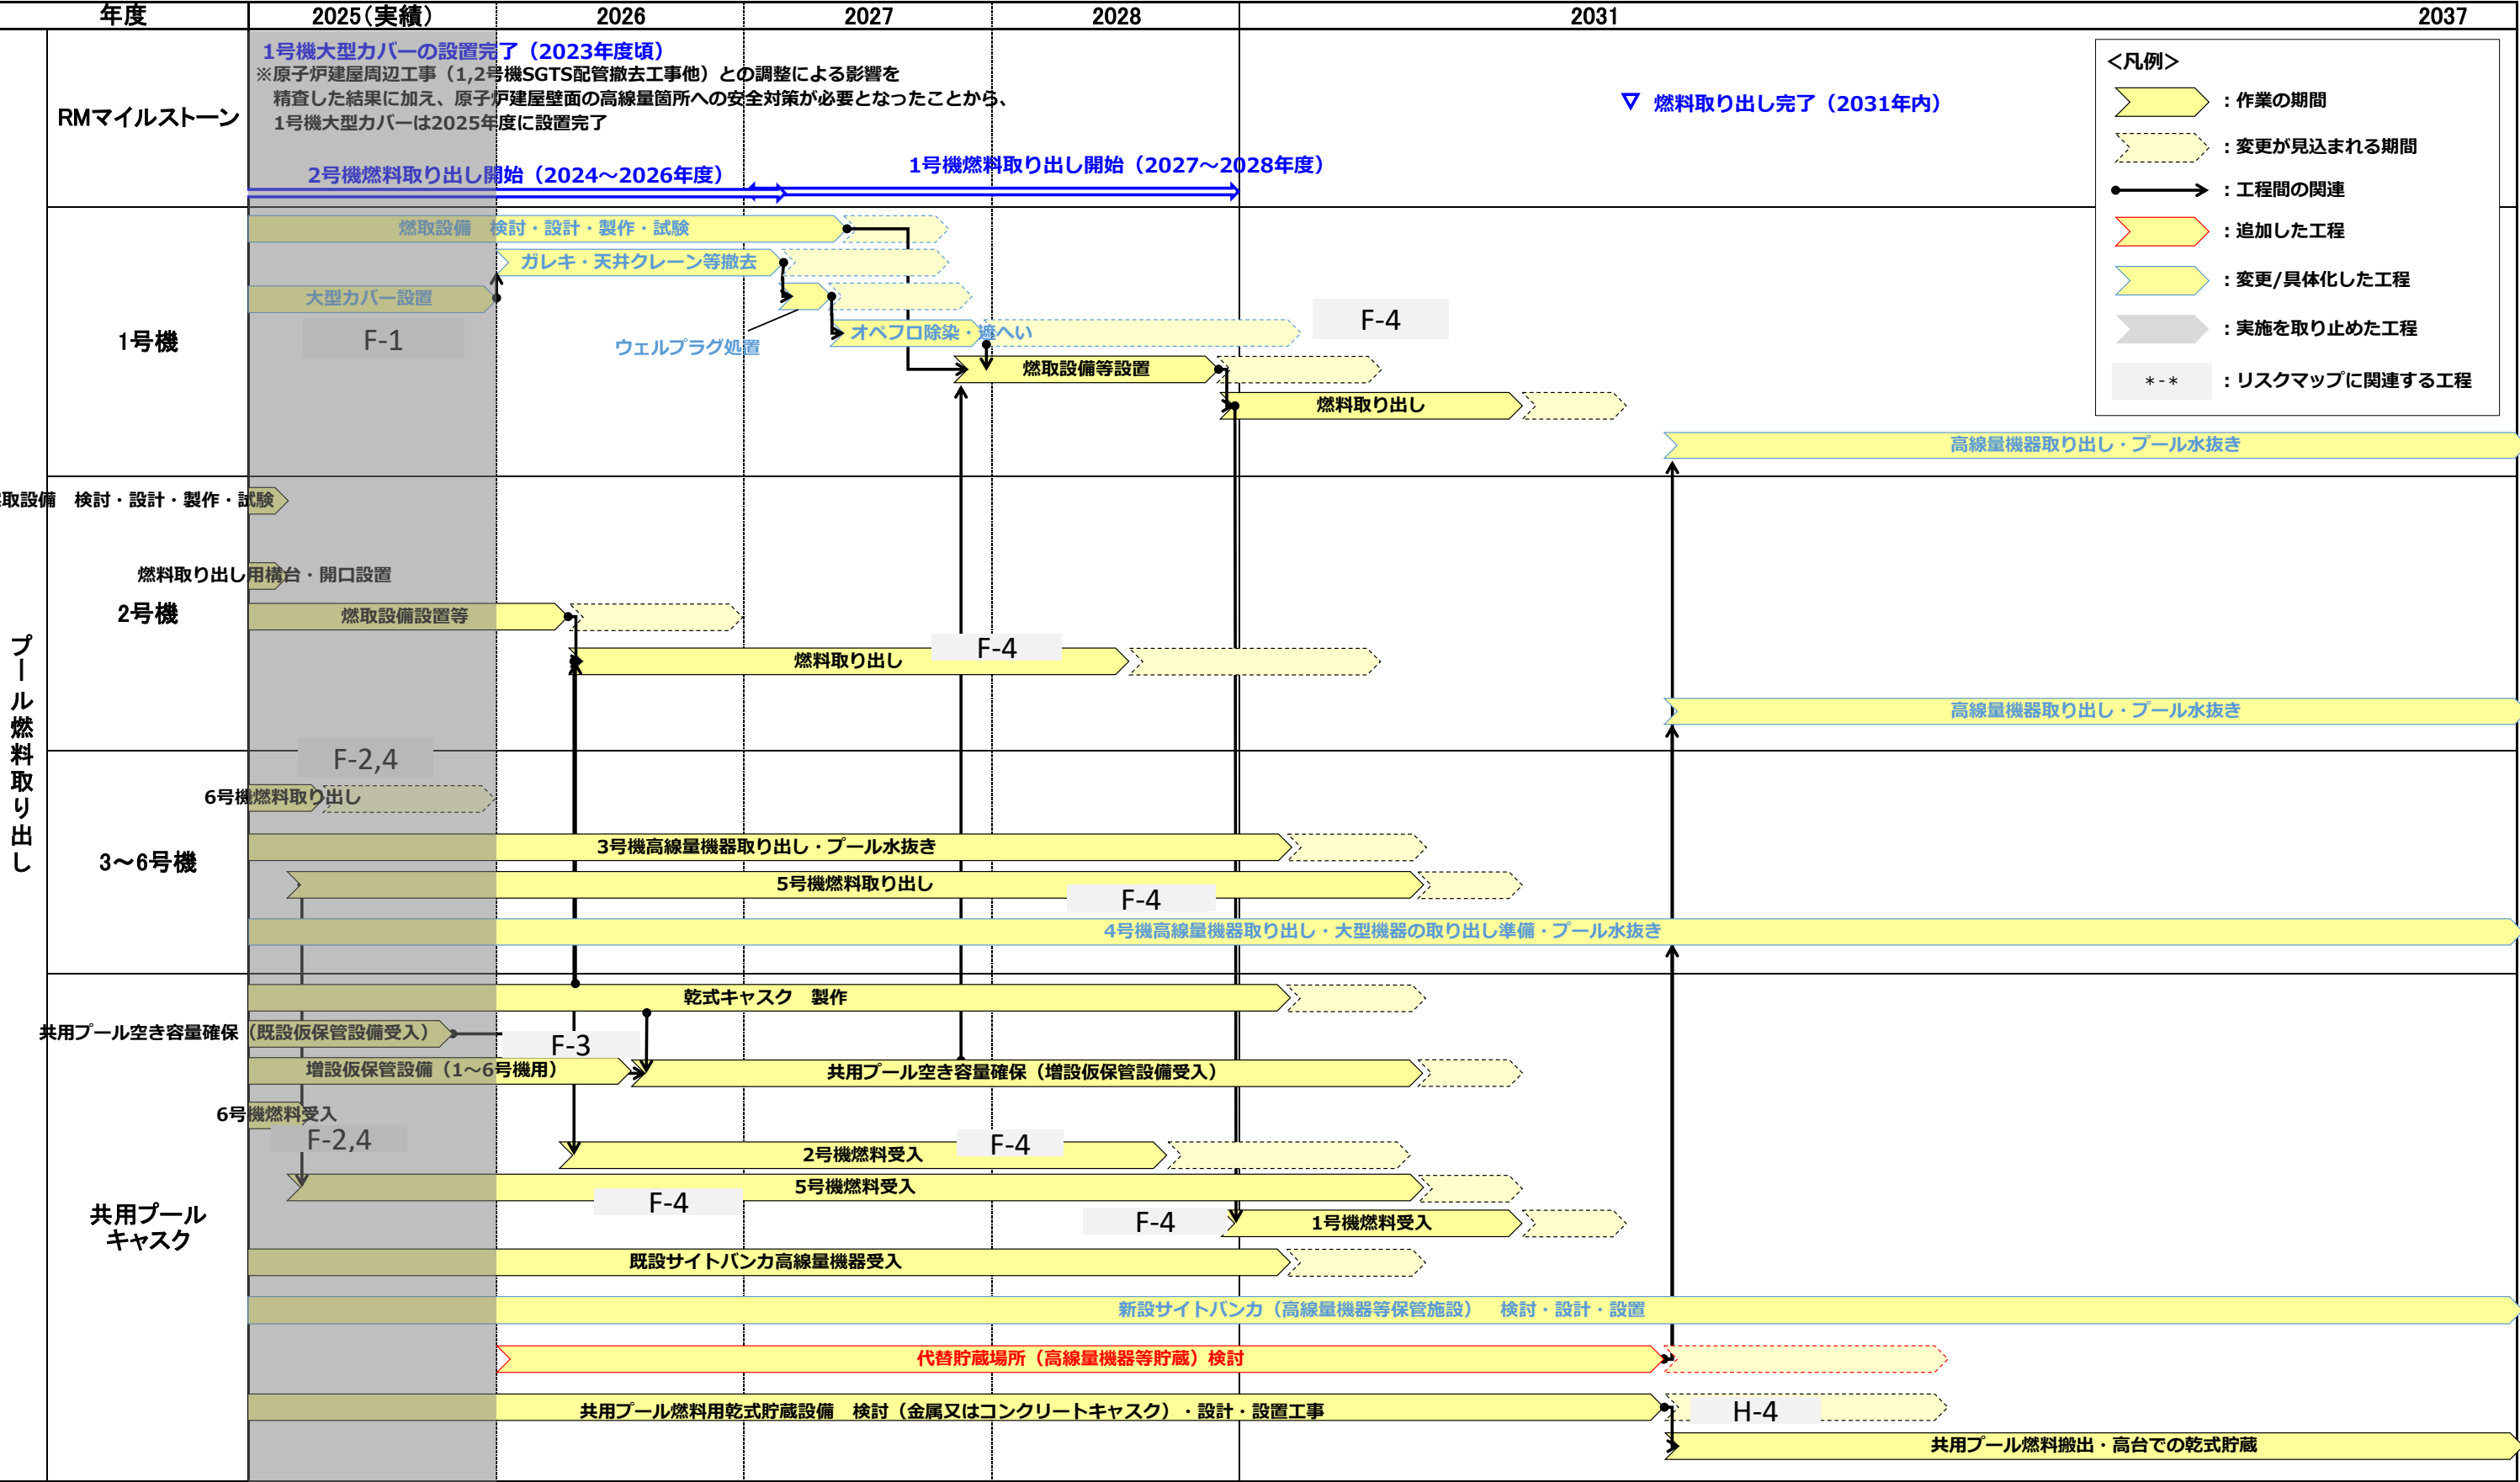

注：今後の検討に応じて、記載内容には変更があり得る
