


[illegible]

燃料デブリ取り出し準備 スケジュール

東京電力ホールディングス株式会社  
燃料デブリ取り出し準備  
2026/04/23現在

| 分野名         | 燃炉中長期実行プラン2026<br>目標工程    | 括り                                 | 作業内容                    | これまで1ヶ月の動きと今後6ヶ月の予定                                                                                                                                             | 3月                               |                                                    |    | 4月 |   |    |    | 5月 |   |   | 6月 |   |   | 7月 |   |   | 8月 |   |   | 9月 |   |   | 10月以降 |  |                                                                                                                                                 | 備 考    |                                                                                                                                                                        |
|-------------|---------------------------|------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------|----|----|---|----|----|----|---|---|----|---|---|----|---|---|----|---|---|----|---|---|-------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |                           |                                    |                         |                                                                                                                                                                 | 29                               | 30                                                 | 31 | 1  | 5 | 12 | 19 | 26 | 上 | 中 | 下  | 上 | 中 | 下  | 上 | 中 | 下  | 上 | 中 | 下  | 上 | 中 | 下     |  |                                                                                                                                                 |        |                                                                                                                                                                        |
|             |                           | P<br>V<br>/<br>P<br>C<br>V<br>健全性維 | 圧力容器<br>/格納容器の<br>健全性維持 | (実 績)<br><br>(予 定)<br>○原子炉格納容器内部調査                                                                                                                              | 現場作業                             |                                                    |    |    |   |    |    |    |   |   |    |   |   |    |   |   |    |   |   |    |   |   |       |  | PCV内部気中部調査（マイクロドローン調査）<br>・準備作業 '25/10/23～'26/3/3<br>・PCV内部気中部調査（マイクロドローン調査）<br>'26/3/5～'26/3/19<br><br>常設監視計器取り外し<br>・準備作業 '25/10/20～'25/10/30 |        |                                                                                                                                                                        |
|             |                           |                                    |                         | (実 績)<br>○腐食抑制対策<br>・窒素バブリングによる原子炉冷却水中の溶存酸素低減実施（継続）<br><br>(予 定)<br>○腐食抑制対策<br>・窒素バブリングによる原子炉冷却水中の溶存酸素低減実施（継続）                                                  | 検討・設計                            |                                                    |    |    |   |    |    |    |   |   |    |   |   |    |   |   |    |   |   |    |   |   |       |  |                                                                                                                                                 |        |                                                                                                                                                                        |
|             |                           |                                    |                         | 現場作業                                                                                                                                                            | 腐食抑制対策（窒素バブリングによる原子炉冷却水中の溶存酸素低減） |                                                    |    |    |   |    |    |    |   |   |    |   |   |    |   |   |    |   |   |    |   |   |       |  | (継続実施)                                                                                                                                          |        |                                                                                                                                                                        |
|             |                           | 炉心状況把握                             | 炉心状況把握                  | (実 績)<br>○事故関連factデータベースの更新（継続）<br>○炉内・格納容器内の状態に関する推定の更新（継続）<br><br>(予 定)<br>○事故関連factデータベースの更新（継続）<br>○炉内・格納容器内の状態に関する推定の更新（継続）                                | 検討・設計                            | 事故関連factデータベースの更新                                  |    |    |   |    |    |    |   |   |    |   |   |    |   |   |    |   |   |    |   |   |       |  |                                                                                                                                                 | (継続実施) |                                                                                                                                                                        |
|             |                           |                                    |                         | 検討・設計                                                                                                                                                           | 炉内・格納容器内の状態に関する推定の更新             |                                                    |    |    |   |    |    |    |   |   |    |   |   |    |   |   |    |   |   |    |   |   |       |  | (継続実施)                                                                                                                                          |        |                                                                                                                                                                        |
|             |                           |                                    |                         | 現場作業                                                                                                                                                            |                                  |                                                    |    |    |   |    |    |    |   |   |    |   |   |    |   |   |    |   |   |    |   |   |       |  |                                                                                                                                                 |        | ○原子炉建屋内調査（地下階三角コーナの状況確認）<br>'22/12/2～'23/1/11（片付け含む）<br><br>○3号機原子炉建屋内調査<br>'24/5/13～'24/6/14<br><br>○1号機X-25ベネトレーション近傍の盲管調査（アクセス性確認）<br>'24/11/18～'24/11/27（準備、片付け含む） |
| 燃料デブリ取り出し準備 | ●燃料デブリの処理・処分方法の決定に向けた取り組み | 取出後の燃料・デブリ安定保管                     | 燃料デブリ性状把握               | (実 績)<br>○【研究開発】燃料デブリ性状把握のための分析・推定技術の開発<br>・燃料デブリ性状の分析に必要な技術開発等（継続）<br><br>(予 定)<br>○【研究開発】燃料デブリ性状把握のための分析・推定技術の開発<br>・燃料デブリ性状の分析に必要な技術開発等（継続）                  | 検討・設計                            | 【研究開発】燃料デブリの性状把握のための分析・推定<br>・燃料デブリ性状の分析に必要な技術開発等  |    |    |   |    |    |    |   |   |    |   |   |    |   |   |    |   |   |    |   |   |       |  |                                                                                                                                                 | (継続実施) | 事業名称：燃料デブリの性状把握のための分析・推定技術の開発<br>期間：2025年度～2026年度                                                                                                                      |
|             |                           |                                    |                         | 現場作業                                                                                                                                                            |                                  |                                                    |    |    |   |    |    |    |   |   |    |   |   |    |   |   |    |   |   |    |   |   |       |  |                                                                                                                                                 |        |                                                                                                                                                                        |
|             |                           |                                    |                         |                                                                                                                                                                 |                                  |                                                    |    |    |   |    |    |    |   |   |    |   |   |    |   |   |    |   |   |    |   |   |       |  |                                                                                                                                                 |        |                                                                                                                                                                        |
|             |                           | 燃料デブリ収納・移送・保管技術の開発                 | 燃料デブリ収納・移送・保管技術の開発      | (実 績)<br>○【研究開発】燃料デブリ収納・移送・保管技術の開発<br>粉状、スラリー・スラッジ状の燃料デブリ対応（継続）<br>燃料デブリ乾燥技術/システムの開発（完了）<br><br>(予 定)<br>○【研究開発】燃料デブリ収納・移送・保管技術の開発<br>粉状、スラリー・スラッジ状の燃料デブリ対応（継続） | 検討・設計                            | 【研究開発】粉状、スラリー・スラッジ状の燃料デブリ対応<br>（粉状及びスラリー・スラッジの分析等） |    |    |   |    |    |    |   |   |    |   |   |    |   |   |    |   |   |    |   |   |       |  |                                                                                                                                                 | (継続実施) | 事業名称：燃料デブリ収納・移送・保管技術の開発<br>期間：2025年度～2026年度                                                                                                                            |
|             |                           |                                    |                         | 現場作業                                                                                                                                                            |                                  |                                                    |    |    |   |    |    |    |   |   |    |   |   |    |   |   |    |   |   |    |   |   |       |  |                                                                                                                                                 |        |                                                                                                                                                                        |
|             |                           |                                    |                         |                                                                                                                                                                 |                                  |                                                    |    |    |   |    |    |    |   |   |    |   |   |    |   |   |    |   |   |    |   |   |       |  |                                                                                                                                                 |        |                                                                                                                                                                        |

- 凡 例
- ： 検討業務・設計業務・準備作業
  - ： 現場作業予定
  - ： 機器の運転継続のみで、現場作業（工事）がない場合
  - ： 記載以降も作業や検討が継続する場合は、端を矢印で記載
  - ： 工程調整中のもの

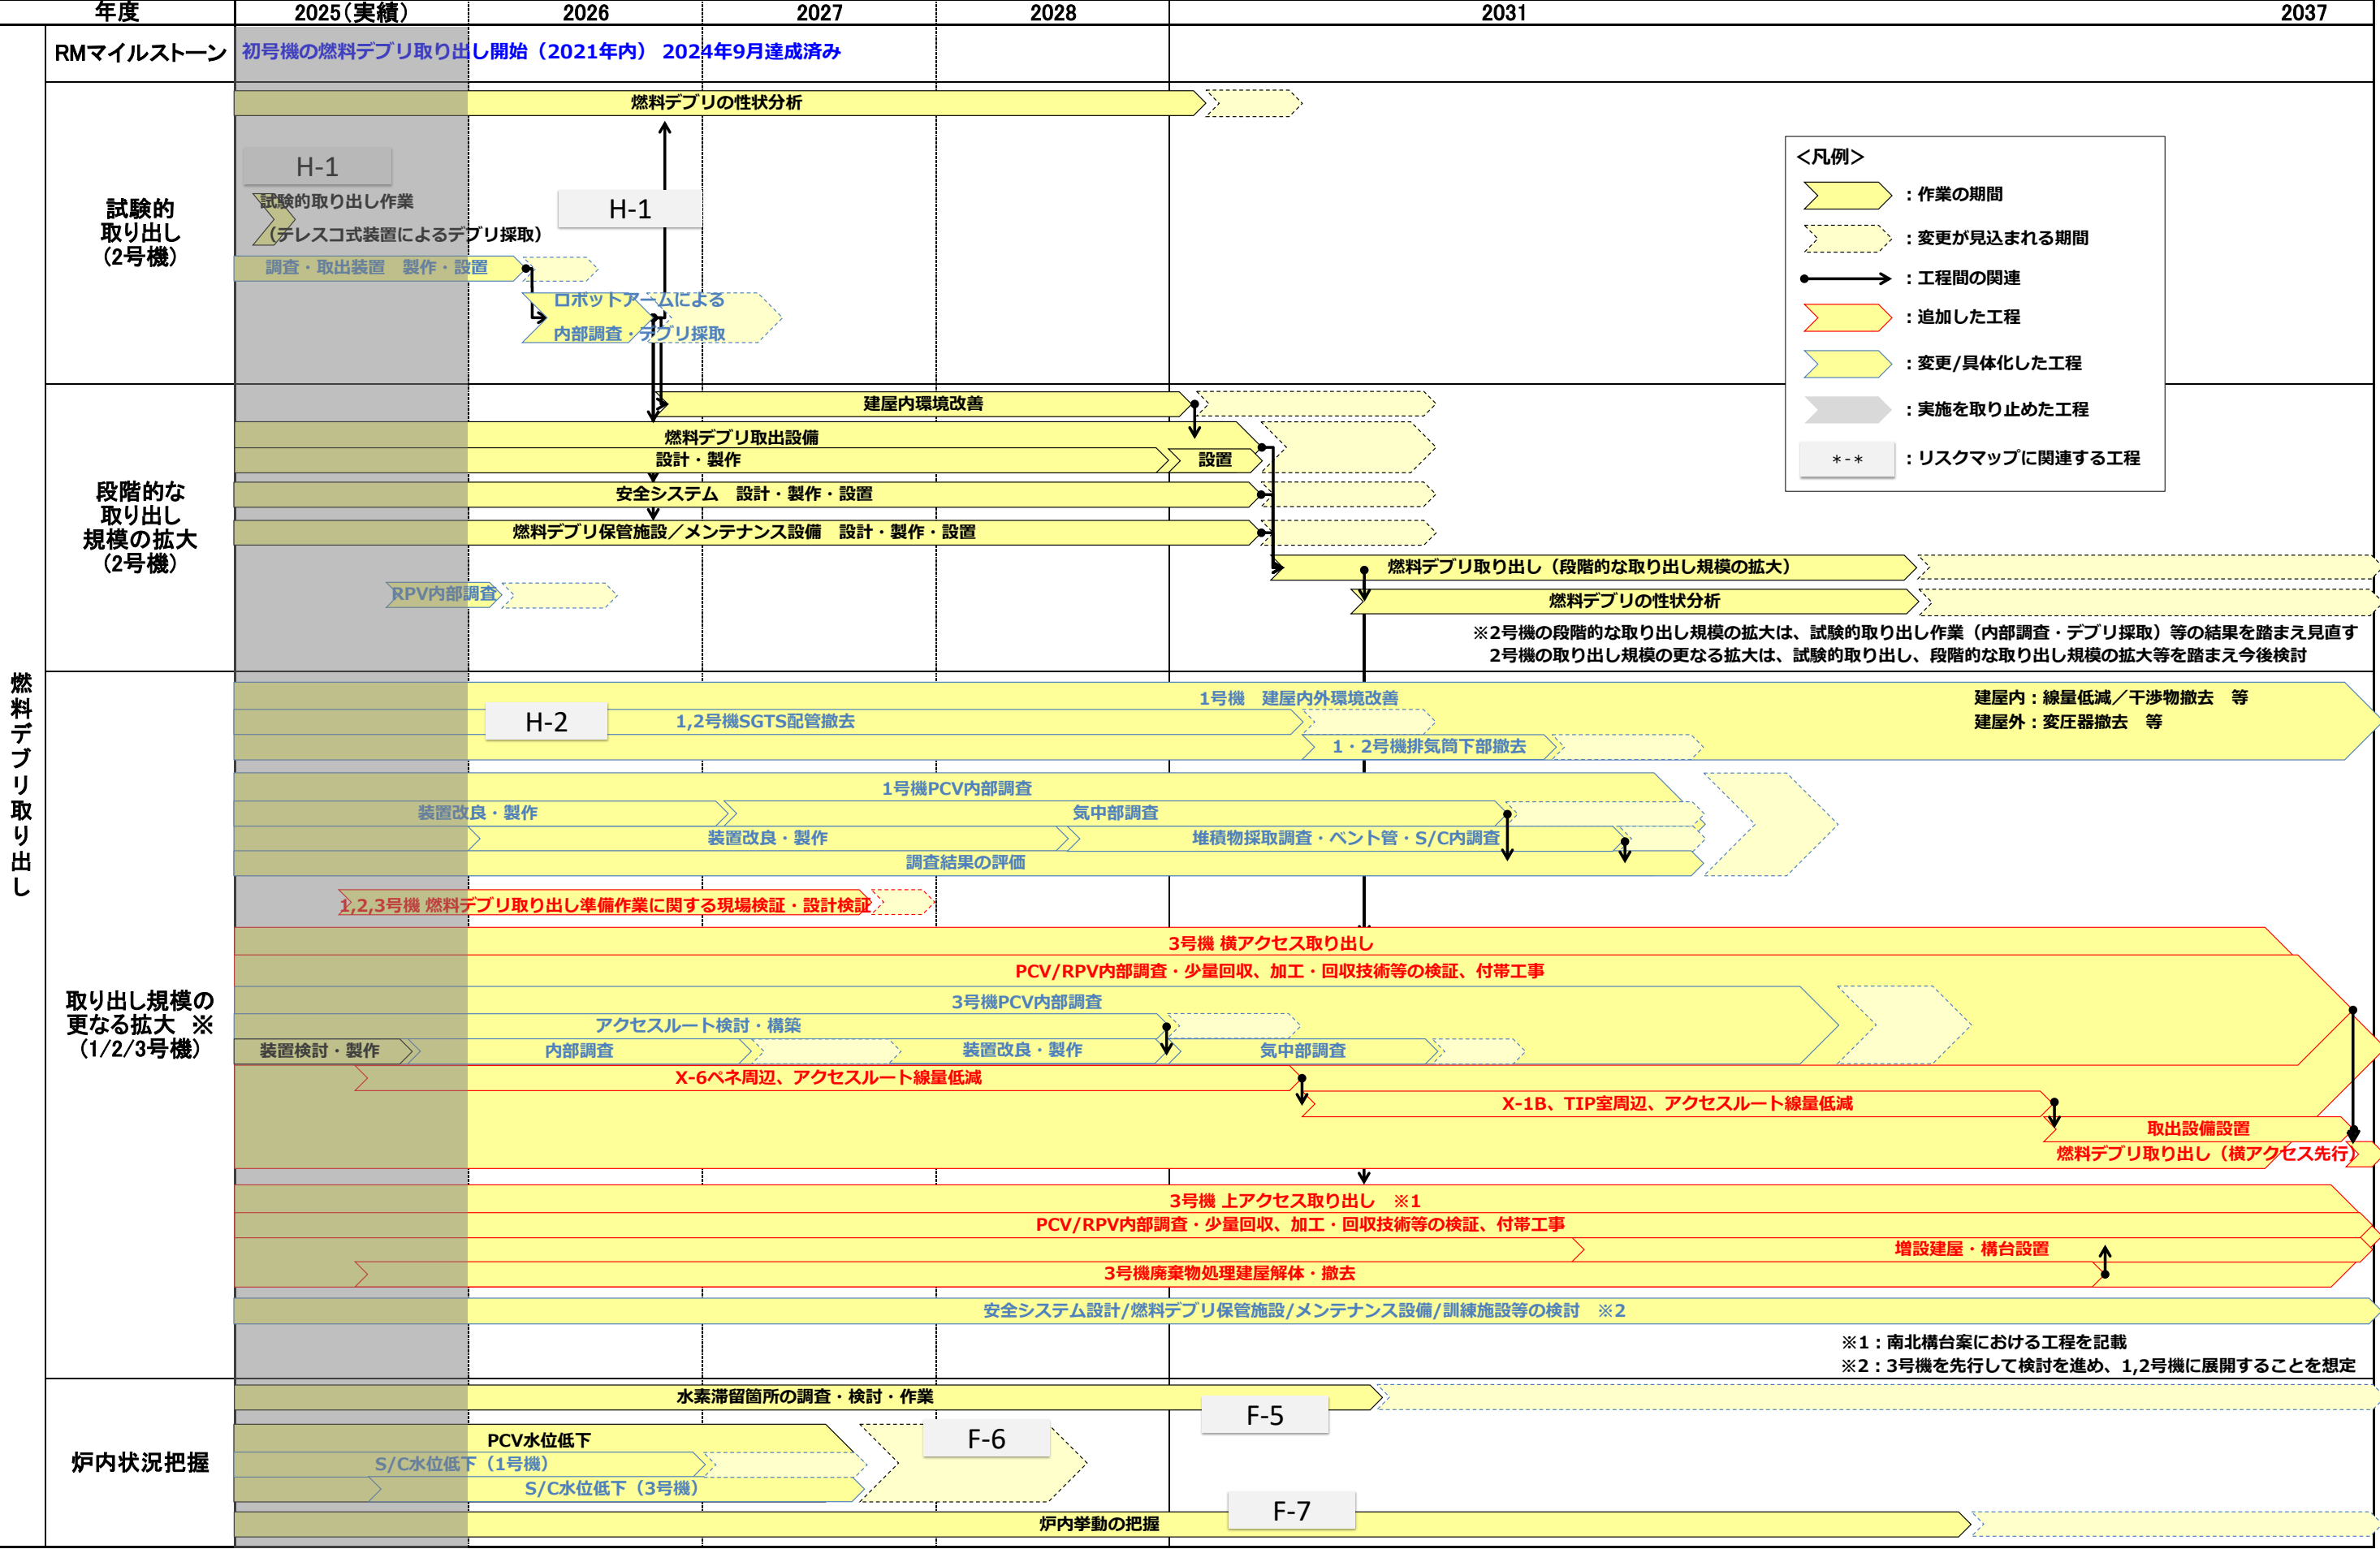

<凡例>

- : 作業の期間
- : 変更が見込まれる期間
- : 工程間の関連
- : 追加した工程
- : 変更/具体化した工程
- : 実施を取り止めた工程
- : リスクマップに関連する工程

注：今後の検討に応じて、記載内容には変更があり得る
