


陸側遮水壁の工事の進捗について

平成27年 11月17日

東京電力株式会社
鹿島建設株式会社

陸側遮水壁の工事の進捗について (1 / 5)

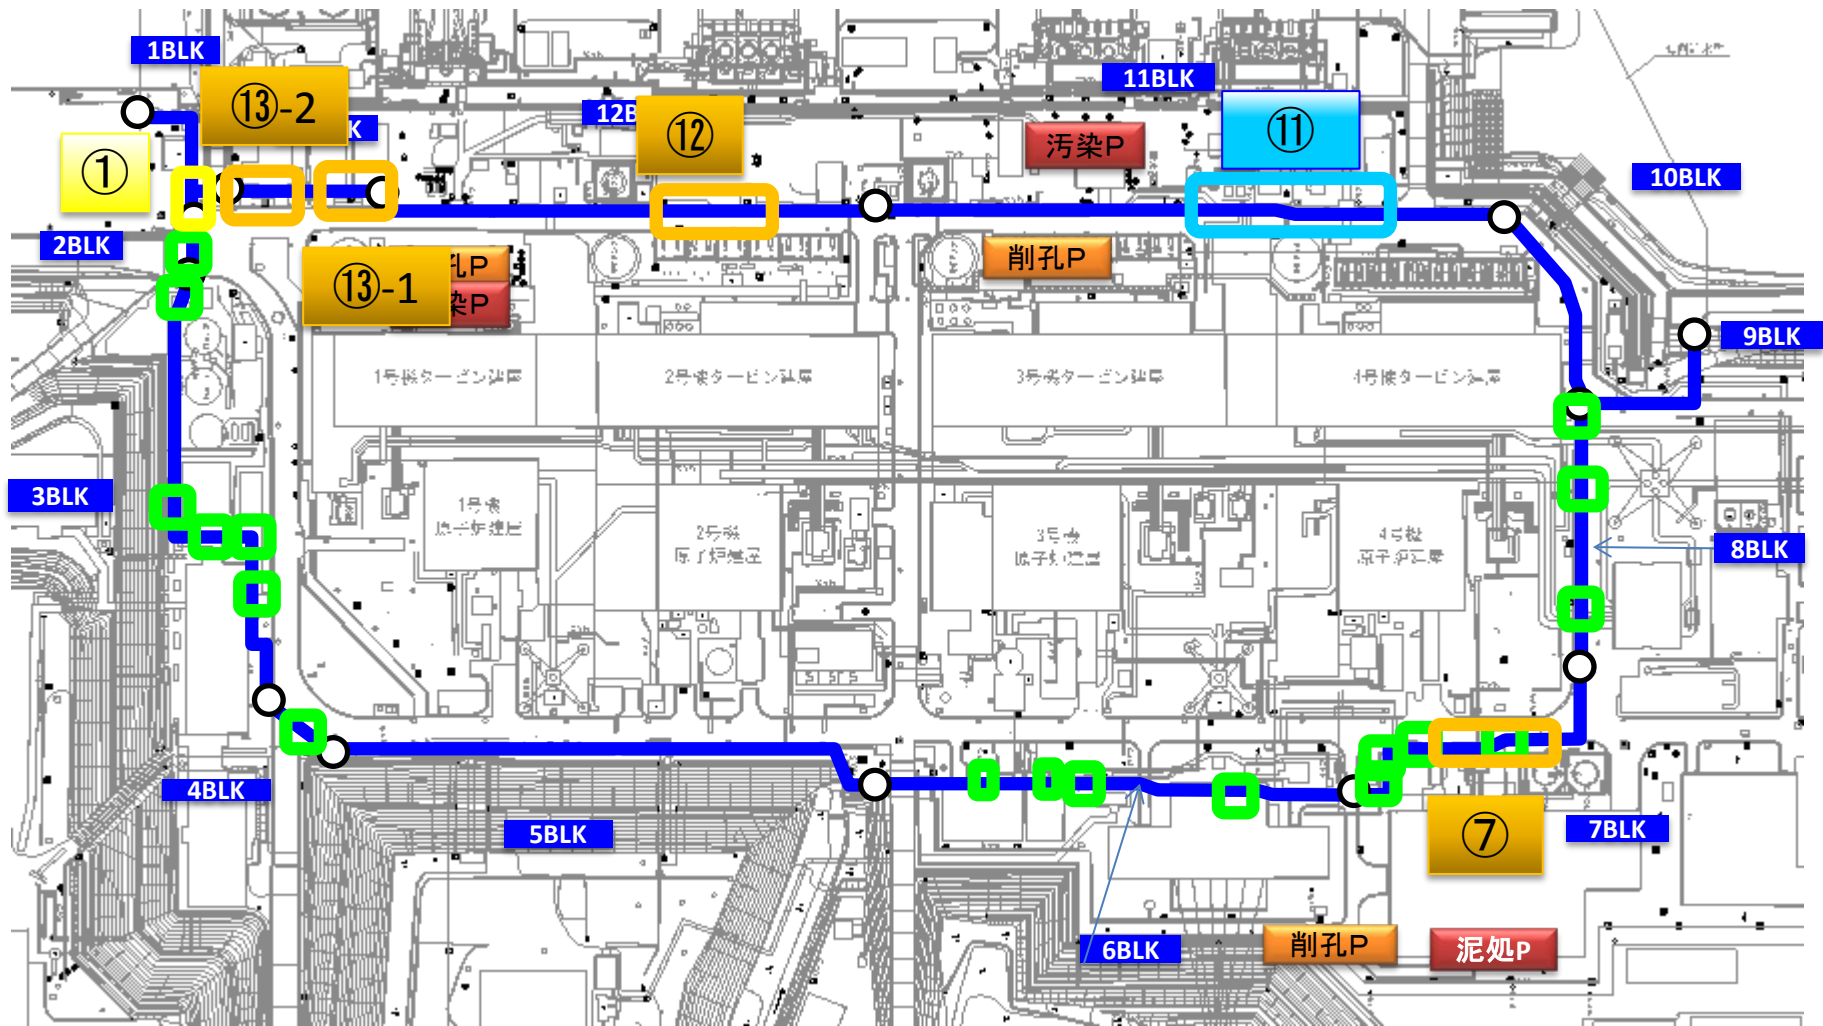

H27.9.15山側凍結のための工事完了、H27.10.15海側削孔完了、H27.11.9海側凍結管建込完了

□: 仮設 □: 建込・配管 □: 試験凍結中 □: 付帯

陸側遮水壁の工事の進捗について (2/5)

9月15日 山側凍結のための工事完了

11月9日 海側凍結管建込完了

山側先行凍結後の海側凍結開始に向け、海側地上配管作業等を実施中

ブロック		種別	設計本数	削孔		建込		スタンドパイプ			貫通		
				実績	進捗	実績	進捗	計画	実績	進捗	設計本数	実績	進捗
山側	1BLK	凍結管	75 本	75 本	100.0 %	75 本	100.0 %	—	—	—	【 H27.11.9現在】		
		測温管	16 本	16 本	100.0 %	16 本	100.0 %	—	—	—			
		計	91 本	91 本	100.0 %	91 本	100.0 %	—	—	—			
	2BLK	凍結管	19 本	19 本	100.0 %	19 本	100.0 %	—	—	—	—	—	—
		測温管	5 本	5 本	100.0 %	5 本	100.0 %	—	—	—	—	—	—
		計	24 本	24 本	100.0 %	24 本	100.0 %	—	—	—	—	—	—
	3BLK	凍結管	199 本	199 本	100.0 %	199 本	100.0 %	—	—	—	—	—	—
		測温管	43 本	43 本	100.0 %	43 本	100.0 %	—	—	—	—	—	—
		計	242 本	242 本	100.0 %	242 本	100.0 %	—	—	—	—	—	—
	4BLK	凍結管	33 本	33 本	100.0 %	33 本	100.0 %	—	—	—	7 本	7 本	100.0 %
		測温管	7 本	7 本	100.0 %	7 本	100.0 %	—	—	—	—	—	—
		計	40 本	40 本	100.0 %	40 本	100.0 %	—	—	—	7 本	7 本	100.0 %
	5BLK	凍結管	218 本	218 本	100.0 %	218 本	100.0 %	—	—	—	23 本	23 本	100.0 %
		測温管	47 本	47 本	100.0 %	47 本	100.0 %	—	—	—	3 本	3 本	100.0 %
		計	265 本	265 本	100.0 %	265 本	100.0 %	—	—	—	26 本	26 本	100.0 %
	6BLK	凍結管	193 本	193 本	100.0 %	193 本	100.0 %	—	—	—	19 本	19 本	100.0 %
		測温管	42 本	42 本	100.0 %	42 本	100.0 %	—	—	—	—	—	—
		計	235 本	235 本	100.0 %	235 本	100.0 %	—	—	—	19 本	19 本	100.0 %
	7BLK	凍結管	125 本	125 本	100.0 %	125 本	100.0 %	—	—	—	14 本	14 本	100.0 %
		測温管	29 本	29 本	100.0 %	29 本	100.0 %	—	—	—	1 本	1 本	100.0 %
		計	154 本	154 本	100.0 %	154 本	100.0 %	—	—	—	15 本	15 本	100.0 %
	8BLK	凍結管	102 本	102 本	100.0 %	102 本	100.0 %	—	—	—	—	—	—
		測温管	22 本	22 本	100.0 %	22 本	100.0 %	—	—	—	—	—	—
		計	124 本	124 本	100.0 %	124 本	100.0 %	—	—	—	—	—	—
9BLK	凍結管	72 本	72 本	100.0 %	72 本	100.0 %	—	—	—	7 本	7 本	100.0 %	
	測温管	17 本	17 本	100.0 %	17 本	100.0 %	—	—	—	1 本	1 本	100.0 %	
	計	89 本	89 本	100.0 %	89 本	100.0 %	—	—	—	8 本	8 本	100.0 %	
山側計	凍結管	1036 本	1036 本	100.0 %	1036 本	100.0 %	—	—	—	70 本	70 本	100.0 %	
	測温管	228 本	228 本	100.0 %	228 本	100.0 %	—	—	—	5 本	5 本	100.0 %	
	計	1264 本	1264 本	100.0 %	1264 本	100.0 %	—	—	—	75 本	75 本	100.0 %	
海側	10BLK	凍結管	83 本	83 本	100.0 %	83 本	100.0 %	83 本	83 本	100.0 %	—	—	—
		測温管	20 本	20 本	100.0 %	20 本	100.0 %	20 本	20 本	100.0 %	—	—	—
		計	103 本	103 本	100.0 %	103 本	100.0 %	103 本	103 本	100.0 %	—	—	—
	11BLK	凍結管	235 本	235 本	100.0 %	235 本	100.0 %	223 本	223 本	100.0 %	36 本	36 本	100.0 %
		測温管	56 本	56 本	100.0 %	56 本	100.0 %	54 本	54 本	100.0 %	3 本	3 本	100.0 %
		計	291 本	291 本	100.0 %	291 本	100.0 %	277 本	277 本	100.0 %	39 本	39 本	100.0 %
	12BLK	凍結管	160 本	160 本	100.0 %	160 本	100.0 %	146 本	146 本	100.0 %	28 本	28 本	100.0 %
		測温管	39 本	39 本	100.0 %	39 本	100.0 %	36 本	36 本	100.0 %	—	—	—
		計	199 本	199 本	100.0 %	199 本	100.0 %	182 本	182 本	100.0 %	28 本	28 本	100.0 %
	13BLK	凍結管	54 本	54 本	100.0 %	54 本	100.0 %	—	—	—	4 本	4 本	100.0 %
		測温管	16 本	16 本	100.0 %	16 本	100.0 %	—	—	—	—	—	—
		計	70 本	70 本	100.0 %	70 本	100.0 %	—	—	—	4 本	4 本	100.0 %
	海側計	凍結管	532 本	532 本	100.0 %	532 本	100.0 %	452 本	452 本	100.0 %	68 本	68 本	100.0 %
		測温管	131 本	131 本	100.0 %	131 本	100.0 %	110 本	110 本	100.0 %	3 本	3 本	100.0 %
		計	662 本	662 本	100.0 %	662 本	100.0 %	562 本	562 本	100.0 %	71 本	71 本	100.0 %
合計	凍結管	1568 本	1568 本	100.0 %	1568 本	100.0 %	452 本	452 本	100.0 %	138 本	138 本	100.0 %	
	測温管	359 本	359 本	100.0 %	359 本	100.0 %	110 本	110 本	100.0 %	8 本	8 本	100.0 %	
	計	1927 本	1927 本	100.0 %	1927 本	100.0 %	562 本	562 本	100.0 %	146 本	146 本	100.0 %	

陸側遮水壁の工事の進捗について（3／5）



写真① 1BLK補助工法 架台建込



写真⑦ 7BLK断熱材敷設

陸側遮水壁の工事の進捗について（4／5）



写真⑪ 11BLK地上配管設置



写真⑫ 12BLK凍結管建込

陸側遮水壁の工事の進捗について（5／5）



写真⑬-1 13BLK地上配管
架台設置



写真⑬-2 13BLK配管架台
