



【4号機原子炉建屋上部瓦礫撤去工事】

- 2月27日（月）～3月27日（火） 主な作業実績
 - ・ R/B ホールディングフロア大型機器撤去（ガーダ、FHM）（※1、2）
 - ・ 作業ヤード整備等
 - ・ 地盤改良準備工事（※3）

□先月



□今月

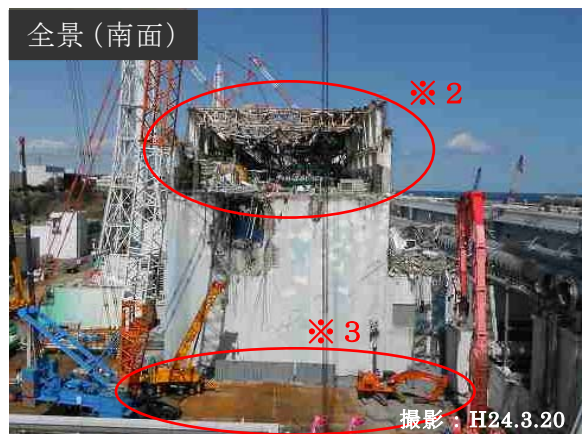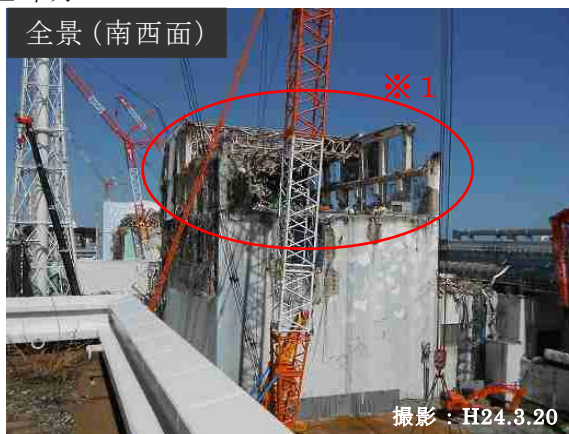

- 3月28日（水）～4月22日（日） 主な作業予定
 - ・ R/B R1～R4通り屋根鉄骨他解体
 - ・ 地盤改良準備工事
 - ・ 地盤改良本工事
 - ・ 作業ヤード整備等

■ 備考

R/B：原子炉建屋、ガーダ：トロリの走行する桁、FHM：燃料交換機

以上
