

【4号機原子炉建屋上部瓦礫撤去工事】


■ 3月28日（水）～4月22日（日） 主な作業実績

- ・ R/B外壁・柱他解体（※1、※2）
- ・ 地盤改良準備工事（※3）
- ・ 地盤改良本工事（※3）
- ・ 作業ヤード整備 等

□先月



□今月

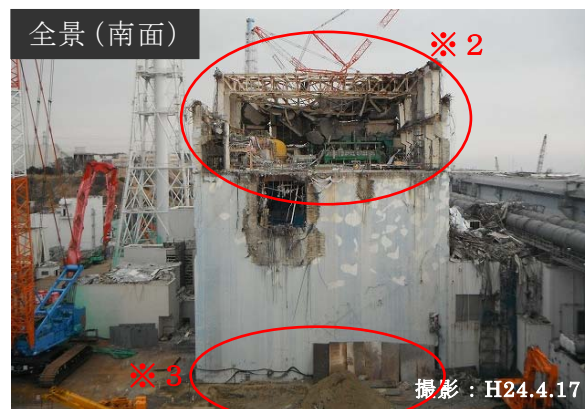

■ 4月23日（月）～5月27日（日） 主な作業予定

- ・ R/B外壁・柱他解体
- ・ 地盤改良本工事
- ・ 作業ヤード整備 等

■ 備考

R/B：原子炉建屋
