



### 【3号機原子炉建屋上部瓦礫撤去工事】

- 5月28日（月）～6月24日（日） 主な作業実績
- ・ 構台鉄骨搬入・組立（海側地組ヤード）
  - ・ 構台設置
  - ・ R w / B 上部瓦礫撤去（※1）
  - ・ R / B 上部瓦礫撤去（※2）

□先月

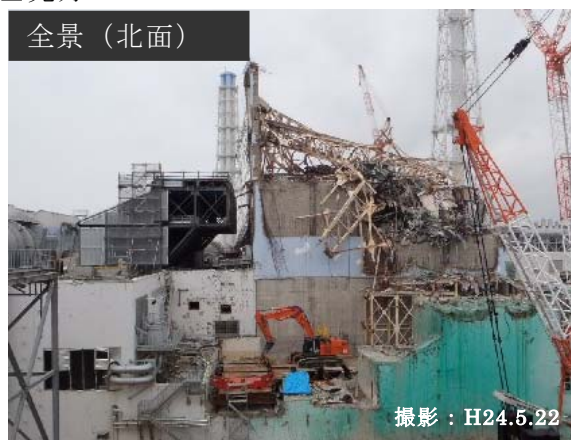

□今月

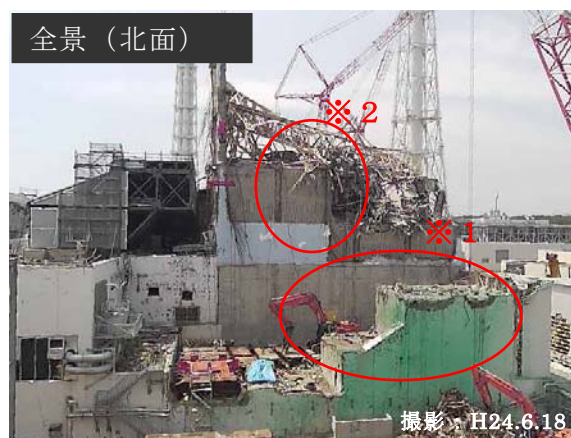

- 6月25日（月）～7月22日（日）主な作業予定
- ・ 構台鉄骨搬入・組立（海側地組ヤード）
  - ・ 構台設置
  - ・ R w / B 上部瓦礫撤去
  - ・ R / B 上部瓦礫撤去

■ 備考

R / B : 原子炉建屋

R w / B : 廃棄物処理建屋
