

4号機 燃料取り出し用カバー鉄骨建方工事の 進捗状況について

平成25年4月25日
東京電力株式会社



東京電力


4号機 燃料取り出し用カバー鉄骨建方工事の進捗状況について（中間報告）

■作業日 ：平成25年1月8日～4月10日（時点）

■作業内容：87本（全数）※ の内、64本（柱 30本、梁34本）の建方完了

※ 燃料取り出し用カバー天井クレーン架構の柱・梁部材の全数

鉄骨建方完了範囲

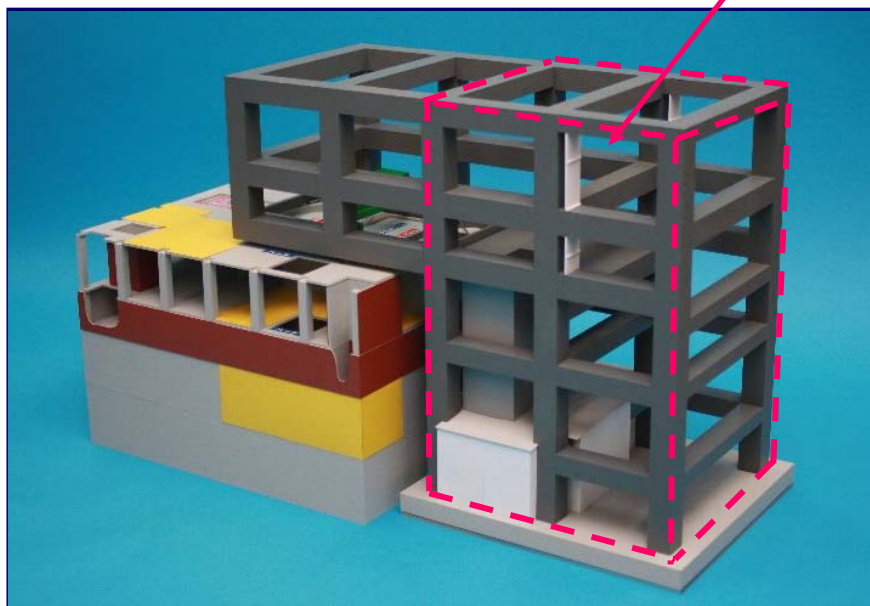

燃料取り出し用カバー完成イメージ



鉄骨建方進捗状況：平成25年4月10日（時点）

画像提供：東京電力株式会社
撮影日：平成25年4月10日
