


労働環境改善スケジュール

分野名	活り	作業内容	これまで1ヶ月の動きと今後1ヶ月の予定		5月			6月			7月			8月			9月			備考		
			26	2	9	16	23	30	7	14	下	上	中	下	前	後						
被ばく・安全管理	防護装備の適正化 検討	<p>(実績)</p> <ul style="list-style-type: none"> 入退域管理施設の運用開始に伴う一般作業服着用可能エリア拡大の検討(入退域管理施設周辺、登録センター休憩所、運転手用汚染測定小屋周辺) <p>(予定)</p> <ul style="list-style-type: none"> 入退域管理施設の運用開始に伴う一般作業服着用可能エリア拡大の実施(入退域管理施設周辺、登録センター休憩所、運転手用汚染測定小屋周辺)(6/30) <p>※ダストフィルタ化：空气中よう素131濃度が全面マスク着用基準を下回ることを確認した上で、ダストフィルタを装着した全面マスクで作業できるエリアを設定し、作業員の負担軽減、作業性向上を図る。</p> <p>※全面マスク着用省略化：空气中放射性物質濃度が全面マスク着用基準を下回ることを確認した上で、全面マスクを着用省略できるエリアを設定し、作業員の負担軽減、作業性向上を図る。</p> <p>※一般作業服化：シート養生を行い、定期的な汚染確認を行う車両に乗車する場合は、一般作業服で移動できるエリアを設定し、作業員の負担軽減を図る。</p>	検討・設計	一般作業服着用可能エリアの拡大の検討			▽運用開始			現地調査、運用検討			全面マスク着用省略化の対象エリア選定・検討									
			現場作業	ダストフィルタ化			(実施済みエリア)H24.3.1:1~4号機及びその周辺建屋内を除く全域、H24.12.19:1~4号機及びその周辺建屋内			全面マスク着用省略化			(実施済みエリア)H23.11.8:正門・免震重要棟前・5.6号サービス建屋前、H24.6.1:企業センター厚生棟前、H24.8.9:車両汚染検査場・降車しない見学者、H24.11.19:入退域管理施設建設地、H25.1.28:構内企業棟の一部エリア(東電環境自力棟周辺)、H25.4.8:多核種除去設備、キャスク仮保管設備、H25.4.15:構内企業棟の一部エリア(旧登録センター周辺)、H25.5.30:1~4号機周辺・タンクエリア・瓦礫保管エリアを除くエリア			一般作業服			(実施済みエリア)H24.3.1:正門・免震重要棟前・5.6号サービス建屋前、H24.8.9:降車しない見学者			
			現場作業	情報共有、安全施策の検討・評価			酷暑期に向けた熱中症予防対策の実施															
労働環境改善	重傷災害撲滅、全災害発生件数低減対策の実施	<p>(実績)</p> <ul style="list-style-type: none"> 協力企業との情報共有 6/20安全推進連絡会開催：災害事例等の再発防止対策の周知等 作業毎の安全施策の実施(TBM-KY等) 熱中症予防対策実施：5月開始 <p>(予定)</p> <ul style="list-style-type: none"> 6/27安全推進連絡会の開催 作業毎の安全施策の実施(継続実施) 熱中症予防対策実施：WBG T値の活用、クールベストの着用促進、炎天下作業の制限：7~8月、等 	検討・設計	H24年度までの線量に基づく対象者(協力企業作業員)の抽出																		
			現場作業	健康相談受付			紹介状・費用請求用紙の発送															
			現場作業	各医療拠点の体制検討			常勤医師の雇用に向けた関係者との調整															
健康管理	長期健康管理の実施	<p>(実績)</p> <ul style="list-style-type: none"> 対象者(社員・協力会社作業員)に追加健診実施の案内および具体的運用の周知 各がん検査の受診希望に基づく、当社発行の紹介状・検査依頼票と、費用請求用紙の発送 甲状腺超音波検査対象者への案内 H24年度の取り組みによる検査費用の精算手続の継続 <p>(予定)</p> <ul style="list-style-type: none"> 各がん検査対象者からの費用請求に基づく、検査費用の支払い手続 H24年度までの線量に基づく対象者(協力企業作業員)の抽出 	検討・設計	H24年度までの線量に基づく対象者(協力企業作業員)の抽出																		
			現場作業	健康相談受付			紹介状・費用請求用紙の発送															
			現場作業	各医療拠点の体制検討			常勤医師の雇用に向けた関係者との調整															
健康管理	継続的な医療職の確保と患者搬送の迅速化	<p>(実績)</p> <ul style="list-style-type: none"> 男性看護師(4名)を採用し、1F救急医療室へ配置 1F救急医療室の9月末までの医師確保完了 固定医師1名を雇用し、4/2より勤務開始(週3日) 3月26日より1F救急医療室への救急救命士の配備を順次開始 <p>(予定)</p> <ul style="list-style-type: none"> 6月30日運用開始の入退域管理施設内に救急医療室を開設(5/6号救急医療室の移転) 6月30日JV診療所の廃止(榎葉町への返還)(診療は6月26日8時に終了) 1F救急医療室の恒常的な医師の確保に向けた調整 	検討・設計	各医療拠点の体制検討			常勤医師の雇用に向けた関係者との調整															
			現場作業	嘱託社員男性看護師を配置			▽1F入退域管理施設内の救急医療室開設															
			現場作業	嘱託社員男性看護師を配置			▽1F入退域管理施設内の救急医療室開設															



<全面マスク着用省略可能エリア>

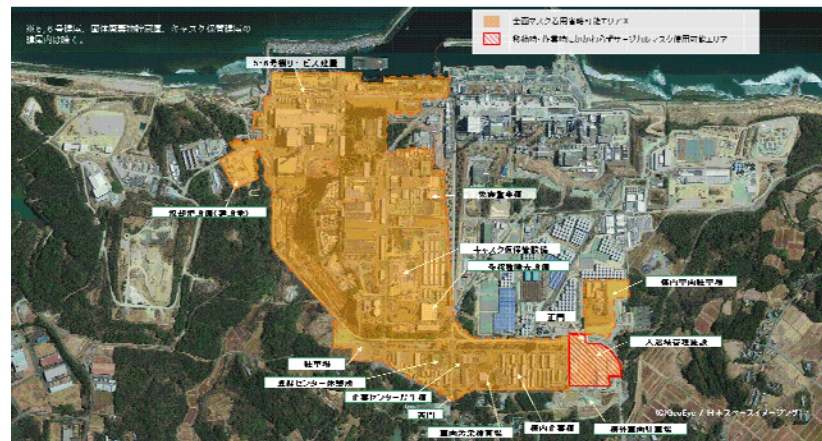


<一般作業服着用可能エリア>

6/30よりエリア拡大予定

労働環境改善スケジュール

分野名	活り	作業内容	これまで1ヶ月の動きと今後1ヶ月の予定			5月			6月			7月			8月			9月			備考
			26	2	9	16	23	30	7	14	下	上	中	下	前	後					
			検討・設計			現場作業			検討・設計			現場作業			検討・設計			現場作業			
要員管理、労働環境改善		作業員の確保状況と地元雇用率の実態把握	<ul style="list-style-type: none"> (実績) <ul style="list-style-type: none"> 作業員の確保状況と地元雇用率の実態把握(継続的に実施) 作業員の確保状況(7月の予定)と地元雇用率(5月実績)について調査・集計 (予定) <ul style="list-style-type: none"> 作業員の確保状況(8月の予定)と地元雇用率(6月実績)について調査・集計 			▽作業員の確保状況調査依頼			作業員の確保状況集約			▽作業員の確保状況調査依頼			作業員の確保状況集約						
		労働環境・生活環境・就労実態に関する企業との取り組み	<ul style="list-style-type: none"> (実績) <ul style="list-style-type: none"> 労働環境・生活環境・就労実態に関する意見交換及び実態把握 意見交換及び実態把握に基づく解決策の検討・実施・結果のフィードバック 相談窓口への連絡(処遇・労働条件等)への対応 (予定) <ul style="list-style-type: none"> 労働環境・生活環境・就労実態に関する意見交換及び実態把握(継続的に実施) 意見交換及び実態把握に基づく解決策の検討・実施・結果のフィードバック(継続的に実施) 作業員へのアンケートによる実態把握(定期的実施) 相談窓口への連絡(処遇・労働条件等)への対応(継続的に実施) 			労働環境・生活環境に関する実態把握・解決策検討・実施 ▽協力企業との意見交換会(労働環境)5/31 ▽結果取りまとめ 作業員へのアンケート(第3回)			労働環境・生活環境に関する実態把握・解決策検討・実施 ▽協力企業との意見交換会(労働環境)6/28			労働環境・生活環境に関する実態把握・解決策検討・実施 実施時期調整中 実施時期調整中			労働環境・生活環境に関する実態把握・解決策検討・実施 協力企業との意見交換会(労働環境) 作業員へのアンケート(第4回) 元請企業との意見交換会(資材) ▽8/5, 6, 8						
		警戒区域解除に伴う新たな出入り拠点の整備について	<ul style="list-style-type: none"> (実績) <ul style="list-style-type: none"> 入退域管理施設の建設工事中 (予定) <ul style="list-style-type: none"> 入退域管理施設の運用開始(平成25年6月30日予定)後、Jヴィレッジの入退域管理機能を1Fに移転 			入退域管理施設の建設工事 1F車両用スクリーニング・除染場の本格運用			入退域管理施設の建設工事 入退域管理施設の本格運用												
		線量低減・非管理区域化工リアの拡大について	<ul style="list-style-type: none"> (実績) <ul style="list-style-type: none"> 非管理区域休憩所の設置検討 (予定) <ul style="list-style-type: none"> 非管理区域休憩所設置の設計(基本設計:7月末予定, 詳細設計:9月末予定, 着工:10月予定) 									非管理区域休憩所の設計									

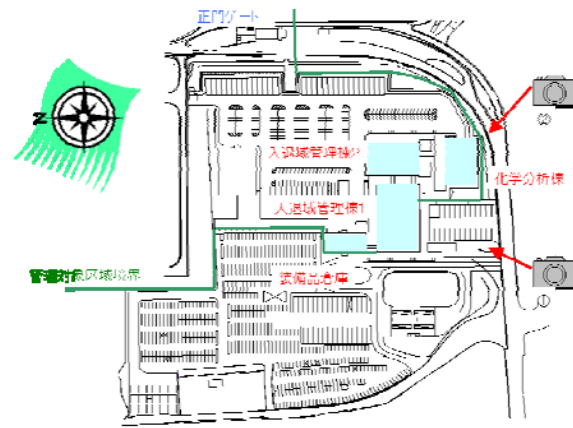

<入退域管理施設配置図>



<①入退域管理棟外観>



<入退域管理棟内部>



<②化学分析棟外観>



<化学分析棟内部>
