


【3号機原子炉建屋上部除染・遮へい工事】

■ 9月26日（木）～10月30日（水）主な作業予定

- ・作業ヤード整備
- ・R／B上部瓦礫撤去
- ・R／B上部除染・遮へい準備工事
- ・R／B上部除染(がれき集積)

□ 作業進捗イメージ図

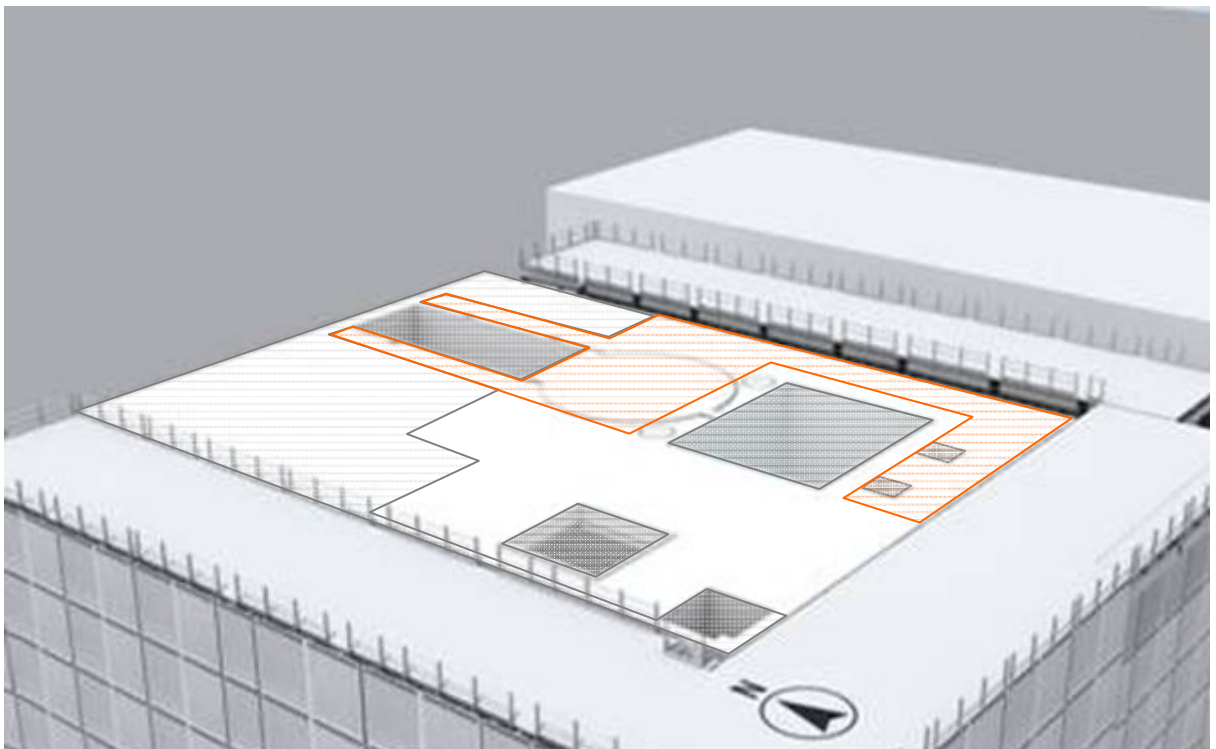

【凡例】

- 除染対象外 がれき集積 がれき吸引 床表層切削 遮へい材設置
SFP内瓦礫撤去

※除染・遮へい対策手順：がれき集積→がれき吸引→床表層切削→遮へい材設置

■ 10月31日（木）～11月21日（水）主な作業予定

- ・R／B上部除染・遮へい準備工事
- ・R／B上部除染(がれき集積)
- ・SFP内瓦礫撤去

■ 備考

- ・R／B：原子炉建屋
- ・SFP：使用済燃料貯蔵プール
