
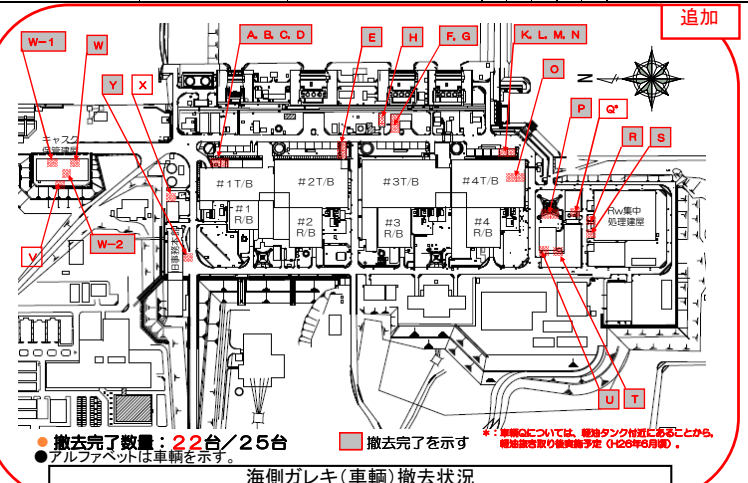


労働環境改善スケジュール

分野	括り	作業内容	これまで一ヶ月の動きと今後一ヶ月の予定		1月		2月		3月		4月		5月		備考	
			26	2	9	16	23	2	9	16	下	上	中	下		
被ばく・安全管理	1	防護装備の適正化検討  ※ダストフィルタ化：空気中よ素131濃度が全面マスク着用基準を下回ることを確認した上で、ダストフィルタを装着した全面マスクで作業できるエリアを設定し、作業員の負担軽減、作業性向上を図る。 ※全面マスク着用省略化：空気中放射性物質濃度が全面マスク着用基準を下回ることを確認した上で、全面マスクを着用省略できるエリアを設定し、作業員の負担軽減、作業性向上を図る。 ※一般作業服化：シート養生を行い、定期的な汚染確認を行う車両に乗車する場合は、一般作業服で移動できるエリアを設定し、作業員の負担軽減を図る。	検討・設計	共用プール建屋内の全面マスク着用省略化の検討		共用プール建屋内の全面マスク着用省略化の検討		共用プール建屋内の全面マスク着用省略化の検討		共用プール建屋内の全面マスク着用省略化の検討		共用プール建屋内の全面マスク着用省略化の検討				
			現場作業	「敷地内線量低減にかかる実施方針」を踏まえたタンク群を含む敷地南側エリアの全面マスク着用省略化の検討		「敷地内線量低減にかかる実施方針」を踏まえたタンク群を含む敷地南側エリアの全面マスク着用省略化の検討		「敷地内線量低減にかかる実施方針」を踏まえたタンク群を含む敷地南側エリアの全面マスク着用省略化の検討		「敷地内線量低減にかかる実施方針」を踏まえたタンク群を含む敷地南側エリアの全面マスク着用省略化の検討		「敷地内線量低減にかかる実施方針」を踏まえたタンク群を含む敷地南側エリアの全面マスク着用省略化の検討		「敷地内線量低減にかかる実施方針」を踏まえたタンク群を含む敷地南側エリアの全面マスク着用省略化の検討		
			現場作業	「敷地内線量低減にかかる実施方針」を踏まえたタンク群を含む敷地南側エリアの全面マスク着用省略化の検討（平成25～27年度）		「敷地内線量低減にかかる実施方針」を踏まえたタンク群を含む敷地南側エリアの全面マスク着用省略化の検討（平成25～27年度）		「敷地内線量低減にかかる実施方針」を踏まえたタンク群を含む敷地南側エリアの全面マスク着用省略化の検討（平成25～27年度）		「敷地内線量低減にかかる実施方針」を踏まえたタンク群を含む敷地南側エリアの全面マスク着用省略化の検討（平成25～27年度）		「敷地内線量低減にかかる実施方針」を踏まえたタンク群を含む敷地南側エリアの全面マスク着用省略化の検討（平成25～27年度）		「敷地内線量低減にかかる実施方針」を踏まえたタンク群を含む敷地南側エリアの全面マスク着用省略化の検討（平成25～27年度）		
	2	海側のガレキ撤去  【車輛Q】 軽油タンク付近にあることから、タンクの軽油抜き取り後撤去予定（H26年6月頃）	検討・設計	車輦K,L,M,N(2/9:車輦は撤去済み。現在周辺ガレキの撤去中)		車輦Q		車輦V		車輦X		車輦Y		車輦Z		
			現場作業	車輦Q		車輦V		車輦X		車輦Y		車輦Z		車輦AA		
3	重傷災害撲滅、全災害発生件数低減対策の実施  :9月末まで	検討・設計	熱中症予防対策 次年度計画の検討		熱中症予防対策 次年度計画の検討		熱中症予防対策 次年度計画の検討		熱中症予防対策 次年度計画の検討		熱中症予防対策 次年度計画の検討		熱中症予防対策 次年度計画の検討			
		現場作業	情報共有、安全施策の検討・評価		情報共有、安全施策の検討・評価		情報共有、安全施策の検討・評価		情報共有、安全施策の検討・評価		情報共有、安全施策の検討・評価		情報共有、安全施策の検討・評価			
4	長期健康管理の実施  【予防接種実績】 5902人 (H24:5467人)	検討・設計	健康相談受付		健康相談受付		健康相談受付		健康相談受付		健康相談受付		健康相談受付			
		現場作業	H25年度対象者「がん検査」(社員・協力企業作業員)、「白内障検査」(社員)、「甲状腺超音波検査」(社員・協力企業作業員)への案内、紹介状・検査依頼状・費用申請書の送付、検査費用の精算手続き		H25年度対象者「がん検査」(社員・協力企業作業員)、「白内障検査」(社員)、「甲状腺超音波検査」(社員・協力企業作業員)への案内、紹介状・検査依頼状・費用申請書の送付、検査費用の精算手続き		H25年度対象者「がん検査」(社員・協力企業作業員)、「白内障検査」(社員)、「甲状腺超音波検査」(社員・協力企業作業員)への案内、紹介状・検査依頼状・費用申請書の送付、検査費用の精算手続き		H25年度対象者「がん検査」(社員・協力企業作業員)、「白内障検査」(社員)、「甲状腺超音波検査」(社員・協力企業作業員)への案内、紹介状・検査依頼状・費用申請書の送付、検査費用の精算手続き		H25年度対象者「がん検査」(社員・協力企業作業員)、「白内障検査」(社員)、「甲状腺超音波検査」(社員・協力企業作業員)への案内、紹介状・検査依頼状・費用申請書の送付、検査費用の精算手続き		H25年度対象者「がん検査」(社員・協力企業作業員)、「白内障検査」(社員)、「甲状腺超音波検査」(社員・協力企業作業員)への案内、紹介状・検査依頼状・費用申請書の送付、検査費用の精算手続き			
5	継続的な医療職の確保と患者搬送の迅速化	検討・設計	各医療拠点の体制検討		各医療拠点の体制検討		各医療拠点の体制検討		各医療拠点の体制検討		各医療拠点の体制検討		各医療拠点の体制検討			
		現場作業	常勤医師の雇用にに向けた関係者との調整		常勤医師の雇用にに向けた関係者との調整		常勤医師の雇用にに向けた関係者との調整		常勤医師の雇用にに向けた関係者との調整		常勤医師の雇用にに向けた関係者との調整		常勤医師の雇用にに向けた関係者との調整			

追加

追加

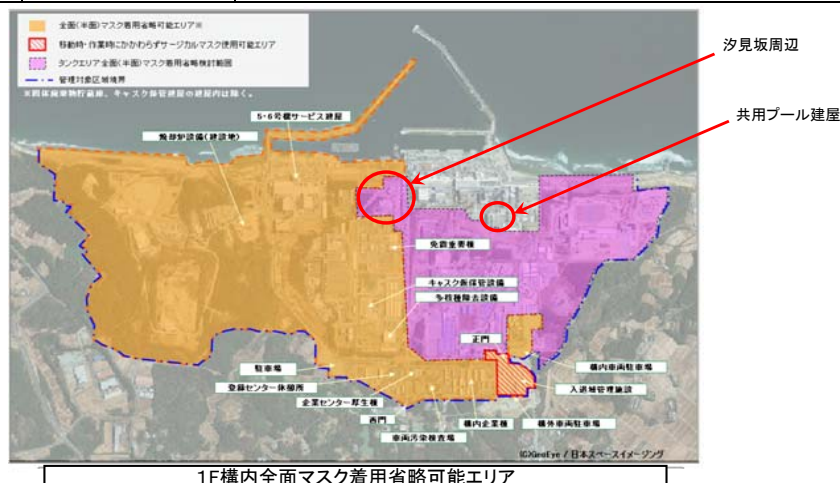

労働環境改善スケジュール

分野名	括り	作業内容	これまで一ヶ月の動きと今後一ヶ月の予定	1月		2月					3月				4月			5月	備考	
				26	2	9	16	23	2	9	16	下	上	中	下	前	後			
要員管理、労働環境改善	6	作業員の確保状況と地元雇用率の実態把握	(実績) ・作業員の確保状況と地元雇用率の実態把握(継続的に実施) ・作業員の確保状況(1月実績/3月の予定)と地元雇用率(1月実績)についての調査・集計	現場作業					作業員の確保状況集約											
			(予定) ・作業員の確保状況(2月実績/4月の予定)と地元雇用率(2月実績)についての調査・集計	現場作業						作業員の確保状況と地元雇用率の実態把握										
	7	労働環境・生活環境・就労実態に関する企業との取り組み	(実績) ・労働環境・生活環境・就労実態に関する意見交換及び実態把握 ・意見交換及び実態把握に基づく解決策の検討・実施・結果のフィードバック ・相談窓口への連絡(処遇・労働条件等)への対応	検討・設計																
			(予定) ・労働環境・生活環境・就労実態に関する意見交換及び実態把握(継続的に実施) ・意見交換及び実態把握に基づく解決策の検討・実施・結果のフィードバック(継続的に実施) ・作業員へのアンケートによる実態把握(定期的に実施) ・相談窓口への連絡(処遇・労働条件等)への対応(継続的に実施)	現場作業			▼協力企業との意見交換会(労働環境)2/7					▼協力企業との意見交換会(労働環境)3/7								
	8	休憩所の設置・拡大	(実績) ・アスファルト撤去(継続)	検討・設計																
			(予定) ・アスファルト撤去(継続)	現場作業				▽1/27 大型休憩所の着工												
9	新事務棟の建設	①暫定事務棟 (実績) ・地盤改良工事(継続) ・基礎工事(継続)	検討・設計																	
		(予定) ・地盤改良工事(継続) ・基礎工事(継続)	現場作業																	
10	給食センターの設置	(実績) ・開発協議、農地転用申請(大熊町) ・相双保健所との協議	検討・設計																	
		(予定) ・官庁申請に係る協議(開発許可、農地転用等) ・町、地権者との調整(申請、境界立ち会いなど)	現場作業																	
11	車輛整備工場の建設	(実績) ・基礎工事継続中 ・躯体工事(鉄筋)着手	検討・設計																	
		(予定) ・外壁、屋根工事 ・付帯設備工事(電気、消防、換気設備)	現場作業																	

H26年12月末  
完成目標

I期：H26年6月末  
完了目標  
II期：H26年9月末  
完了目標

H27年度末  
完了目標

H26年度末  
完了目標

H26.3.20竣工予定  
H26.4～試運用予定

