


### 【3号機原子炉建屋上部除染・遮へい工事】

- 1月30日（木）～2月26日（水）主な作業実績
  - ・ R/B上部除染（ガレキ集積、ガレキ吸引、床表層切削）
  - ・ SFP内瓦礫撤去
  - ・ 作業ヤード整備
  - ・ 建屋躯体状況調査

□作業進捗イメージ図

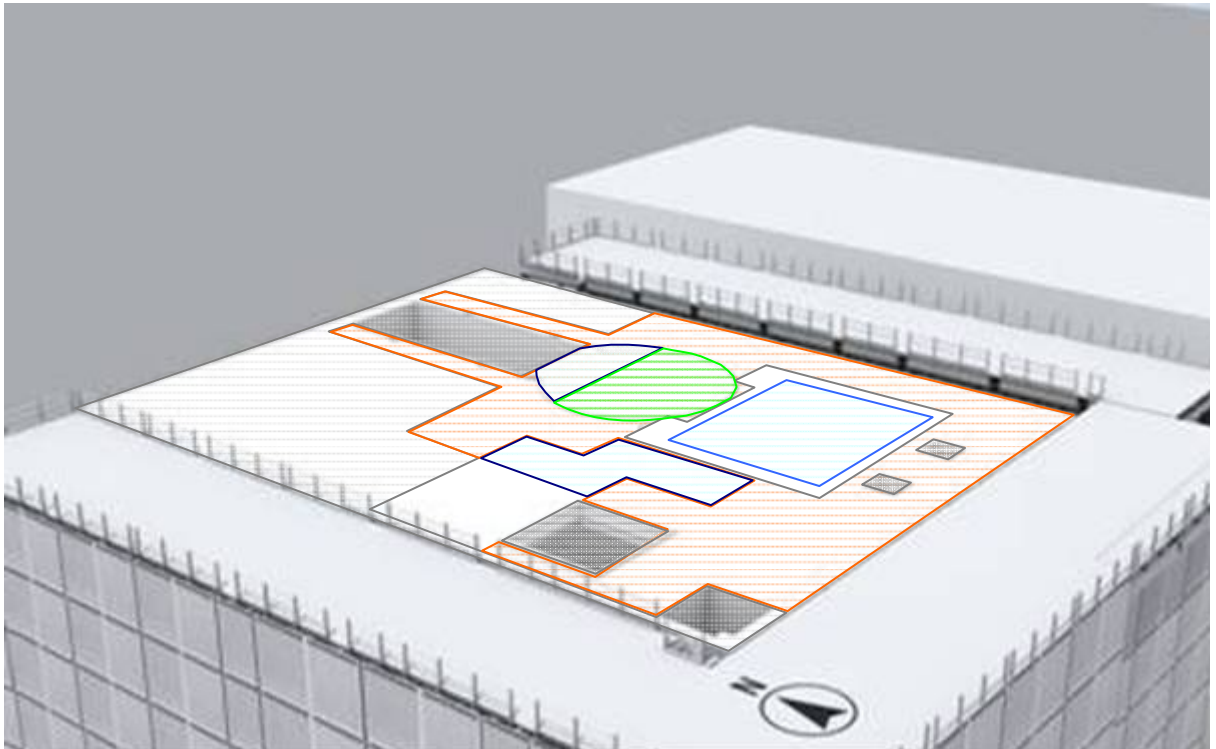

#### 【凡例】

- 除染対象外    ガレキ集積    ガレキ吸引    床表層切削    遮へい材設置  
SFP内ガレキ撤去

※除染・遮へい対策手順：ガレキ集積→ガレキ吸引→床表層切削→遮へい材設置

- 2月27日（木）～3月26日（水）主な作業予定
  - ・ R/B上部除染（ガレキ集積、ガレキ吸引、床表層切削）
  - ・ SFP内瓦礫撤去
  - ・ 作業ヤード整備

#### ■備考

- ・ R/B：原子炉建屋
- ・ SFP：使用済燃料貯蔵プール
- ・ 自走式除染装置（吸引装置）は、修理が完了し再稼動開始（2月24日）
