


港湾内付替排水路工事進捗状況

平成26年7月31日
東京電力株式会社



1. 港湾内付替排水路計画

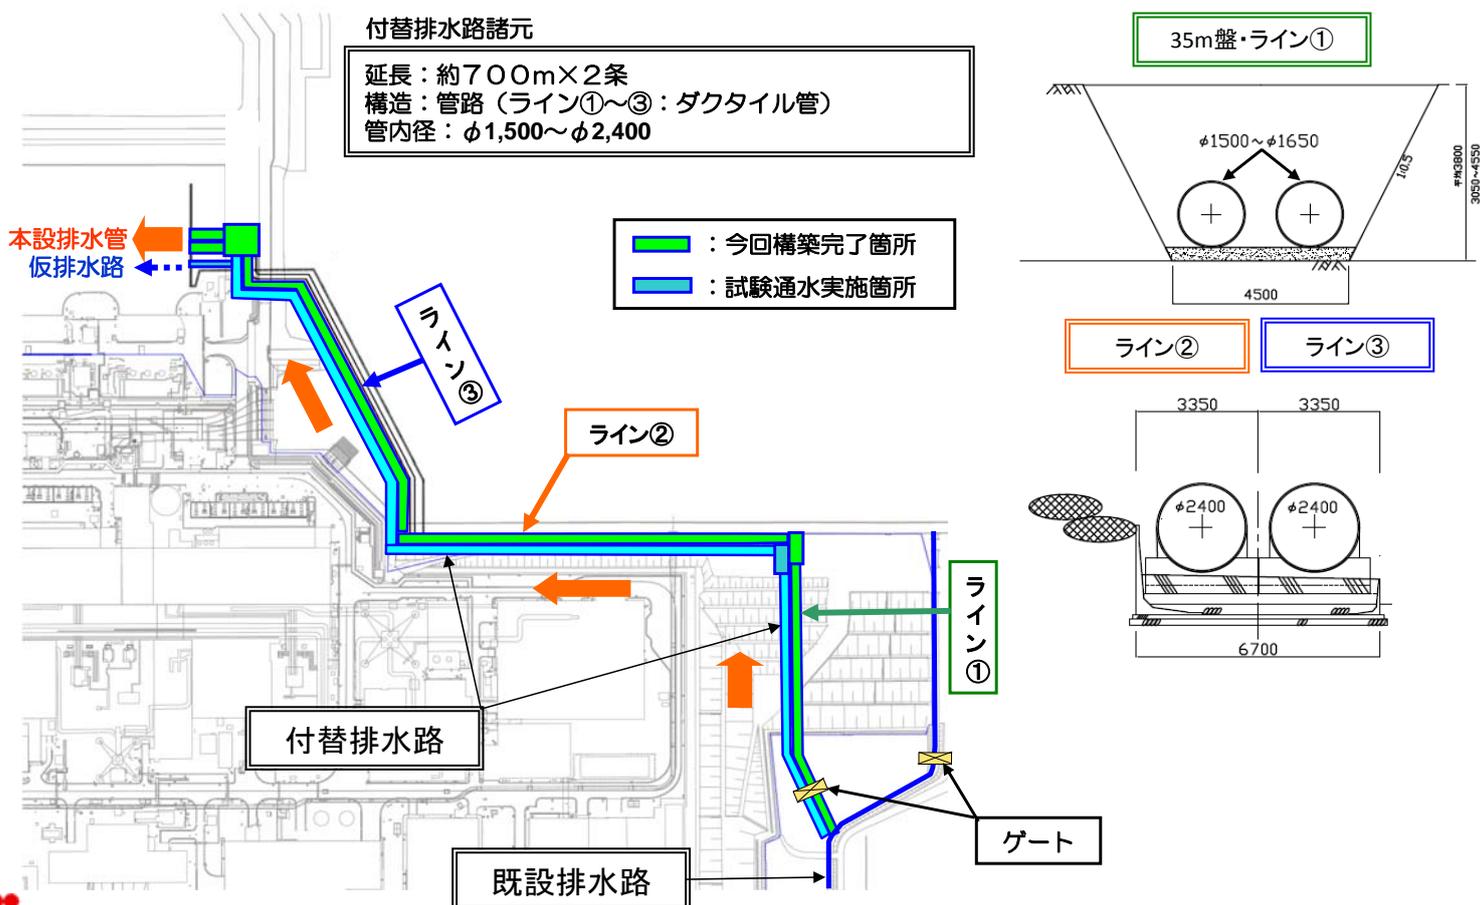

2. 港湾内付替排水路工事進捗状況

【全体進捗状況（排水路設置）】

進捗率①（仮設1条目）：100.0%（6月13日完了）

（本設1条目）：100.0%（7月29日完了）

進捗率②（本設2条目）：100.0%（7月29日完了）

①設置済延長 668m/全延長668m（1条目）

②設置済延長 669m/全延長669m（2条目） 計1,337m

○地盤改良の進捗状況

進捗率：100%（4月1日完了）

施工延長224m/施工延長224m

		H25			H26				
		12	1	2	3	4	5	6	7
主要工程							仮設1条目	通水機能確保	
							本設1・2条目	通水機能確保	
準備工・片付け		アクセス路関連支障物移設、既設防護柵撤去等				支障物復旧、既設防護柵復旧等			
ライン① (35m盤) (斜面部)	排水管	1条目	干渉物移設/防護・埋設物確認・掘削地盤改良			排水管			
		2条目							
ライン② (4m盤)	排水管	1条目	干渉物移設/防護・埋設物確認 地盤改良			基礎 排水管			
		2条目				基礎 排水管			
ライン③ (港湾部)	排水管 (埋立エリア)	1条目				基礎 排水管			
	排水管 (流末部)	2条目							
		1・2条							
仮設排水路 (開水路)					仮設排水路				
海側アクセス構台					構台				

排水路の切り替えについて

①1条目の通水機能確保が完了したため、排水先を外洋から港湾内への通水試験を実施中。

②切り替えにあたっては、排水路の通水試験（設備状況確認）を兼ねて実施するものとし、段階的に水門にて流量を徐々に増加させていく予定。



東京電力

無断複写・転載禁止 東京電力株式会社

3


3. 現場状況写真



排水管設置状況（ライン③）



排水管設置状況（ライン②）

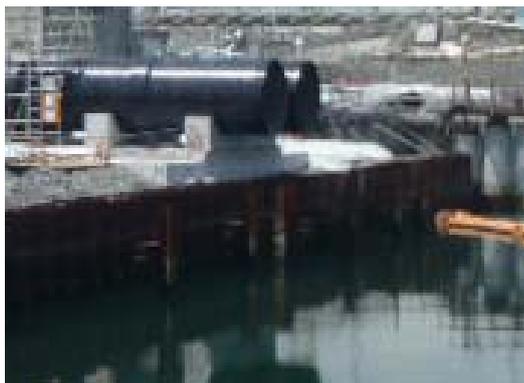

排水管設置状況（ライン③出口）



既設C排水路接続部構築状況（ライン①上部）



東京電力

無断複写・転載禁止 東京電力株式会社

4

4. 通水状況



水門前開渠状況



仮設水路放流状況

