
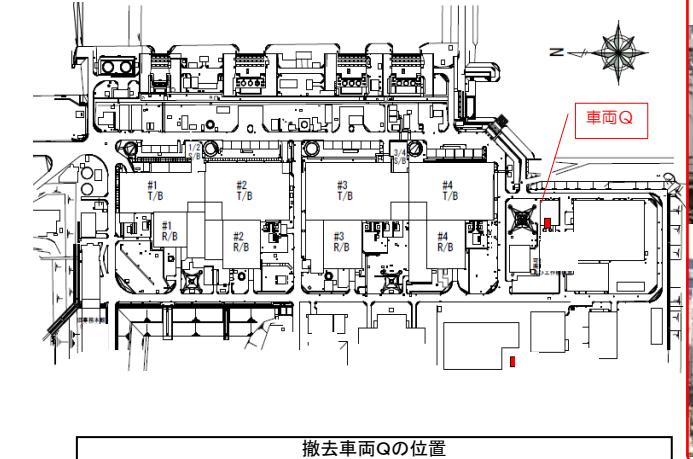


分野名	活 り	作業内容	これまで1ヶ月の動きと今後1ヶ月の予定	8月		9月			10月			11月		12月		備 考	
				24	31	7	14	21	28	5	12	下	上	中	下		
労働環境改善	1 防護装備の適正化検討	(実績) ・「敷地内線量低減にかかる実施方針」を踏まえた敷地南側エリアの全面マスク着用省略化の検討 ・全面マスク着用省略エリア拡大に向けた連続ダストモニタの設置検討(予定) ・「敷地内線量低減にかかる実施方針」を踏まえた敷地南側エリアの全面マスク着用省略化の検討(平成25~27年度) ・全面マスク着用省略エリア拡大に向けた連続ダストモニタの設置検討(平成26年度末設置予定)	※ダストフィルタ化：空気中よう素131濃度が全面マスク着用基準を下回ることを確認した上で、ダストフィルタを装着した全面マスクで作業できるエリアを設定し、作業員の負荷軽減、作業性向上を図る。 ※全面マスク着用省略化：空気中放射性物質濃度が全面マスク着用基準を下回ることを確認した上で、全面マスクを着用省略できるエリアを設定し、作業員の負荷軽減、作業性向上を図る。 ※一般作業服化：シート養生を行い、定期的な汚染確認を行う車両に乗車する場合は、一般作業服で移動できるエリアを設定し、作業員の負荷軽減を図る。	検討・設計			「敷地内線量低減にかかる実施方針」を踏まえたタンク群を含む敷地南側エリアの全面マスク着用省略化の検討										
		※ダストフィルタ化：空気中よう素131濃度が全面マスク着用基準を下回ることを確認した上で、ダストフィルタを装着した全面マスクで作業できるエリアを設定し、作業員の負荷軽減、作業性向上を図る。 ※全面マスク着用省略化：空気中放射性物質濃度が全面マスク着用基準を下回ることを確認した上で、全面マスクを着用省略できるエリアを設定し、作業員の負荷軽減、作業性向上を図る。 ※一般作業服化：シート養生を行い、定期的な汚染確認を行う車両に乗車する場合は、一般作業服で移動できるエリアを設定し、作業員の負荷軽減を図る。	現場作業	ダストフィルタ化 (実施済みエリア)H24.3.1:1~4号機及びその周辺建屋内を除く全域、H24.12.19:1~4号機及びその周辺建屋内	全面マスク着用省略化 (実施済みエリア)H23.1.8:正門・免震重要棟前・5,6号サービス建屋前、H24.6.1:企業センター厚生棟前、H24.8.9:車両汚染検査場・降車しない見学者、H24.11.19:入退域管理施設建設地、H25.1.28:構内企業棟の一部エリア(東電環境企業棟周辺)、H25.4.8:多核種除去設備、キヤスク仮保管設備、H25.4.15:構内企業棟の一部エリア(登録センター周辺)、H25.5.30:1~4号機周辺・タンクエリア、瓦礫保管エリアを除くエリア、H25.10.7:5, 6号機建屋内、H25.11.1:がれき保管エリア、H26.3.10:共用ブルーブル建屋内の一部エリア、H26.5.30:Jタンクエリア	一般作業服化 (実施済みエリア)H24.3.1:正門・免震重要棟前・5,6号サービス建屋前、H24.8.9:降車しない見学者、H25.6.30:入退域管理施設周辺、企業センター厚生棟周辺、運転手用汚染測定小屋周辺、H25.8.5:研修棟休憩所周辺、H26.3.17:構内駐車場及び構内企業棟一部エリア(関電工企業棟周辺)										【汐見坂】 1号力バ一解体工事開始後、連続ダストモニタで原子炉建屋上部の飛散防止剤の抑制効果を確認次第、全面マスク着用省略エリアを設定する。	
	2 車両Q撤去	(実績) ・仮設工事 ・配管内油抜き準備 ・油抜き取り ・車両撤去準備 ・車両撤去 ・車両撤去完了(9/19)	検討・設計													【車両Q】 破損車両が干渉する配管内の重油・軽油を抜き取り後、車両撤去を実施する。(9月12日油抜去完了) 9月19日撤去完了。	
	3 重傷災害撲滅、全災害発生件数低減対策の実施	(実績) ・協力企業との情報共有 ・9/18安全推進協議会開催：災害事例等の再発防止対策の周知等 ・作業毎の安全施策の実施(TBM-KY等) ・熱中症予防対策：WBGT値の活用、クールベストの着用促進等 ・熱中症対策の強化策として統一ルールの追加(H26.8月運用開始)(予定) ・9/25安全推進協議会の開催 ・作業毎の安全施策の実施(継続実施) ・熱中症予防対策実施：WBGT値の活用、クールベストの着用促進、7月、8月の14時から17時迄の屋外作業の原則禁止(9月まで延長)等	現場作業			【熱中症予防対策の実施】											
	4 長期健康管理の実施	(実績) ・H26年度対象者(協力企業作業員)への「がん検査」「甲状腺超音波検査」案内に対する、対象者・医療機関等からの問い合わせ対応、及び検査費用の精算手続き(継続) (予定) ・H26年度対象者(社員)への「白内障検査」案内準備(KK・本店：11月以降予定) ※H26年度対象者(社員)への「甲状腺超音波検査」については別途案内予定 ・インフルエンザ予防接種(10/29～来年1/30 1F新事務棟、近隣医療機関)	現場作業	健康相談受付			対象者・医療機関等からの問い合わせ対応、及び検査費用の精算手続き										【インフルエンザ予防接種(10/29～来年1/30)】 追加
健康管理	5 継続的な医療職の確保と患者搬送の迅速化	(実績) ・1F救急医療室のH27年1月中旬までの医師確保完了(固定医師1名+0-7-7支援医師) (予定) ・1F救急医療室の恒常的な医師の確保に向けた調整	現場作業			各医療拠点の体制検討										【撤去車両Qの位置】 追加	

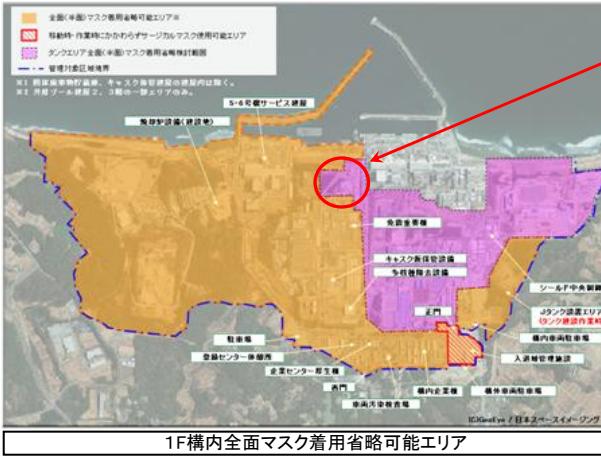

労働環境改善スケジュール

分野名	括り	作業内容	これまで1ヶ月の動きと今後1ヶ月の予定	8月		9月					10月				11月		12月		備考
				24	31	7	14	21	28	5	12	下	上	中	下	前	後		
労働環境改善 要員管理、労務環境改善	6 作業員の確保状況と地元雇用率の実態把握	汐見坂周辺	(実績) ・作業員の確保状況と地元雇用率の実態把握（継続的に実施） ・作業員の確保状況（6月実績／8月の予定）と地元雇用率（6月実績）についての調査・集計 (予定) ・作業員の確保状況（7月実績／9月の予定）と地元雇用率（7月実績）についての調査・集計	検討・設計	作業員の確保状況集約 ▼作業員の確保状況調査依頼					作業員の確保状況集約 ▼作業員の確保状況調査依頼					作業員の確保状況集約 ▼			→	
			現場作業						作業員の確保状況と地元雇用率の実態把握										
	7 労働環境・生活環境・就労実態に関する企業との取り組み		(実績) ・労働環境・生活環境・就労実態に関する意見交換及び実態把握 ・意見交換及び実態把握に基づく解決策の検討・実施・結果のフィードバック ・相談窓口への連絡（待遇・労働条件等）への対応 (予定) ・労働環境・生活環境・就労実態に関する意見交換及び実態把握（継続的に実施） ・意見交換及び実態把握に基づく解決策の検討・実施・結果のフィードバック（継続的に実施） ・作業員へのアンケートによる実態把握（定期的に実施） ・相談窓口への連絡（待遇・労働条件等）への対応（継続的に実施）	検討・設計	労働環境・生活環境に関する実態把握・解決策検討・実施													→	
			現場作業	▼協力企業との意見交換会(労働環境)8/29 配布(8/27～)			回収(9月中～下旬) ▼		▼協力企業との意見交換会(労働環境)9/26								協力企業との意見交換会(労働環境) 公表(11月下旬)		
	8 大型休憩所の設置		(実績) ・鉄骨工事・床スラブ工事・外壁工事他 (予定) ・鉄骨工事・床スラブ工事・外壁工事他	検討・設計						作業員へのアンケート(第5回)									入退域管理施設の構外仮設休憩所を4/7より運用開始
			現場作業															H26年度末完了目標	
	9 事務棟の建設		①新事務棟 (実績) ・内装工事・設備工事・外構工事他 (予定) ・内装工事・設備工事・外構工事他 ・引越準備等	検討・設計	官庁手続き、設計													追加	I期：6/30完了 II期：9月末完了目標
			現場作業				内装工事・設備工事・外構工事他										▼ II期分引越し(10/14～業務開始) 引越準備等		
	10 福島給食センターの設置		②新事務本館 (実績) ・諸条件の検討 ・設計 ・地質調査（ボーリング等） (予定) ・設計 ・地質調査（ボーリング等）	検討・設計	諸条件把握、基本計画検討					設計									H27年度末完了目標
			現場作業						地質調査（ボーリング等）										
			(実績) ・基礎工事 ・「福島復興給食センター株式会社」設立9/10 (予定) ・基礎工事 ・外装工事他	検討・設計						▼「福島復興給食センター株式会社」設立9/10 基礎工事他								追加	H26年度末完了目標
			現場作業														外装工事他 →		
