

# 新事務本館の進捗について

平成27年1月29日  
東京電力株式会社  
労働環境改善分野




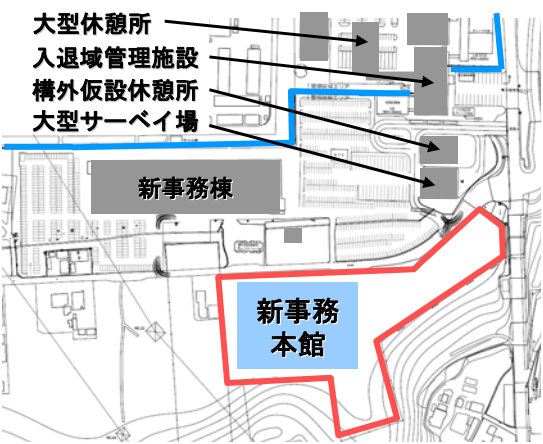
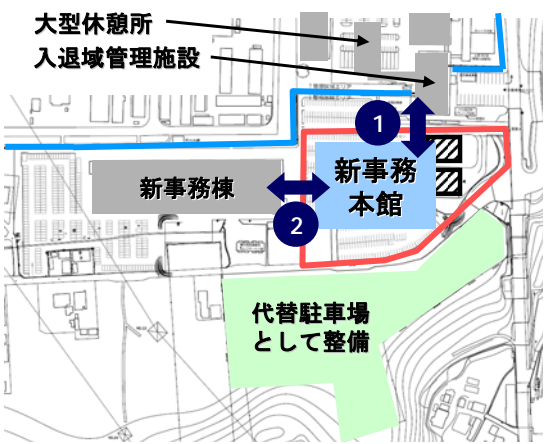


無断複製 転載禁止 東京電力株式会社

## 1. 新事務本館の敷地について

- 周辺建物との連携性を高め、効率的な業務運営を図ること、および敷地の有効利用を図るため、建設敷地を変更

### ■ 建設敷地の比較

項目	当初計画	敷地変更
配置図 <凡例>  計画敷地  移設等  境界柵		
敷地選定の考え方	駐車場や電柱等の干渉物がなく、早期整備が可能（森林伐採エリア）	①入退域管理施設と隣接 ②協力企業棟として活用予定の新事務棟と隣接



無断複製 転載禁止 東京電力株式会社

- 干渉物の撤去・移設作業が多数発生したため、工程の見直しを実施
- 平成27年6月に本体工事着工、平成28年8月に完成の予定

### ■見直し後の工程表

実施項目		H26年度			H27年度												H28年度				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8
代替駐車場整備		■																			
干渉物移設		■																			
新事務本館 建設	準備工事	■																			
	本体工事				★着工予定												竣工予定★				

## 【参考】敷地現況および建物概要について

### 敷地現況



当初敷地（干渉物なし）



変更敷地（干渉物あり）

### 建物概要

- 建築面積 : 約8,500 m<sup>2</sup>
- 延べ面積 : 約23,000 m<sup>2</sup>
- 階数 : 地上3階
- 構造種別 : 鉄骨造
- 場所 : 周辺監視区域の外側
