
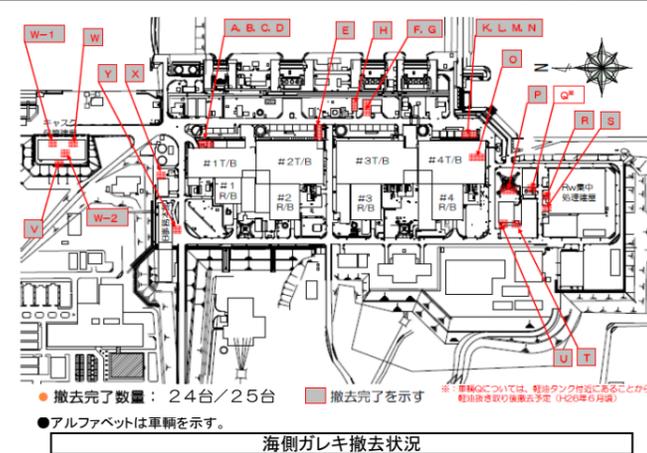


労働環境改善スケジュール

分野	括り	作業内容	これまで一ヶ月の動きと今後一ヶ月の予定		2月		3月				4月		5月		6月	備考		
			23	2	9	16	23	30	6	13	下	上	中	下	前		業	
被ばく・安全管理	1	防護装備の適正化検討 ※ダストフィルタ化：空气中よう素131濃度が全面マスク着用基準を下回ることを確認した上で、ダストフィルタを装着した全面マスクで作業できるエリアを設定し、作業員の負荷軽減、作業性向上を図る。 ※全面マスク着用省略化：空气中放射性物質濃度が全面マスク着用基準を下回ることを確認した上で、全面マスクを着用省略できるエリアを設定し、作業員の負荷軽減、作業性向上を図る。 ※一般作業服化：シート養生を行い、定期的な汚染確認を行う車両に乗車する場合は、一般作業服で移動できるエリアを設定し、作業員の負荷軽減を図る。	共用プール建屋内の全面マスク着用省略化の検討	夕見坂周辺の全面マスク着用省略化の検討											<p>【運用開始日については、連続ダストモニタの設置やサーベイ結果の確認の工程による。</p>			
			構内駐車場及び構内企業棟一部エリア(関電工企業棟周辺)の一般作業服化の検討	「敷地内線量低減にかかる実施方針」を踏まえたタンク群を含む敷地南側エリアの全面マスク着用省略化の検討												<p>【熱中症予防対策の実施】 準備期間</p>		
			ダストフィルタ化 (実施済みエリア)H24.3.1:1~4号機及びその周辺建屋内を除く全棟、H24.12.19:1~4号機及びその周辺建屋内	全面マスク着用省略化 (実施済みエリア)H23.11.8:正門・免震重要棟前・5.6号サービス建屋前、H24.6.1:企業センター厚生棟前、H24.8.9:車両汚染検査場・降車しない見学者、H24.11.19:入退域管理施設建設地、H25.1.28:構内企業棟の一部エリア(東電環境企業棟周辺)、H25.4.8:多核種除去設備、キャスク仮保管設備、H25.4.15:構内企業棟の一部エリア(登録センター周辺)、H25.5.30:1~4号機周辺・タンクエリア・瓦礫保管エリアを除くエリア、H25.10.7:5、6号機建屋内、H25.11.11:がれき保管エリア、H26.3.10:共用プール建屋内の一部エリア				一般作業服化 (実施済みエリア)H24.3.1:正門・免震重要棟前・5.6号サービス建屋前、H24.8.9:降車しない見学者、H25.6.30:入退域管理施設周辺、企業センター厚生棟周辺、運転手用汚染測定小屋周辺、H25.8.5:研修棟休憩所周辺、H26.3.17:構内駐車場及び構内企業棟一部エリア(関電工企業棟周辺)										
			現場作業	情報共有、安全施策の検討・評価														
			現場作業	健康相談受付														
3	重傷災害撲滅、全災害発生件数低減対策の実施	<p>(実績)</p> <ul style="list-style-type: none"> 協力企業との情報共有 3/20安全推進協議会開催：災害事例等の再発防止対策の周知等 作業毎の安全施策の実施(TBM-KY等) 熱中症予防対策：次年度計画の検討等 <p>(予定)</p> <ul style="list-style-type: none"> 3/27安全推進協議会の開催 作業毎の安全施策の実施(継続実施) 熱中症予防対策：次年度計画の検討等 	熱中症予防対策 次年度計画の検討	作業安全確保活動の実績と計画(熱中症含む)									<p>【車輛Q】 軽油タンク付近にあることから、軽油抜き取り後実施予定(H26年6月末)</p>					
			現場作業	情報共有、安全施策の検討・評価														
健康管理	4	<p>(実績)</p> <ul style="list-style-type: none"> H25年度対象者への「がん検査」(社員・協力企業作業員)、「白内障検査」(社員)の案内状送付実施。「甲状腺超音波検査」(社員・協力企業作業員)の案内状送付実施。 「がん検査」の受診希望に基づく、紹介状・検査依頼状・費用申請書の送付、検査費用の精算手続き インフルエンザの予防接種の実施(10/28~1/31:Jガレッジ、近隣医療機関) ※Jガレッジは12/4で終了、近隣医療機関も1/31で終了。 <p>(予定)</p> <ul style="list-style-type: none"> 「がん検査」の受診希望に基づく、紹介状・検査依頼状・費用申請書の送付、検査費用の精算手続き(継続) 	健康相談受付	H25年度対象者「がん検査」(社員・協力企業作業員)、「白内障検査」(社員)、「甲状腺超音波検査」(社員・協力企業作業員)への案内、紹介状・検査依頼状・費用申請書の送付、検査費用の精算手続き											<p>【予防接種実績】 5902人 (H24:5467人)</p>			
			現場作業	各医療拠点の体制検討														
健康管理	5	<p>(実績)</p> <ul style="list-style-type: none"> 1F救急医療室のH26年6月末までの医師確保完了(固定医師1名+0-7-30支援医師) <p>(予定)</p> <ul style="list-style-type: none"> 1F救急医療室の恒常的な医師の確保に向けた調整 	各医療拠点の体制検討	常勤医師の雇用に向けた関係者との調整														
			現場作業															

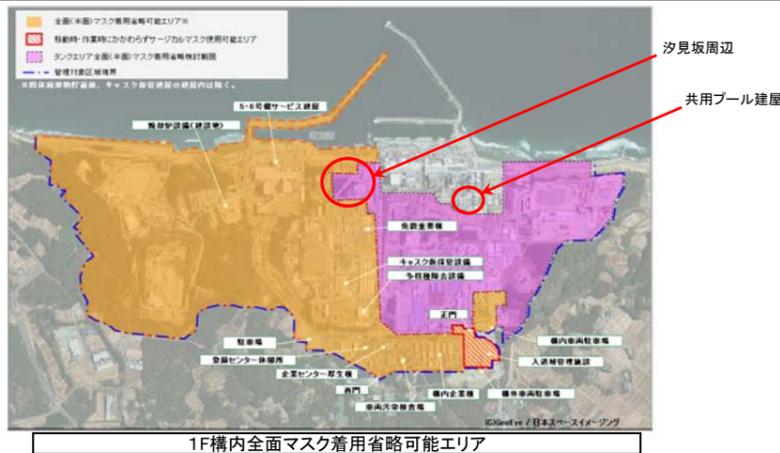

労働環境改善スケジュール

分野名	括り	作業内容	これまで一ヶ月の動きと今後一ヶ月の予定	2月		3月				4月			5月			6月	備考	
				23	2	9	16	23	30	6	13	20	27	3	10	17		24
要員管理 労働環境改善	6	作業員の確保状況と地元雇用率の実態把握	(実績) ・作業員の確保状況と地元雇用率の実態把握(継続的に実施) ・作業員の確保状況(1月実績/3月の予定)と地元雇用率(2月実績)についての調査・集計															
			(予定) ・作業員の確保状況(2月実績/4月の予定)と地元雇用率(3月実績)についての調査・集計															
	7	労働環境・生活環境・就労実態に関する企業との取り組み	(実績) ・労働環境・生活環境・就労実態に関する意見交換及び実態把握 ・意見交換及び実態把握に基づく解決策の検討・実施・結果のフィードバック ・相談窓口への連絡(処遇・労働条件等)への対応															
			(予定) ・労働環境・生活環境・就労実態に関する意見交換及び実態把握(継続的に実施) ・意見交換及び実態把握に基づく解決策の検討・実施・結果のフィードバック(継続的に実施) ・作業員へのアンケートによる実態把握(定期的に実施) ・相談窓口への連絡(処遇・労働条件等)への対応(継続的に実施)															
	8	休憩所の設置・拡大	(実績) ・アスファルト撤去(継続) ・ 基礎工事(継続)															
			(予定) ・アスファルト撤去(継続) ・ 基礎工事(継続)															
9	新事務棟の建設	①暫定事務棟 (実績) ・地盤改良工事 ・基礎工事																
		(予定) ・地盤改良工事(継続) ・基礎工事(継続) ・ 鉄骨建方																
	②本設事務棟 (実績) ・諸条件の検討																	
	(予定) ・諸条件の検討(継続)																	
10	給食センターの設置	(実績) ・開発申請、農地転用申請(大熊町) ・相双保健所との協議 ・ 地権者と土地賃借契約締結(3/15,16) ・ 町へ開発申請提出・受理(3/19)																
		(予定) ・設計 ・確認申請他事前協議																
11	車輛整備工場の建設	(実績) ・敷地造成完了 ・杭打ち完了 ・基礎工事継続中 ・躯体工事(鉄筋)実施中																
		(予定) ・外壁、屋根工事 ・付帯設備工事(電気、消防、換気設備)																

汚染水処理関係の建設工事を優先するため工程見直し

H26年12月末
H27年3月末
完成目標

I期：H26年6月末
完了目標
II期：H26年9月末
完了目標

H27年度末
完了目標

H26年度末
完了目標

町への開発申請提出・受理(3/19)に伴う工程設定

汚染水処理関係の建設工事を優先するため工程見直し

H26.3.20
H26.4.18竣工予定
H26.5~試運用予定
