


環境線量低減対策 スケジュール

分野	括り	作業内容	これまで1ヶ月の動きと今後1ヶ月の予定	7月		8月						9月				10月	11月	備考				
				24	31	7	14	21	28	4	11	18	下	上	中	下	前		後			
放射線量低減		敷地内線量低減 ・段階的な線量低減	<p>(実績)</p> <ul style="list-style-type: none"> 線量率測定 <ul style="list-style-type: none"> 構内全域の状況把握サーベイ (30mメッシュの全測定箇所を年度内にデータ更新) 構内全域の走行サーベイ[1回/3ヶ月] 線量低減対策 <ul style="list-style-type: none"> 土捨場南側敷地造成エリア (伐採・表土除去・路盤舗装等) <p>(予定)</p> <ul style="list-style-type: none"> 線量状況の確認 (2016年度上期) 線量率測定 <ul style="list-style-type: none"> 構内全域の状況把握サーベイ (30mメッシュの全測定箇所を年度内にデータ更新) 構内全域の走行サーベイ[1回/3ヶ月] 線量低減対策 <ul style="list-style-type: none"> 土捨場南側敷地造成エリア (伐採・表土除去・路盤舗装等) 	検討・設計																		
				現場作業	■線量率測定 構内全域の状況把握サーベイ (30mメッシュサーベイ)																	
				現場作業	■線量低減対策 ①1~4号機周辺 ※ ②その他エリア 土捨場南側敷地造成エリア (伐採・表土除去・路盤舗装 等)																	
環境線量低減対策		海洋汚染拡大防止 ・遮水壁の構築 ・繊維状吸着材浄化装置の設置 ・港湾内の被覆 ・浄化方法の検討	<p>(実績)</p> <ul style="list-style-type: none"> 【海水浄化】 港湾内海水濃度の評価、浄化方法の検討 4号機取水路前にCs・Sr吸着繊維設置 (2015.1.15) 【海底土被覆】 必要な範囲について2層目被覆 <p>(予定)</p> <ul style="list-style-type: none"> 【海水浄化】 港湾内海水濃度の評価、浄化方法の検討 4号機取水路前にCs・Sr吸着繊維設置 (2015.1~) 【海底土被覆】 必要な範囲について2層目被覆 【4m盤地下水対策】 港湾内海水モニタリング 	検討・設計																		
				現場作業	吸着繊維設置																	
				現場作業	港湾内海水モニタリング 海底土被覆 (2層目被覆)																	
評価		環境影響評価 ・モニタリング ・傾向把握、効果評価	<p>(実績)</p> <ul style="list-style-type: none"> 1~4号機原子炉建屋上部ダスト濃度測定、放出量評価 敷地内におけるダスト濃度測定 (毎週) 降下物測定 (月1回) 港湾内、発電所近傍、沿岸海域モニタリング (毎日~月1回) 20km圏内 魚介類モニタリング (月1回 11点) 茨城県沖における海水採取 (毎月) 宮城県沖における海水採取 (隔週) <p>(予定)</p> <ul style="list-style-type: none"> 1~4号機原子炉建屋上部ダスト濃度測定、放出量評価 敷地内におけるダスト濃度測定 (毎週) 降下物測定 (月1回) 港湾内、発電所近傍、沿岸海域モニタリング (毎日~月1回) 20km圏内 魚介類モニタリング (月1回 11点) 茨城県沖における海水採取 (毎月) 宮城県沖における海水採取 (隔週) 	検討・設計																		
				現場作業	1,2,3,4u放出量評価																	
				現場作業	降下物測定 (1F,2F) 海水・海底土測定 (発電所周辺, 茨城県沖, 宮城県沖) 20km圏内 魚介類モニタリング																	

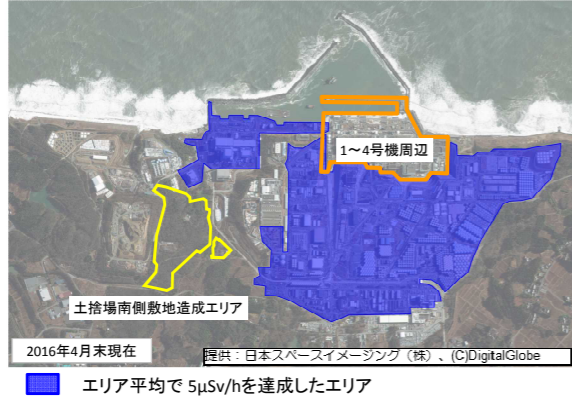

※1~4号機周辺の線量低減は、原子炉建屋上部の線量低減対策及び周辺ヤードの整備等を実施中。(使用済燃料プール対策分野 参照)

2014/11/20に小規模試験体 (Sr) を設置
2015/1/15にCs・Sr吸着繊維を設置
