


労働環境改善スケジュール

分野名	括り	作業内容	これまで1ヶ月の動きと今後1ヶ月の予定		10月					11月					12月					1月		2月		備考
			26	2	5	16	23	30	7	14	下	上	中	下	前	後								
被ばく・安全管理	1	防護装備の適正化検討  (実績) ・「敷地内線量低減にかかる実施方針」を踏まえた敷地南側エリアの全面マスク着用省略化の検討 ・全面マスク着用省略エリア拡大に向けた連続ダストモニタの設置検討 ・9月末までの線量低減作業、モニタ設置の進捗状況を報告(10/30) (予定) ・「敷地内線量低減にかかる実施方針」を踏まえた敷地南側エリアの全面マスク着用省略化の検討(平成25~27年度) ・全面マスク着用省略エリア拡大に向けた連続ダストモニタの設置検討(平成26年度末設置予定) ・ <b>免震重要棟前駐車場及び搬出入口周辺の一般作業服着用可能エリアに設定。また、構内駐車場の一部を、一般作業服着用可能エリアから解除。(12/1予定)</b>  ※ダストフィルタ化：空気中よう素131濃度が全面マスク着用基準を下回ることを確認した上で、ダストフィルタを装着した全面マスクで作業できるエリアを設定し、作業員の負担軽減、作業性向上を図る。 ※全面マスク着用省略化：空気中放射性物質濃度が全面マスク着用基準を下回ることを確認した上で、全面マスクを着用省略できるエリアを設定し、作業員の負担軽減、作業性向上を図る。 ※一般作業服化：シート養生を行い、定期的な汚染確認を行う車両に乗車する場合は、一般作業服で移動できるエリアを設定し、作業員の負担軽減を図る。	検討・設計	進捗状況報告 敷地内線量低減にかかる実施方針を踏まえたタンク群を含む敷地南側エリアの全面マスク着用省略化の検討					進捗状況報告 全面マスク着用省略エリア拡大に向けた連続ダストモニタの設置検討															
			現場作業	ダストフィルタ化 (実施済みエリア)H24.3.1:1~4号機及びその周辺建屋内を除く全域、H24.12.19:1~4号機及びその周辺建屋内					全面マスク着用省略化 (実施済みエリア)H23.11.8:正門・免震重要棟前・5.6号サービス建屋前、H24.6.1:企業センター厚生棟前、H24.8.9:車両汚染検査場・降車しない見学者、H24.11.19:入退域管理施設建設地、H25.1.28:構内企業棟の一部エリア(東電環境企業棟周辺)、H25.4.8:多核種除去設備、キャスク仮保管設備、H25.4.15:構内企業棟の一部エリア(登録センター周辺)、H25.5.30:1~4号機周辺・タンクエリア・瓦礫保管エリアを除くエリア、H25.10.7:5、6号機建屋内、H25.11.11:がれき保管エリア、H26.3.10:共用プール建屋内の一部エリア、H26.5.30:Jタンクエリア					▼免震重要棟前駐車場及び搬出入口周辺										
			現場作業	一般作業服化 (実施済みエリア)H24.3.1:正門・免震重要棟前・5.6号サービス建屋前、H24.8.9:降車しない見学者、H25.6.30:入退域管理施設周辺、企業センター厚生棟周辺、運転手用汚染測定小屋周辺、H25.8.5:研修棟休憩所周辺、H26.3.17:構内駐車場及び構内企業棟一部エリア(関電工企業棟周辺)																				
			現場作業	情報共有、安全施策の検討・評価																				
労働環境改善	2	重傷災害撲滅、全災害発生件数低減対策の実施  (実績) ・協力企業との情報共有 11/20安全推進協議会開催：災害事例等の再発防止対策の周知等 ・作業毎の安全施策の実施(TBM-KY等) (予定) ・11/27安全推進協議会の開催 ・作業毎の安全施策の実施(継続実施)	検討・設計																					
			現場作業																					
			現場作業																					
			現場作業																					
健康管理	3	長期健康管理の実施  (実績) ・H26年度対象者(協力企業作業員)への「がん検査」「甲状腺超音波検査」案内に対する、対象者・医療機関等からの問い合わせ対応、及び検査費用の精算手続き(継続) ・H26年度対象者(社員)への「甲状腺超音波検査」案内、及び検査実施(KK:10/24,29) ・H26年度対象者(社員)への「白内障検査」案内、及び検査実施(KK:11/7,20,21) ・インフルエンザ・ノロウイルス感染予防・拡大防止対策(～H26年度末)インフルエンザ予防接種(10/29～来年1/30 1F新事務棟、近隣医療機関)(継続) (予定) ・H26年度対象者(社員)への「白内障検査」案内(本店:12月中予定) ・H26年度対象者(社員)への「甲状腺超音波検査」案内(本店・福島:1月以降予定)	検討・設計						健康相談受付															
			現場作業						対象者・医療機関等からの問い合わせ対応、及び検査費用の精算手続き															
			現場作業						社員・白内障検査及び甲状腺超音波検査															
			現場作業						インフルエンザ予防接種(10/29～来年1/30)															
健康管理	4	継続的な医療職の確保と患者搬送の迅速化  (実績) ・1F救急医療室のH27年1月中旬までの医師確保完了(固定医師1名+0-7ヶ月支援医師) (予定) ・1F救急医療室の恒常的な医師の確保に向けた調整	検討・設計	各医療拠点の体制検討																				
			検討・設計	常勤医師の雇用に向けた関係者との調整																				
			現場作業																					
			現場作業																					

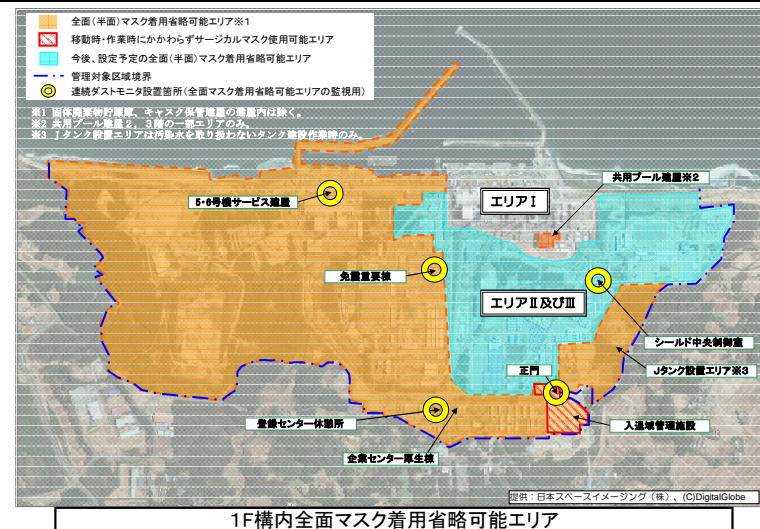

更新

労働環境改善スケジュール

分野名	活り	作業内容	これまで1ヶ月の動きと今後1ヶ月の予定		10月						11月						12月						1月		2月		備考									
			26	2	5	16	23	30	7	14	下	上	中	下	前	後	1	2	1	2																
			検討・設計	作業員の確保状況と地元雇用率の実態把握												現場作業																				
労働環境改善	要員管理	労働環境改善	5	<p>作業員の確保状況と地元雇用率の実態把握</p> <p>(実績) ・作業員の確保状況と地元雇用率の実態把握(継続的に実施) ・作業員の確保状況(10月実績/12月の予定)と地元雇用率(10月実績)についての調査・集計</p> <p>(予定) ・作業員の確保状況(11月実績/1月の予定)と地元雇用率(11月実績)についての調査・集計</p>	検討・設計	▼作業員の確保状況調査依頼												作業員の確保状況集約		▽作業員の確保状況調査依頼						作業員の確保状況集約		▽作業員の確保状況調査依頼								
					現場作業	作業員の確保状況と地元雇用率の実態把握																														
					検討・設計	労働環境・生活環境に関する実態把握・解決策検討・実施																														
					現場作業	▼協力企業との意見交換会(労働環境)10/31																		▽協力企業との意見交換会(労働環境)11/28						協力企業との意見交換会(労働環境)						
					現場作業	作業員へのアンケート(第5回)																		公表(11/27)												
			7	大型休憩所の設置	検討・設計	床スラブ工事・外壁工事他												床スラブ工事・外壁工事		延長						内装工事・設備工事他		H26年度未完了目標								
					現場作業	内装工事・設備工事他																														
			8	新事務本館の建設	検討・設計	設計																		設計								H27年度未完了目標				
					現場作業																															
			9	福島給食センターの設置	検討・設計	鉄骨工事他												外装工事他						内装工事・設備工事他						H26年度未完了目標						
					現場作業	鉄骨工事他																		外装工事他						内装工事・設備工事他						
