


労働環境改善スケジュール

分野名	括り	作業内容	これまで1ヶ月の動きと今後1ヶ月の予定	8月		9月					10月				11月	12月	備考	
				23	30	6	13	20	27	4	11	18	下	上	中	下		
労働環境改善	1 防護装備の適正化検討	<p>(実績) • 全面マスク着用を不要とするエリア拡大に向けた連続ダストモニタの設置 • 地下水バイパス・G/Hタンクエリア周辺の全面マスク着用を不要とするエリア設定(5/28公表、5/29運用開始) • 一般作業服エリア拡大の検討 • 使い捨て式防じんマスクの使用による意見交換会開催(各企業個別)</p> <p>(予定) • 使い捨て式防じんマスクの使用による意見交換会開催(各企業個別) • 一般作業服エリア拡大の検討</p> <p>※ダストフィルタ化: 空気中よう素131濃度が全面マスク着用基準を下回ることを確認した上で、ダストフィルタを装着した全面マスクで作業できるエリアを設定し、作業員の負荷軽減、作業性向上を図る。 ※全面マスク着用不要化: 空気中放射性物質濃度が全面マスク着用基準を下回ることを確認した上で、全面マスク着用を不要とするエリアを設定し、作業員の負荷軽減、作業性向上を図る。 ※一般作業服化: シート養生を行い、定期的な汚染確認を行う車両に乗車する場合は、一般作業服で移動できるエリアを設定し、作業員の負荷軽減を図る。</p>	検討・設計			重機総点検による工程見直し												
			現地作業															
労働環境改善	2 重傷災害撲滅、全災害発生数の推移	<p>(実績) • 協力企業との情報共有 • 9/10安全推進協議会開催: 災害事例等の再発防止対策の周知等 • 作業毎の安全施策の実施(TBM-KY等)</p> <p>(予定) • 9/17安全推進協議会の開催 • 作業毎の安全施策の実施(継続実施)</p>	現地作業															
							【熱中症予防対策の実施】											
労働環境改善	3 長期健康管理の実施	<p>(実績) • 2015年度対象者(協力企業作業員)への「がん検査」「甲状腺超音波検査」案内に向けた案内状送付(8/24完了) • 検査対象者・医療機関等からの問い合わせ対応及び検査費用の精算手続き • 2015年度対象者(社員)の「白内障検査」(福島)実施</p> <p>(予定) • 検査対象者・医療機関等からの問い合わせ対応及び検査費用の精算手続き • 2015年度対象者(社員)の「白内障検査」(柏崎)実施 • インフルエンザ予防接種の実施(10/28~1/29 1F構内臨時会場、近隣医療機関)</p>	現地作業	検討・設計														
労働環境改善	4 継続的な医療職の確保と患者搬送の迅速化	<p>(実績) • 1F救急医療室の2016年1月中旬までの医師確保完了 (固定医師1名+ローテーション支援医師)</p>	現地作業	検討・設計														



分野名 番号	括り 作業内容	これまで1ヶ月の動きと今後1ヶ月の予定	8月		9月					10月					11月 12月		備 考	
			23	30	6	13	20	27	4	11	18	下	上	中	下	前	後	
5	作業員の確保状況と地元雇用率の実態把握	(実績) ・作業員の確保状況と地元雇用率の実態把握（継続的に実施） ・作業員の確保状況（7月実績/9月の予定）と地元雇用率（7月実績）についての調査・集計 (予 定) ・作業員の確保状況（8月実績/10月の予定）と地元雇用率（8月実績）についての調査・集計	検討・設計	▼作業員の確保状況集約 ▼作業員の確保状況調査依頼	作業員の確保状況（7月実績/9月予定）と地元雇用率（8月実績）の実態把握	作業員の確保状況（8月実績/10月予定）と地元雇用率（8月実績）の実態把握	▼作業員の確保状況集約 ▼作業員の確保状況調査依頼	作業員の確保状況（9月実績/11月予定）と地元雇用率（9月実績）の実態把握	▼作業員の確保状況集約 ▼作業員の確保状況調査依頼	作業員の確保状況（9月実績/11月予定）と地元雇用率（9月実績）の実態把握	▼作業員の確保状況集約 ▼作業員の確保状況調査依頼	作業員の確保状況と地元雇用率の実態把握	作業員の確保状況と地元雇用率の実態把握	作業員の確保状況と地元雇用率の実態把握	作業員の確保状況と地元雇用率の実態把握	作業員の確保状況と地元雇用率の実態把握	作業員の確保状況と地元雇用率の実態把握	備考
6	労働環境・生活環境・就労実態に関する企業との取り組み	(実績) ・労働環境・生活環境・就労実態に関する意見交換及び実態把握 ・意見交換及び実態把握に基づく解決策の検討・実施・結果のフィードバック ・相談窓口への連絡（待遇・労働条件等）への対応 ・作業員へのアンケートによる実態把握 (予 定) ・労働環境・生活環境・就労実態に関する意見交換及び実態把握（継続的に実施） ・意見交換及び実態把握に基づく解決策の検討・実施・結果のフィードバック ・作業員へのアンケートによる実態把握 ・相談窓口への連絡（待遇・労働条件等）への対応	検討・設計 現地作業	労働環境・生活環境に関する実態把握・解決策検討・実施 ▼協力企業との意見交換会（労働環境）8/28 配布（8/27～）	協力企業との意見交換会（労働環境）10/2 回収（10月上旬）	協力企業との意見交換会（労働環境）	作業員へのアンケート（第6回）	公表（11/26）										
7	大型休憩所の食堂の改修	(実績) ・食堂（3階）の運用再開（8/3） ・食堂化改修（2階）本工事の設計 ・搬入口設置本工事の設計 ・食堂化改修（2階）本工事 ・搬入口設置本工事 (予 定) ・食堂化改修（2階）本工事 ・食堂（2階）の運用 ・搬入口設置本工事	検討・設計 現地作業	食堂化改修（2階）本工事の設計 搬入口設置本工事の設計	食堂（3階）の運用	食堂化改修（2階）本工事	搬入口設置本工事	新規追加 食堂（2階）の運用									2016年8月完了目標	
8	新事務本館の建設	(実績) ・杭工事 ・掘削工事 ・基礎工事 (予 定) ・掘削工事 ・基礎工事 ・鉄骨工事 ・床PC工事	現地作業	杭工事 掘削工事 基礎工事	天候不順による工事開始時期変更	天候不順による工事開始時期変更	鉄骨工事 床PC工事											
9	道路整備の実施	(実績) ・⑪車両整備場周辺道路工事（道路基礎部・路盤工・舗装） ・⑨土捨場周辺道路工事、⑩Jエリア周辺道路工事の検討・設計 (予 定) ・⑪車両整備場周辺道路工事（道路基礎部・路盤工・舗装） ・⑨土捨場周辺道路工事、⑩Jエリア周辺道路工事の検討・設計 ・⑨土捨場周辺道路工事（路盤工・舗装） ・⑩Jエリア周辺道路工事	検討・設計 現地作業	⑨土捨場周辺道路工事、⑩Jエリア周辺道路工事の検討・設計 ⑪車両整備場周辺道路工事（道路基礎部・路盤工・舗装）	⑪車両整備場周辺道路工事（道路基礎部・路盤工・舗装）	⑨土捨場周辺道路工事（路盤工・舗装）	⑨土捨場周辺道路工事（路盤工・舗装）											

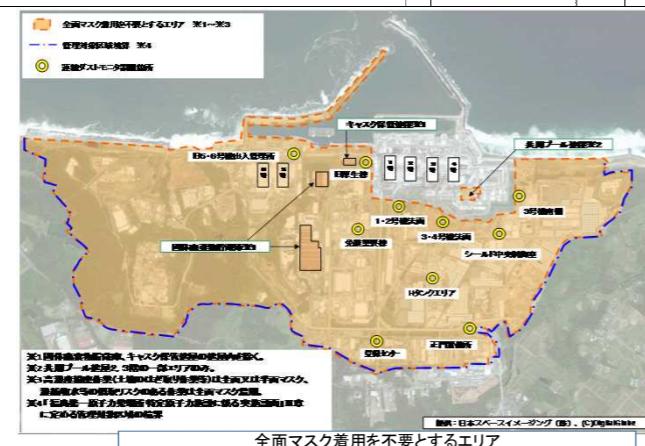
