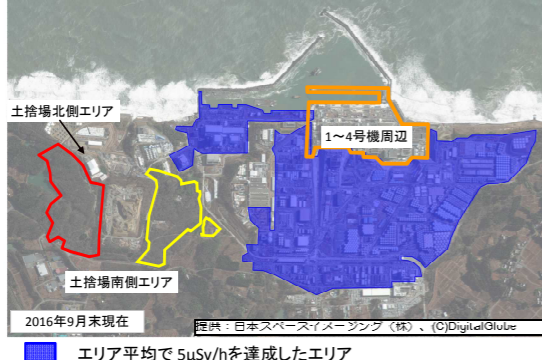


環境線量低減対策 スケジュール

分野名	括り	作業内容	これまで1ヶ月の動きと今後1ヶ月の予定		10月		11月				12月				1月	2月	備考			
			23	30	6	13	20	27	4	11	18	下	上	中	下					
放射線量低減	敷地内線量低減 ・段階的な線量低減	<p>(実績)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>線量率測定               <ul style="list-style-type: none"> <li>構内全域の状況把握サーベイ (30mメッシュの全測定箇所を年度内にデータ更新)</li> <li>構内全域の走行サーベイ(1回/3ヶ月)</li> </ul> </li> <li>線量低減対策               <ul style="list-style-type: none"> <li>土捨場南側エリア (伐採・表土除去・路盤舗装等)</li> <li>土捨場北側エリア (除草・伐採・盛土等)</li> </ul> </li> <li>線量状況の確認(2016年度上期)</li> </ul> <p>(予定)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>線量率測定               <ul style="list-style-type: none"> <li>構内全域の状況把握サーベイ (30mメッシュの全測定箇所を年度内にデータ更新)</li> <li>構内全域の走行サーベイ(1回/3ヶ月)</li> </ul> </li> <li>線量低減対策               <ul style="list-style-type: none"> <li>土捨場南側エリア (伐採・表土除去・路盤舗装等)</li> <li>土捨場北側エリア (除草・伐採・盛土等)</li> </ul> </li> </ul>  <p>2016年9月末現在 資料：日本スペースイメーシング(株)、(O)DigitalGlue</p> <p>■ エリア平均で5μSv/hを達成したエリア</p>	検討・設計																	
			現場作業	<p>■線量率測定</p> <p>▽上期報告 構内全域の状況把握サーベイ(30mメッシュサーベイ)</p> <p>構内全域の走行サーベイ(第3四半期分)</p> <p>■線量低減対策</p> <p>①1~4号機周辺 ※</p> <p>②その他エリア</p> <p>土捨場南側エリア (伐採・表土除去・路盤舗装等)</p> <p>土捨場北側エリア (除草・伐採・盛土等)</p>																※1~4号機周辺の線量低減は、原子炉建屋上部の線量低減対策及び周辺ヤードの整備等を実施中。(使用済燃料プール対策分野 参照)
																				~2018年1月予定
環境線量低減対策	海洋汚染拡大防止 ・遊水壁の構築 ・繊維状吸着材浄化装置の設置 ・港湾内の被覆 ・浄化方法の検討	<p>(実績)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>【海水浄化】港湾内海水濃度の評価、浄化方法の検討 4号機取水路前にCs・Sr吸着繊維設置(2015.1.15~2016.11.8)</li> <li>【海底土被覆】必要な範囲について2層目被覆</li> <li>【排水路付替】A系排水路付替え工事(準備工・試掘調査)</li> </ul> <p>(予定)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>【海水浄化】港湾内海水濃度の評価、浄化方法の検討</li> <li>【海底土被覆】必要な範囲について2層目被覆</li> <li>【4m盤地下水対策】 港湾内海水モニタリング</li> <li>【排水路付替】A系排水路付替え工事(準備工・試掘調査)</li> </ul>	検討・設計																	
			現場作業	<p>吸着繊維設置</p> <p>11/8撤去</p> <p>港湾内海水モニタリング</p> <p>海底土被覆(2層目被覆)</p> <p>A系排水路付替え工事(準備工・試掘調査)</p> <p>11/8撤去</p> <p>11/8撤去</p>																
評価	環境影響評価 ・モニタリング ・傾向把握、効果評価	<p>(実績)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1~4号機原子炉建屋上部ダスト濃度測定、放出量評価</li> <li>敷地内におけるダスト濃度測定(毎週)</li> <li>降下物測定(月1回)</li> <li>港湾内、発電所近傍、沿岸海域モニタリング(毎日~月1回)</li> <li>20km圏内魚介類モニタリング(月1回 11点)</li> <li>茨城県沖における海水採取(毎月)</li> <li>宮城県沖における海水採取(隔週)</li> </ul> <p>(予定)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1~4号機原子炉建屋上部ダスト濃度測定、放出量評価</li> <li>敷地内におけるダスト濃度測定(毎週)</li> <li>降下物測定(月1回)</li> <li>港湾内、発電所近傍、沿岸海域モニタリング(毎日~月1回)</li> <li>20km圏内魚介類モニタリング(月1回 11点)</li> <li>茨城県沖における海水採取(毎月)</li> <li>宮城県沖における海水採取(隔週)</li> </ul>	検討・設計																	
			現場作業	<p>1,2,3,4u放出量評価</p> <p>2uR/B</p> <p>4uR/B</p> <p>1uR/B</p> <p>3uR/B</p> <p>敷地内ダスト測定</p> <p>降下物測定(1F,2F)</p> <p>海水・海底土測定(発電所周辺、茨城県沖、宮城県沖)</p> <p>20km圏内魚介類モニタリング</p> <p>1,2,3,4u放出量評価</p> <p>1,2,3,4uR/B測定</p>																
