# サイトバンカ建屋における地下水の流入状況について

2018年12月27日

**TEPCO** 

# 東京電力ホールディングス株式会社


©Tokyo Electric Power Company Holdings, Inc. All Rights Reserved.

無断複製・転載禁止 東京電力ホールディングス株式会社

概要

**TEPCO** 

- サイトバンカ建屋への地下水流入量が、約5m³/日であったものから、11月中旬から増加傾向となり、 約40m³/日の流入量となっていることを確認した。
- 現在, サイトバンカ建屋漏水修理工事を実施しているが, 流入量増加との関連は認められない。
- 今後, サイトバンカ建屋の水抜きを行い, 流入量増加の原因調査を実施する。

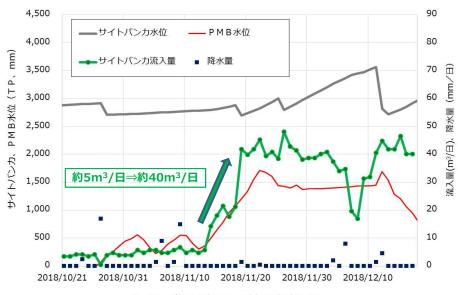


サイトバンカ建屋への地下水流入量

原因調査について T=PCO

■ 本設の移送設備によりサイトバンカ建屋内の水位を低下させ、サイトバンカ建屋地下1階部を目視確認 し,流入箇所の有無を調査した。(2018年12月21日調査実施)

■ 今後サイトバンカ滞留水の水質分析を行うほか、本設の移送ポンプの下限レベル以下の水を仮設設備を 構築したうえで水抜きし、流入箇所の有無を調査する。仮設設備の構築方法は現場状況を確認のうえ検 討する。 (検討は2018年12月より開始。調査は2月頃を予定)



サイトバンカ建屋 ポンプ・水位計の位置

©Tokyo Electric Power Company Holdings, Inc. All Rights Reserved.

無断複製・転載禁止 東京電力ホールディングス株式会社


2

## サイトバンカ建屋地下1階調査結果【1/2】(2018/12/21)

**TEPCO** 


### 調査箇所

地下1階床面から約400mmまで水抜きを実施後,目視にて壁面の観察を実施したが地下水の 流入,水面の動きは確認されず。

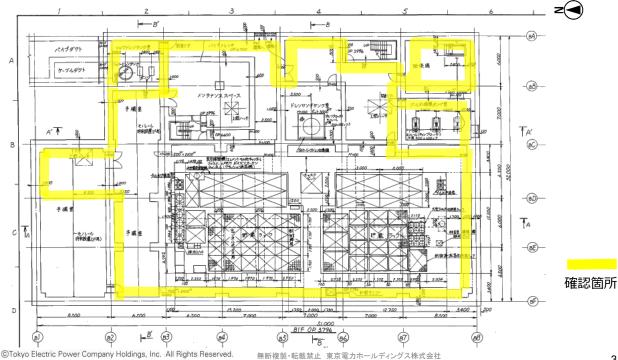


3



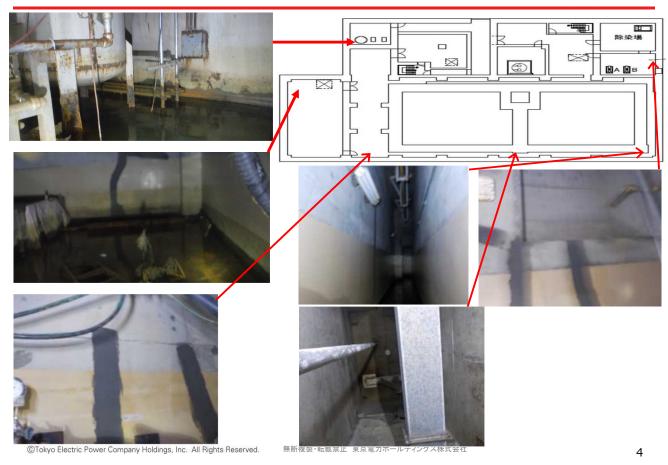

# 【参考】サイトバンカ建屋への地下水流入量の長期トレンド

## **TEPCO**

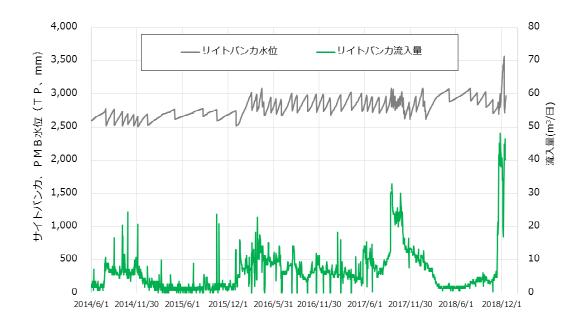

【工事件名】サイトバンカ建屋漏水修理工事

【工 期】2018年11月1日~2019年2月21日

【施工内容】昨年度、地下階から漏水が確認された場所の止水工事を行う。

#### 工程表





充填剤注入箇所の流入は止まっている。工事によって流入が増えたことは無い。 現在サイトバンカ内部で確認できている箇所は、右図の地下水流入箇所としている箇所だけである。

### 現場状況

©Tokyo Electric Power Company Holdings, Inc. All Rights Reserved.

無断複製・転載禁止 東京電力ホールディングス株式会社

6

### 【参考】サイトバンカ建屋の位置



