

滞留水の貯蔵及び処理の状況概略

①建屋内滞留水水位及び貯蔵量

・建屋内滞留水水位は運転上の制限を満足

②1~4号機タンク貯蔵量

・淡水化装置による処理により、RO処理水(淡水)及び濃縮塩水の貯蔵量は変動あり

・蒸発濃縮装置は全台停止中

③5, 6号機滞留水貯蔵量

・構内散水によりFエリアタンク貯蔵量は変動あり

④廃棄物発生量

・除染装置停止中のため、廃スラッジ貯蔵量は変動なし

①建屋内滞留水水位及び貯蔵量

施設	貯蔵量	T/B建屋内水位
1号機	約1,820 m ³	~*7
2号機	約4,680 m ³	T.P.-1,098
3号機	約5,570 m ³	T.P.-1,070
4号機	約3,980 m ³	T.P.-1,270
合計	約16,050 m ³	

貯蔵施設	貯蔵量	水位
プロセス主建屋	約12,530 m ³	T.P.2,024
高温焼却炉建屋	約3,230 m ³	T.P.420
合計	約15,760 m ³	


(合計):+720[m³/4週] (合計):+470[m³/週]

(合計):-1230[m³/4週] (合計):-280[m³/週]

(合計):+1033[m³/4週] (合計):+307[m³/週]


④廃棄物発生量

廃スラッジ




保管量:597/700[m³]※3

使用済ベッセル



保管量:4463/6372体※1

濃縮廃液




保管量:約9403/10300[m³]※3

水位計0%以上の保管量:9303[m³]

タンク底部～水位計0%の保管量(DS):約100[m³]

③5, 6号機タンク貯蔵量

タンク総容量



水量:約1178300/1280000[m³]※2,3

+4793[m³/4週]/+2700[m³/4週]

+1089[m³/週]/±0[m³/週]

タンク貯蔵量合計(②+③)

*1 第二セシウム吸着装置使用済ベッセル及び多核種除去設備の保管容器、処理カラム及びモバイル系処理装置使用済ベッセルを含む

*2 装置稼動中ににつき水位が静定しないため参考扱い

*3 貯蔵容量は運用上の上限を示す(タンクの貯蔵容量は10の位を切り捨てて表記)

*4 多核種除去設備等(ホット試験中)の処理済水を貯蔵するが、タンクの運用状況に応じて淡水や濃縮塩水を貯蔵

*5 ウエルポイント・地下水ドレン(約90m³/週)、サイトバン建設からプロセス主建屋への移送量(約750m³/週)、その他他移送量(約100m³/週)の合計約940m³/週を含む


(端数処理上、各移送量の総和と異なる場合がある)

*6 放射性物質濃度が高い多核種除去設備B系出口水を含む


*7 1号機T/Bはすでに水抜きが完了しているため、水位を「-」表記

*8 フランジ型タンクに貯蔵するSr処理水の処理完了(2018/11/17)

フランジ型タンクに貯蔵する多核種除去設備等処理済水の移送完了(2019/3/27)。引き続き、残水処理を進める観点から、以後、フランジ型タンクのタンク底部～水位計0%の水量(DS)は水位0%以上の水量に含める



1~4号機タンク総容量



水量:約1197617[m³]




+5113[m³/4週]

+1702[m³/週]


建屋内貯蔵量

+

1~4号機タンク貯蔵量
(①+②)



滞留水の貯蔵状況の推移

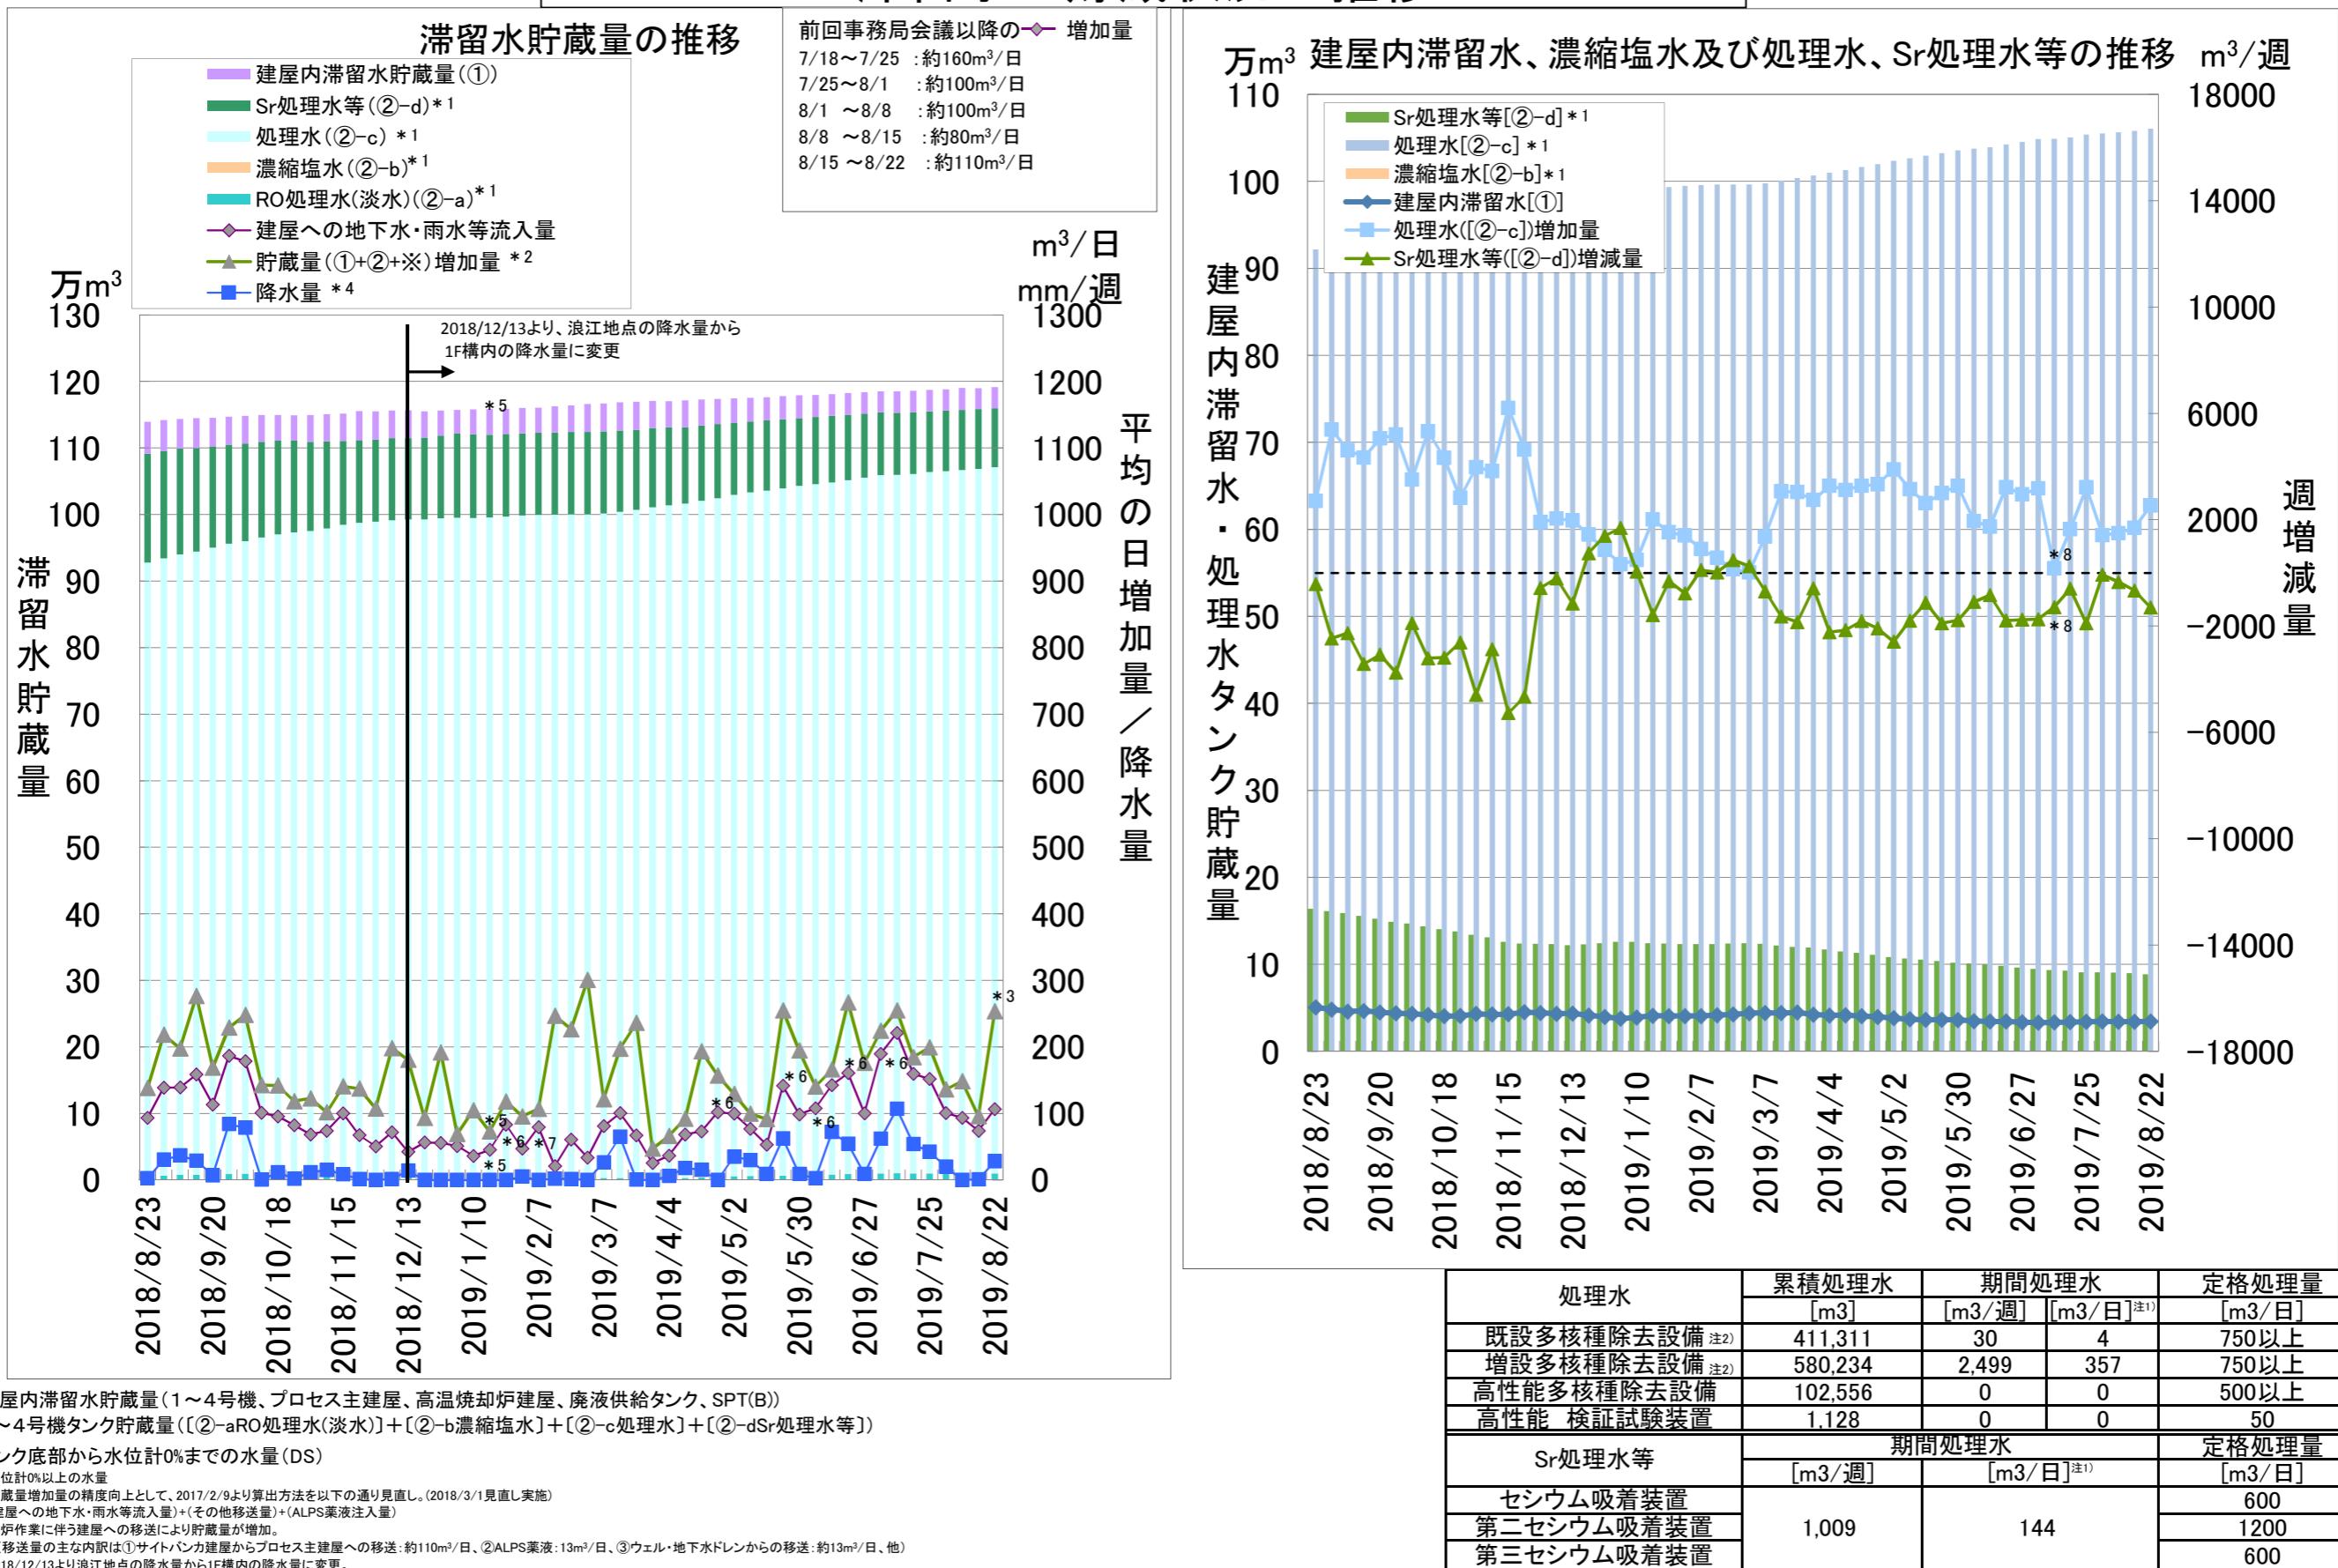

①: 建屋内滞留水貯蔵量(1～4号機、プロセス主建屋、高温焼却炉建屋、廃液供給タンク、SPT(B))
②: 1～4号機タンク貯蔵量([②-a]RO処理水(淡水)+[②-b]濃縮塩水+[②-c]処理水+[②-d]Sr処理水等])

※: タンク底部から水位計0%までの水量(DS)

* 1: 水位計0%以上の水量

* 2: 貯蔵量増加量の精度向上として、2017/2/9より算出方法を以下の通り見直し。(2018/3/1見直し実施)

[建屋への地下水・雨水等流入量]+(ALPS薬液注入量)

* 3: 廃炉作業に伴う建屋への移送により貯蔵量が増加。

(移送量の主な内訳は①サイレント建屋からプロセス主建屋への移送: 約110m³/日、②ALPS薬液: 13m³/日、③ウェル・地下水ドレンからの移送: 約13m³/日、他)

* 4: 2018/12/13より浪江地点の降水量から1F構内の降水量に変更。

* 5: 2019/1/17より4号機C/B滞留水を建屋内滞留水貯蔵量に加えて管理。建屋への地下水・雨水等流入量・貯蔵量増加量については2019/1/24より反映。

* 6: 建屋内滞留水の水位低下の影響で、評価上、建屋への地下水・雨水等流入量が一時的に増加したものと推定。(2019/1/17, 2019/4/22, 2019/5/16, 2019/6/30, 2019/6/13, 2019/6/27)

* 7: 建屋水位計の取替えを実施。(2019/2/7～2019/3/7)

* 8: タンクエリア毎に、タンク水量・容量の算出方法が異なっていたため、全エリアのタンク水量・容量算出方法を統一。統一に伴い、計算上、処理水増加量及びSr処理水等増減量が変動しているが

実際の処理量は、処理水: 約2200m³/週、Sr処理水等: 約1100m³/週。(2019/7/11)

処理水	累積処理水	期間処理水	定格処理量	
	[m ³]	[m ³ /週] [m ³ /日] ^{注1)}	[m ³ /日]	
既設多核種除去設備 ^{注2)}	411,311	30	4	750以上
増設多核種除去設備 ^{注2)}	580,234	2,499	357	750以上
高性能多核種除去設備	102,556	0	0	500以上
高性能検証試験装置	1,128	0	0	50
Sr処理水等	期間処理水		定格処理量	
	[m ³ /週]	[m ³ /日] ^{注1)}	[m ³ /日]	
セシウム吸着装置			600	
第二セシウム吸着装置	1,009	144	1200	
第三セシウム吸着装置			600	

注1) 週間の平均値

注2) 既設・増設多核種除去設備処理水の一部は、残水があるRO濃縮塩水タンクに移送し、Sr処理水等として貯蔵
