原子炉建屋 小部屋内調査の 計画・実施について

2013年3月28日 東京電力株式会社



無断複製・転載禁止 東京電力株式会社

1. 調査目的および調査対象箇所

2


調査目的

原子炉建屋内のパーソナルエアロック室等(以下、「小部屋」)について、ロボット※により雰囲気線量、映像データを取得し、格納容器の調査・補修方法へ反映すること。 ※扉を開ける作業は人が実施。

調査対象箇所

- ■1~3号機原子炉建屋1~3階の格納容器の調査・補修対象の貫通部がある小部屋 【今回の調査対象】
- ・1号機パーソナルエアロック室
- ・2号機MSトンネル室

小部屋 (パーソナル エアロック室)

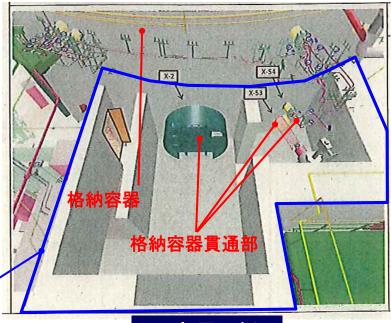

小部屋の例


調査項目	調査内容等					
①雰囲気線量測定 (一部ダスト測定を含む)	小部屋内の雰囲気線量を測定 (小部屋内での作業が可能な環境か確認)					
②アクセスルート、 部屋内干渉物の画像取得	●格納容器調査対象箇所(貫通部)へのアクセス 方法確認●補修時に使用する床面への穴開け場所の有無 の確認					
③格納容器貫通部周辺の 線量率測定	格納容器調査対象箇所である貫通部周辺の雰囲 気線量を測定 (人によるアクセスが可能な線量か確認)					
④格納容器貫通部周辺の 画像取得	貫通部周辺の調査・補修作業における干渉物の 有無を確認					
⑤天井付近の画像取得	小部屋内での作業が難しい場合に天井から穿孔 し、アクセス可能か確認					

🙀 東京電力


無断複製・転載禁止 東京電力株式会社

3-1. 調查対象(1号機原子炉建屋1,2階)

4

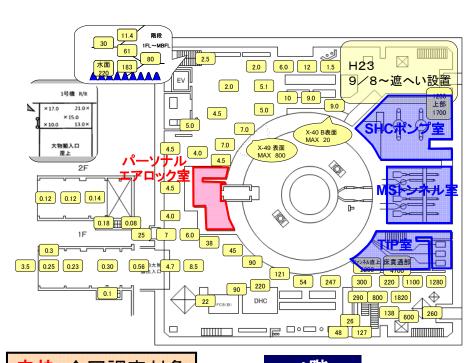

単位:mSv/h

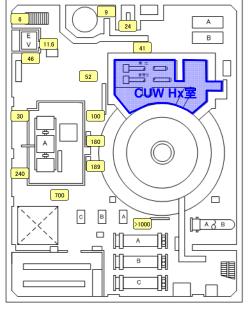


赤枠:今回調査対象 **青枠**:今後調査予定 1階

2階

原子炉建屋

3-2. 調査対象(2号機原子炉建屋1,2階)

5

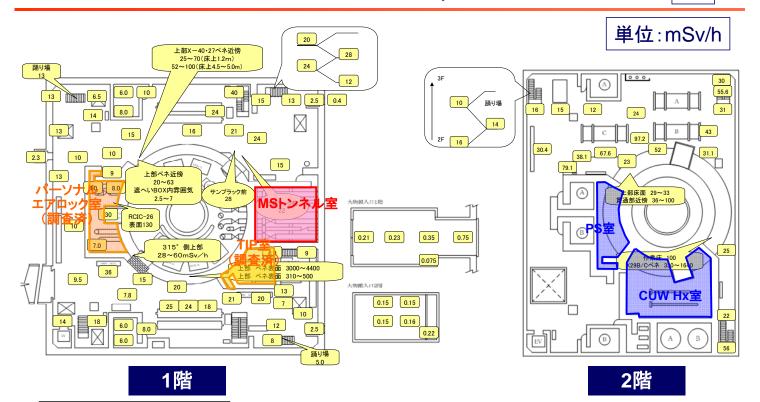

赤枠: 今回調査対象 青枠: 今後調査予定 黄枠: 調査済

2号機 原子炉建屋

3-3. 調査対象(3号機原子炉建屋1,2階)

無断複製・転載禁止 東京電力株式会社

6

1階

2階

青枠:今後調査予定


3号機 原子炉建屋

単位:mSv/h



3-4. 調査対象(2,3号機原子炉建屋3階)




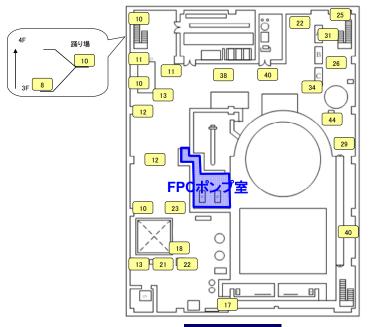

3階

2号機 原子炉建屋

青枠: 今後調査予定

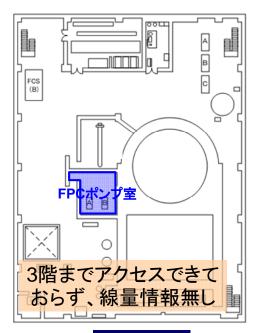

3階

3号機 原子炉建屋

単位:mSv/h

無断複製·転載禁止 東京電力株式会社



4. 調査計画

8

スケジュール(案)および調査ロボット

一田木	田本ロギ…し	4月																		
調査対象 調査ロボット		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1号機 パーソナル エアロック室	•FRIGO-MA •Packbot									調金										
2号機 MSトンネル室	•Quince2 •Packbot																調		備日	

●残りの小部屋調査については、建屋内線量低減の進捗状況を踏まえつつ、2014年度中の完了を目指す。

計画線量

当日作業	
〇【1号機】現場準備+救出補助	計画2.0mSv/人(作業人数3名)
【2号機】現場準備+救出補助	計画3.0mSv/人(作業人数3名)
O【1, 2号機とも】扉固縛	計画5.0mSv/人(作業人数1名)
O【1, 2号機とも】救出作業が必 要となった場合	計画7.0mSv/人(作業人数2名)


種類	Packbot	Quince2	FRIGO-MA				
全体写真							
有線• 無線	無線	有線	有線				
特徴	カメラパンチルトズーム 機能有+アームによる高 さ調整可能	ダストサンプリング可、温 湿度・線量測定可	カメラパンチルトズーム 機能有、 温湿度計・線量測定可、 録音機能有				



無断複製·転載禁止 東京電力株式会社

【参考②】これまでの調査実績:1号機TIP室

10

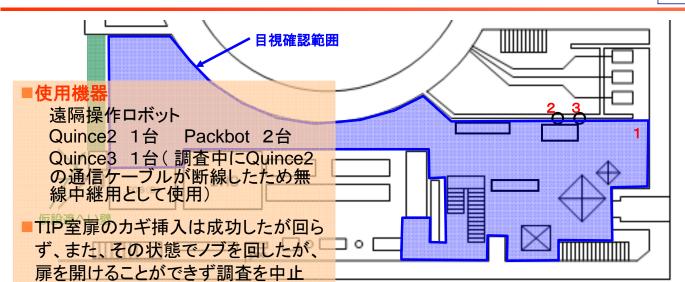






2. 機器ファンネル



3. 床貫通部







TIP系統機器には目立った損傷は見られなかった

●遠隔操作ロボット Quince2 1台



無断複製・転載禁止 東京電力株式会社

【参考④】これまでの調査実績:3号機TIP室

12

