


# 発電所内のモニタリング状況等について (海側遮水壁の状況について)

2015年10月1日  
東京電力株式会社



無断複製・転載禁止 東京電力株式会社

## 1. 海側遮水壁閉合箇所 の状況

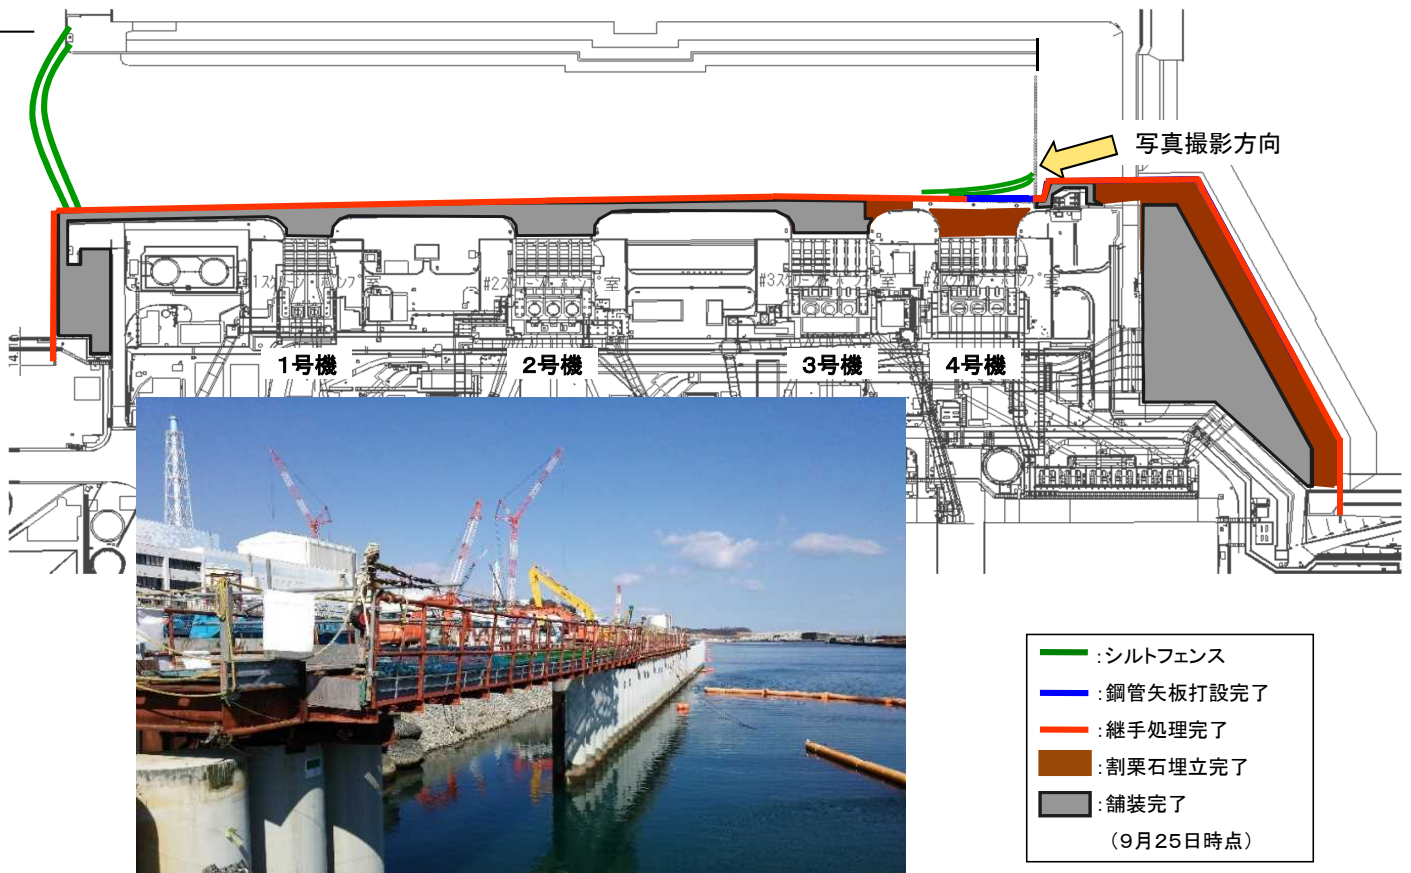

海側遮水壁閉合箇所 : 鋼管矢板9本分(延長約10m)

## 2. 海側遮水壁閉合作業の状況

打設作業



打設完了後



海側遮水壁閉合前



鋼管矢板打設完了後



## 3. 海側遮水壁閉合作業の概略工程

	2015年		
	8月	9月	10月
準備	機材等準備		9/25現在
鋼管矢板打設※		◆開始(9/10) ◆完了(9/22)	
継手処理※			◆閉合作業完了

※工程は天候等により変動する可能性があります
