

3号機使用済燃料プール内大型ガレキ撤去作業の進捗状況について


2015年11月26日

東京電力株式会社



東京電力

ラック養生板設置および瓦礫撤去手順案（概略）

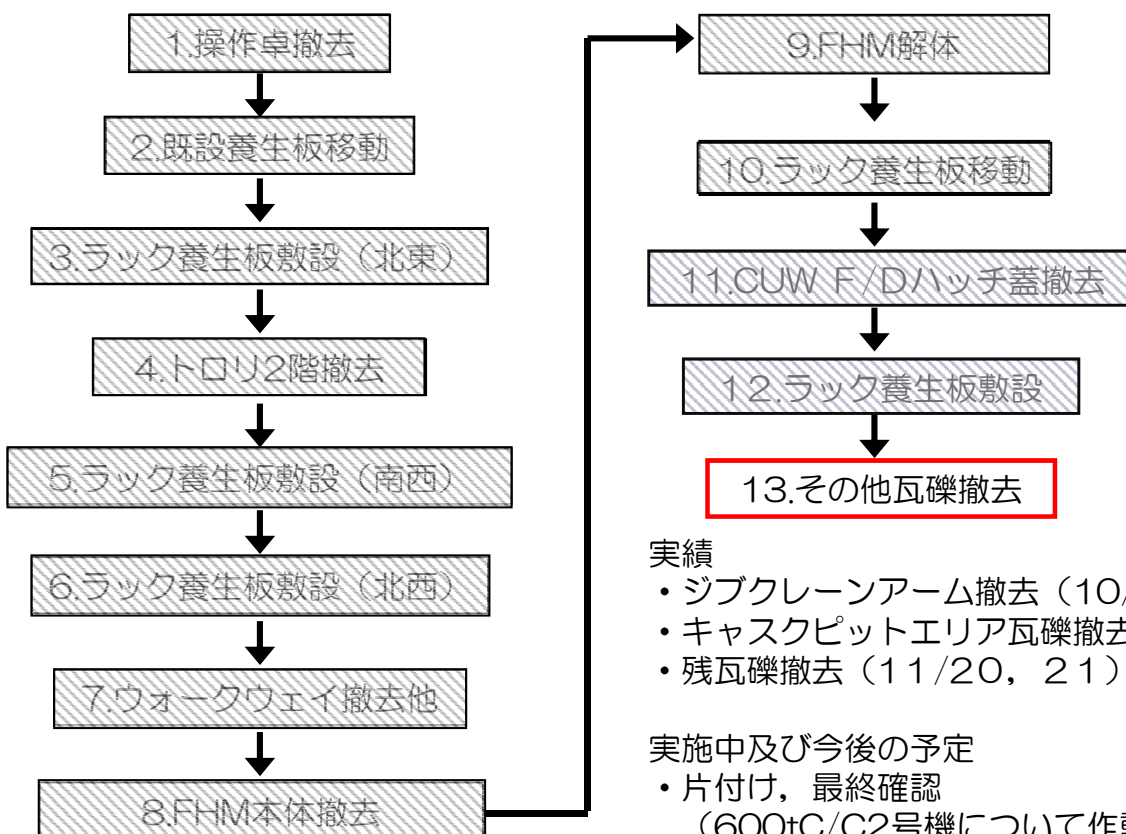

実績


- ・ジブクレーンアーム撤去（10/29）
- ・キャスクピットエリア瓦礫撤去（11/6～13）
- ・残瓦礫撤去（11/20, 21）

実施中及び今後の予定

- ・片付け、最終確認
（600tC/C2号機について作動油レベル低下を確認したことから原因について調査中）


ジブクレーンアーム撤去状況

ジブクレーンアームの一部にジブクレーンアーム撤去装置のフックをひっかけた後に、持ち上げることで撤去。

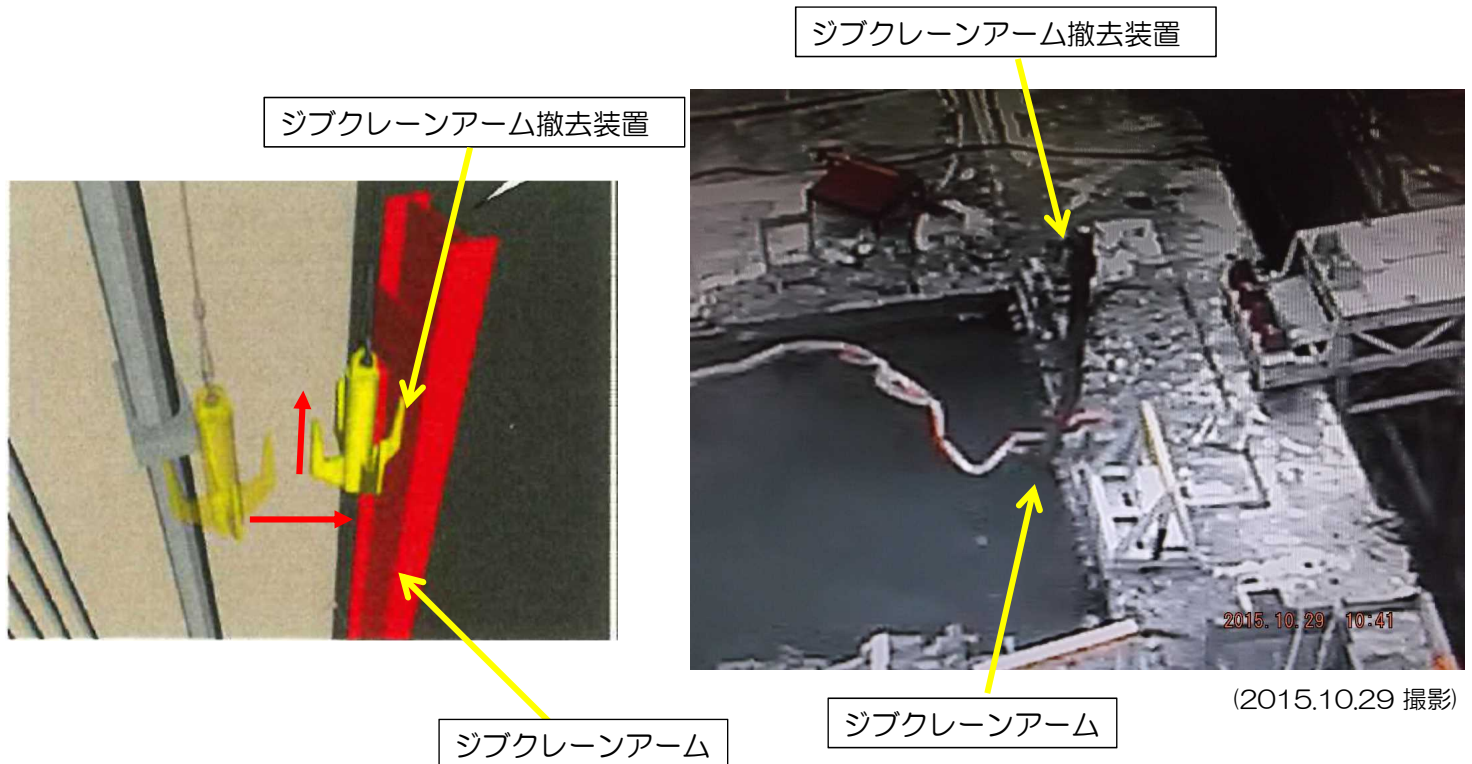


キャスクピットエリア内小瓦礫撤去状況


キャスクピット底部に堆積しているコンクリート瓦礫、FHM手摺をバケットを用いて撤去。

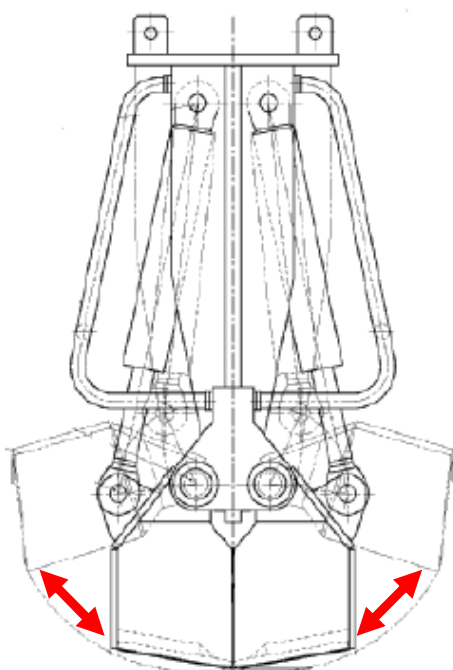

瓦礫撤去装置
(バケット)

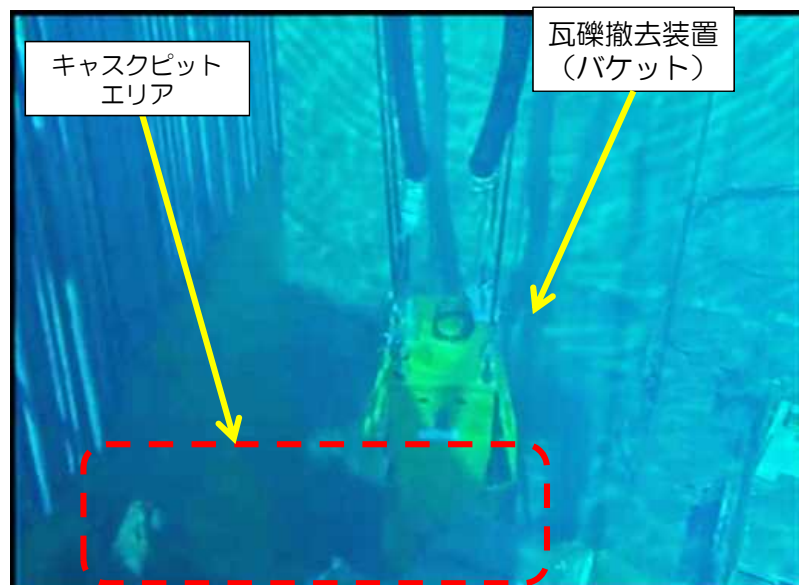

瓦礫および養生板配置状態（現状 2015.11.25 時点）

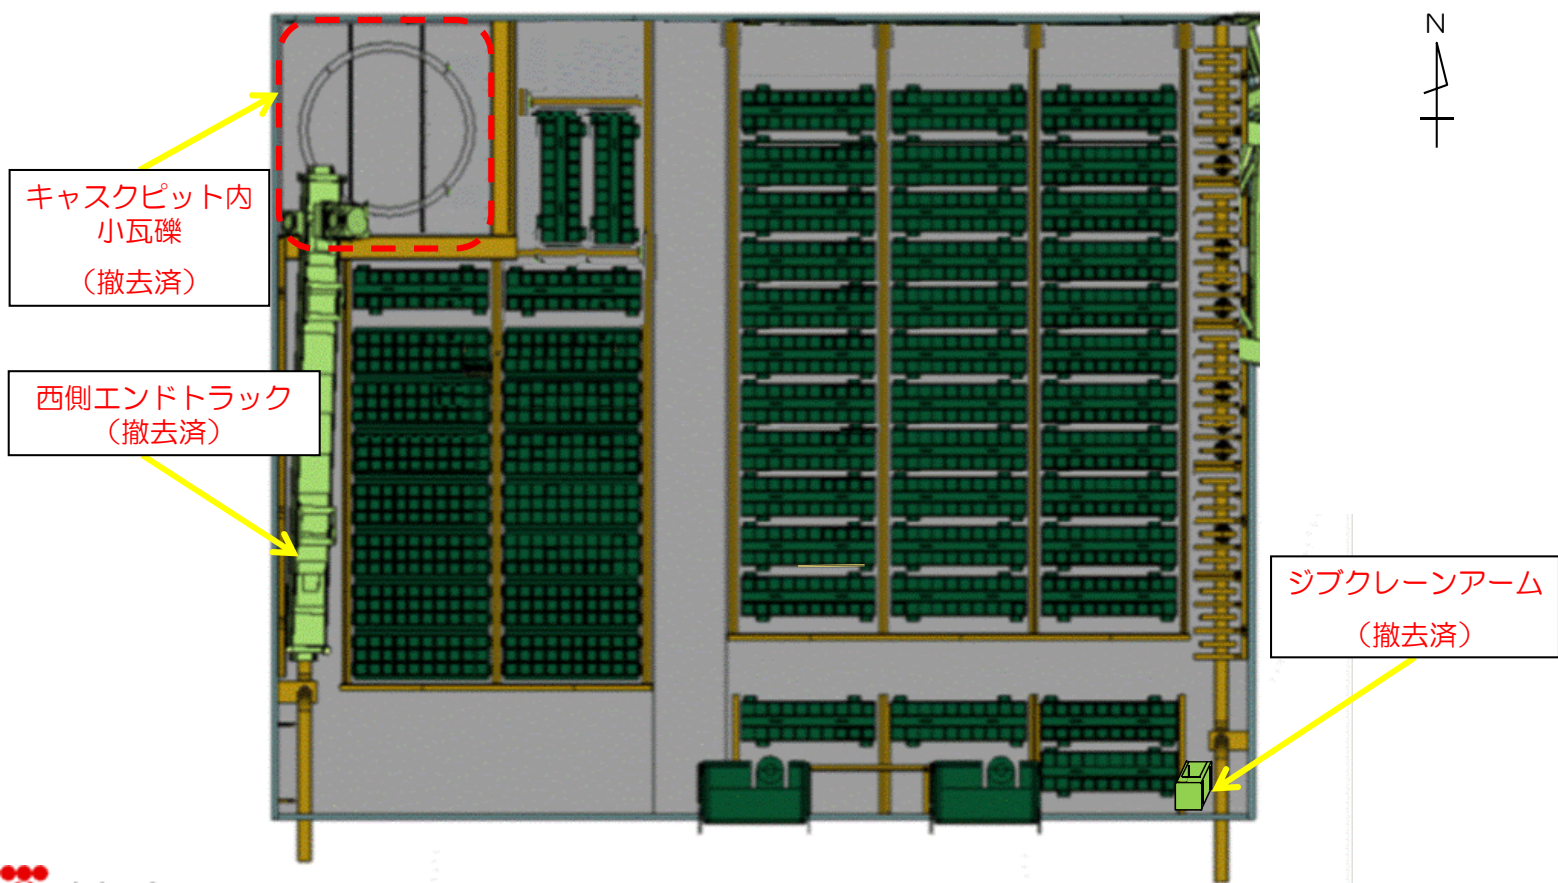

工程

	平成26年 (2014)		平成27年 (2015)										
	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
追加養生板	設計・製作		3.敷設	5.敷設・移動	7.敷設						10.移動	12.敷設	
既設養生板		2.移動											
瓦礫撤去作業	1.操作卓・張出しフレーム撤去			6.ワークウェイ撤去、他			機材移動	6.ワークウェイ撤去、他		8.FHM本体撤去		13.その他瓦礫撤去	
			4.トロリ2階撤去							9.FHM解体			
										11.CUW F/D ハッチ蓋撤去			
クローラクレーン1号機 年次点検													
クローラクレーン2号機 年次点検													

点検時期を前倒しし、点検に合わせてカメラ取替を実施
