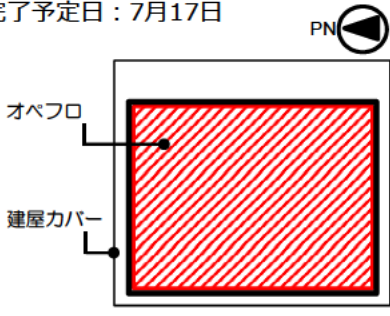
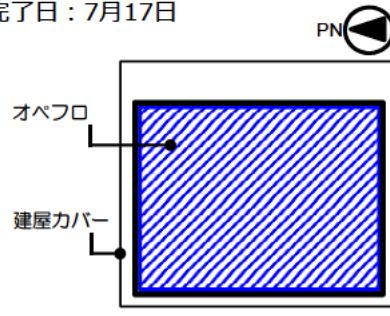
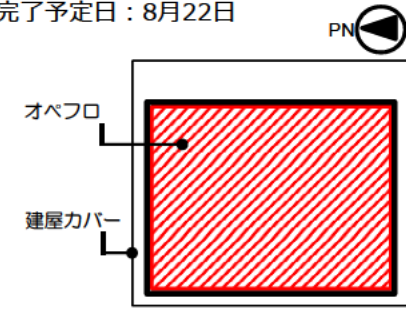


2.作業時散布・定期散布の実績及び予定（1号機）

TEPCO

作業時散布			
目 的	オペフロ上での（ガレキ撤去や除染等）作業に応じて、飛散防止剤を散布し、ダストの飛散を抑制することを目的とする		
標準散布量	1.5L/m ² 以上	濃 度	1/10
散布対象作業	北側ガレキ撤去		

定期散布の実績及び予定		
計画（7月）	実績（7月）	計画（8月）
完了予定日：7月17日 	完了日：7月17日 	完了予定日：8月22日 

【凡例】：計画散布範囲 ：実績散布範囲

©Tokyo Electric Power Company Holdings, Inc. All Rights Reserved.

無断複製・転載禁止 東京電力ホールディングス株式会社

平成30年7月25日時点

2

3.作業時散布の実績及び予定（1号機）

TEPCO

当該週の散布範囲								
日	24 (土)	25 (日)	26 (月)	27 (火)	28 (水)	29 (木)	30 (金)	
6月	散布対象作業	-	-	-	北側ガレキ撤去	-	-	-
	散布面積合計 (m ²)	-	-	-	20	-	-	-
	平均散布量 (L/m ² ・回)	-	-	-	5	-	-	-
	連続ダストモニタの計測値 Bq/cm ³ *1	2.16E-04 (最大) ND (最小)	1.22E-04 (最大) ND (最小)	1.99E-04 (最大) ND (最小)	1.70E-04 (最大) ND (最小)	2.06E-04 (最大) ND (最小)	1.58E-04 (最大) ND (最小)	1.34E-04 (最大) ND (最小)
7月	1 (日)	2 (月)	3 (火)	4 (水)	5 (木)	6 (金)	7 (土)	
	散布対象作業	-	-	北側ガレキ撤去	-	北側ガレキ撤去	北側ガレキ撤去	-
	散布面積合計 (m ²)	-	-	50	-	50	50	-
	平均散布量 (L/m ² ・回)	-	-	2	-	2	2	-
	連続ダストモニタの計測値 Bq/cm ³ *1	1.09E-04 (最大) ND (最小)	1.72E-04 (最大) ND (最小)	1.44E-04 (最大) ND (最小)	1.29E-04 (最大) ND (最小)	1.03E-04 (最大) ND (最小)	8.50E-05 (最大) ND (最小)	1.17E-04 (最大) ND (最小)
	8 (日)	9 (月)	10 (火)	11 (水)	12 (木)	13 (金)	14 (土)	
	散布対象作業	-	-	-	北側ガレキ撤去	-	-	-
	散布面積合計 (m ²)	-	-	-	20	-	-	-
	平均散布量 (L/m ² ・回)	-	-	-	5	-	-	-
	連続ダストモニタの計測値 Bq/cm ³ *1	1.20E-04 (最大) ND (最小)	1.68E-04 (最大) ND (最小)	1.40E-04 (最大) ND (最小)	1.00E-04 (最大) ND (最小)	1.22E-04 (最大) ND (最小)	9.71E-05 (最大) ND (最小)	1.34E-04 (最大) ND (最小)
	15 (日)	16 (月)	17 (火)	18 (水)	19 (木)	20 (金)	21 (土)	
	散布対象作業	-	-	-	-	-	-	北側ガレキ撤去
	散布面積合計 (m ²)	-	-	-	-	-	-	50
	平均散布量 (L/m ² ・回)	-	-	-	-	-	-	2
	連続ダストモニタの計測値 Bq/cm ³ *1	1.11E-04 (最大) ND (最小)	1.00E-04 (最大) ND (最小)	1.44E-04 (最大) ND (最小)	1.87E-04 (最大) ND (最小)	9.30E-05 (最大) ND (最小)	1.25E-04 (最大) ND (最小)	1.46E-04 (最大) ND (最小)
	22 (日)	23 (月)	24 (火)	25 (水)	26 (木)	27 (金)	28 (土)	
	散布対象作業	-	北側ガレキ撤去	北側ガレキ撤去	-	-	-	-
	散布面積合計 (m ²)	-	20	50	-	-	-	-
	平均散布量 (L/m ² ・回)	-	5	2.6	-	-	-	-
	連続ダストモニタの計測値 Bq/cm ³ *1	1.34E-04 (最大) ND (最小)	1.29E-04 (最大) ND (最小)	1.17E-04 (最大) ND (最小)	- (最大) - (最小)	- (最大) - (最小)	- (最大) - (最小)	- (最大) - (最小)
8月	29 (日)	30 (月)	31 (火)	1 (水)	2 (木)	3 (金)	4 (土)	
	散布対象作業	-	-	-	-	-	-	-
	散布面積合計 (m ²)	-	-	-	-	-	-	-
	平均散布量 (L/m ² ・回)	-	-	-	-	-	-	-
	連続ダストモニタの計測値 Bq/cm ³ *1	- (最大) - (最小)	- (最大) - (最小)	- (最大) - (最小)	- (最大) - (最小)	- (最大) - (最小)	- (最大) - (最小)	- (最大) - (最小)

* 表記の連続ダストモニタ計測値は連報値、ND=不検出

平成30年7月25日時点

©Tokyo Electric Power Company Holdings, Inc. All Rights Reserved.

無断複製・転載禁止 東京電力ホールディングス株式会社

3

4.オペレーティングフロアの連続ダストモニタの計測値（3号機）

									当該週の散布範囲
6月	日	24 (日)	25 (月)	26 (火)	27 (水)	28 (木)	29 (金)	30 (土)	-
	散布対象作業 ^{※4}	-	-	-	-	-	-	-	
	散布面積合計 (m2)	-	-	-	-	-	-	-	
	平均散布量 (L/m2 回) ^{※1}	-	-	-	-	-	-	-	
	連続ダストモニタの計測値 (Bq/cm3) ^{※2}	3.66E-05 (最大) ND ^{※3} (最小)	3.57E-05 (最大) ND ^{※3} (最小)	3.34E-05 (最大) ND ^{※3} (最小)	4.14E-05 (最大) ND ^{※3} (最小)	3.91E-05 (最大) ND ^{※3} (最小)	3.11E-05 (最大) ND ^{※3} (最小)	2.48E-05 (最大) ND ^{※3} (最小)	
7月	日	1 (日)	2 (月)	3 (火)	4 (水)	5 (木)	6 (金)	7 (土)	-
	散布対象作業 ^{※4}	-	-	-	-	-	-	-	
	散布面積合計 (m2)	-	-	-	-	-	-	-	
	平均散布量 (L/m2 回) ^{※1}	-	-	-	-	-	-	-	
	連続ダストモニタの計測値 (Bq/cm3) ^{※2}	3.49E-05 (最大) ND ^{※3} (最小)	3.23E-05 (最大) ND ^{※3} (最小)	5.66E-05 (最大) ND ^{※3} (最小)	2.33E-05 (最大) ND ^{※3} (最小)	2.99E-05 (最大) ND ^{※3} (最小)	2.65E-05 (最大) ND ^{※3} (最小)	3.94E-05 (最大) ND ^{※3} (最小)	
	日	8 (日)	9 (月)	10 (火)	11 (水)	12 (木)	13 (金)	14 (土)	-
	散布対象作業 ^{※4}	-	-	-	-	-	-	-	
	散布面積合計 (m2)	-	-	-	-	-	-	-	
	平均散布量 (L/m2 回) ^{※1}	-	-	-	-	-	-	-	
	連続ダストモニタの計測値 (Bq/cm3) ^{※2}	3.40E-05 (最大) ND ^{※3} (最小)	1.94E-05 (最大) ND ^{※3} (最小)	4.09E-05 (最大) ND ^{※3} (最小)	5.95E-05 (最大) ND ^{※3} (最小)	3.50E-05 (最大) ND ^{※3} (最小)	3.39E-05 (最大) ND ^{※3} (最小)	2.51E-05 (最大) ND ^{※3} (最小)	
	日	15 (日)	16 (月)	17 (火)	18 (水)	19 (木)	20 (金)	21 (土)	-
	散布対象作業 ^{※4}	-	-	-	-	-	-	-	
	散布面積合計 (m2)	-	-	-	-	-	-	-	
	平均散布量 (L/m2 回) ^{※1}	-	-	-	-	-	-	-	
	連続ダストモニタの計測値 (Bq/cm3) ^{※2}	3.68E-05 (最大) ND ^{※3} (最小)	2.98E-05 (最大) ND ^{※3} (最小)	4.65E-05 (最大) ND ^{※3} (最小)	4.49E-05 (最大) ND ^{※3} (最小)	3.54E-05 (最大) ND ^{※3} (最小)	3.63E-05 (最大) ND ^{※3} (最小)	4.83E-05 (最大) ND ^{※3} (最小)	
	日	22 (日)	23 (月)	24 (火)	25 (水)	26 (木)	27 (金)	28 (土)	-
	散布対象作業 ^{※4}	-	-	-	-	-	-	-	
	散布面積合計 (m2)	-	-	-	-	-	-	-	
	平均散布量 (L/m2 回) ^{※1}	-	-	-	-	-	-	-	
	連続ダストモニタの計測値 (Bq/cm3) ^{※2}	3.28E-05 (最大) ND ^{※3} (最小)	3.31E-05 (最大) ND ^{※3} (最小)	2.29E-05 (最大) ND ^{※3} (最小)	- (最大) - (最小)	- (最大) - (最小)	- (最大) - (最小)	- (最大) - (最小)	
8月	日	29 (日)	30 (月)	31 (火)	1 (水)	2 (木)	3 (金)	4 (土)	-
	散布対象作業 ^{※4}	-	-	-	-	-	-	-	
	散布面積合計 (m2)	-	-	-	-	-	-	-	
	平均散布量 (L/m2 回) ^{※1}	-	-	-	-	-	-	-	
	連続ダストモニタの計測値 (Bq/cm3) ^{※2}	- (最大) - (最小)	- (最大) - (最小)	- (最大) - (最小)	- (最大) - (最小)	- (最大) - (最小)	- (最大) - (最小)	- (最大) - (最小)	

※1 平均散布量は作業前・作業後に分けて記載

※2 表記の連続ダストモニタ計測値は速報値

※3 ND=不検出

平成30年7月25日時点

※4 遮へい体設置完了に伴い定期・作業時散布は終了
