

1号機飛散防止剤散布実績及び予定 3号機オペレーティングフロアの連続ダストモニタの計測値

2018/11/29

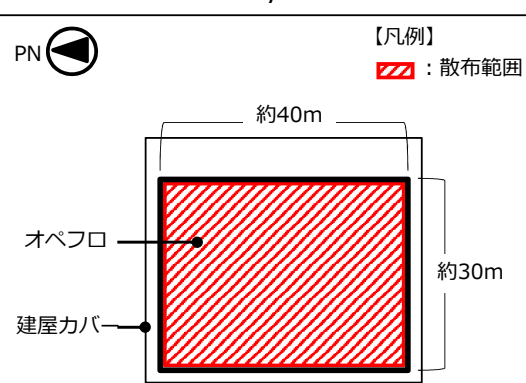
TEPCO

東京電力ホールディングス株式会社

©Tokyo Electric Power Company Holdings, Inc. All Rights Reserved. 無断複製・転載禁止 東京電力ホールディングス株式会社

1. 定期散布（1号機）

TEPCO

定期散布	
目的	オペレーティングフロア（以下、オペフロ）上へ飛散防止剤を定期的に散布し、ダストの飛散抑制効果を保持させることを目的とする。
頻度	1回/月
標準散布量	1.5L/m ² 以上
濃度	1/10
散布範囲	 <p>【凡例】 ▨ : 散布範囲</p>
散布面積	1,234m ²

©Tokyo Electric Power Company Holdings, Inc. All Rights Reserved. 無断複製・転載禁止 東京電力ホールディングス株式会社

2.作業時散布・定期散布の実績及び予定（1号機）

作業時散布			
目的	オペフロ上での（ガレキ撤去や除染等）作業に応じて、飛散防止剤を散布し、ダストの飛散を抑制することを目的とする		
標準散布量	1.5L/m ² 以上	濃度	1/10
散布対象作業	北側ガレキ撤去		
定期散布の実績及び予定			
計画（11月）	実績（11月）	計画（12月）	
完了予定日：11月19日 	完了日：11月19日 	完了予定日：12月10日 	

【凡例】 ：計画散布範囲 ：実績散布範囲

平成30年11月21日時点

©Tokyo Electric Power Company Holdings, Inc. All Rights Reserved. 無断複製・転載禁止 東京電力ホールディングス株式会社

3.作業時散布の実績及び予定（1号機）

日	当該週の散布範囲							
	21 (日)	22 (月)	23 (火)	24 (水)	25 (木)	26 (金)	27 (土)	
10月	散布対象作業	-	-	-	-	ガレキ撤去	ガレキ撤去	-
	散布面積合計 (m ²)	-	-	-	-	50	50	-
	平均散布量 L/m ² ・回	-	-	-	-	2	2	-
	連続ダストモニタの計測値 (Bq/cm ³) ^{※1}	4.24E-04 (最大) ND (最小)	4.75E-04 (最大) ND (最小)	4.72E-04 (最大) ND (最小)	4.64E-04 (最大) ND (最小)	5.14E-04 (最大) ND (最小)	5.43E-04 (最大) ND (最小)	5.72E-04 (最大) ND (最小)
10月	日	28 (日)	29 (月)	30 (火)	31 (水)	1 (木)	2 (金)	3 (土)
	散布対象作業	-	-	-	ガレキ撤去	ガレキ撤去	ガレキ撤去	ガレキ撤去
	散布面積合計 (m ²)	-	-	-	50	50	100	50
	平均散布量 L/m ² ・回	-	-	-	2	2	4	2
連続ダストモニタの計測値 (Bq/cm ³) ^{※1}	5.67E-04 (最大) ND (最小)	6.46E-04 (最大) ND (最小)	6.19E-04 (最大) ND (最小)	6.07E-04 (最大) ND (最小)	6.48E-04 (最大) ND (最小)	5.47E-04 (最大) ND (最小)	5.57E-04 (最大) ND (最小)	
10月	日	4 (日)	5 (月)	6 (火)	7 (水)	8 (木)	9 (金)	10 (土)
	散布対象作業	-	ガレキ撤去	ガレキ撤去	ガレキ撤去	ガレキ撤去	-	-
	散布面積合計 (m ²)	-	50	50	50	50	-	-
	平均散布量 L/m ² ・回	-	2	2	2	2	-	-
連続ダストモニタの計測値 (Bq/cm ³) ^{※1}	6.09E-04 (最大) ND (最小)	6.10E-04 (最大) ND (最小)	7.22E-04 (最大) ND (最小)	6.23E-04 (最大) ND (最小)	6.60E-04 (最大) ND (最小)	1.53E-04 (最大) ND (最小)	1.34E-04 (最大) ND (最小)	
11月	日	11 (日)	12 (月)	13 (火)	14 (水)	15 (木)	16 (金)	17 (土)
	散布対象作業	-	-	-	ガレキ撤去	-	ガレキ撤去	-
	散布面積合計 (m ²)	-	-	-	50	-	50	-
	平均散布量 L/m ² ・回	-	-	-	2	-	2	-
連続ダストモニタの計測値 (Bq/cm ³) ^{※1}	1.33E-04 (最大) ND (最小)	1.17E-04 (最大) ND (最小)	2.31E-04 (最大) ND (最小)	1.37E-04 (最大) ND (最小)	7.91E-05 (最大) ND (最小)	1.25E-04 (最大) ND (最小)	1.33E-04 (最大) ND (最小)	
11月	日	18 (日)	19 (月)	20 (火)	21 (水)	22 (木)	23 (金)	24 (土)
	散布対象作業	-	ガレキ撤去	ガレキ撤去	ガレキ撤去	ガレキ撤去	ガレキ撤去	-
	散布面積合計 (m ²)	-	(定期散布実施)	50	50	50	30	-
	平均散布量 L/m ² ・回	-	(定期散布実施)	2	2	2	1.7	-
連続ダストモニタの計測値 (Bq/cm ³) ^{※1}	1.62E-04 (最大) ND (最小)	1.79E-04 (最大) ND (最小)	7.79E-05 (最大) ND (最小)	1.79E-04 (最大) ND (最小)	1.16E-04 (最大) ND (最小)	1.45E-04 (最大) ND (最小)	2.18E-04 (最大) ND (最小)	
11月	日	25 (日)	26 (月)	27 (火)	28 (水)	29 (木)	30 (金)	1 (土)
	散布対象作業	-	ガレキ撤去	ガレキ撤去	-	-	-	-
	散布面積合計 (m ²)	-	50	50	-	-	-	-
	平均散布量 L/m ² ・回	-	2	2	-	-	-	-
連続ダストモニタの計測値 (Bq/cm ³) ^{※1}	1.13E-04 (最大) ND (最小)	1.26E-04 (最大) ND (最小)	9.92E-05 (最大) ND (最小)	- (最大) - (最小)	- (最大) - (最小)	- (最大) - (最小)	- (最大) - (最小)	

※ 表記の連続ダストモニタ計測値は速報値、ND=不検出

平成30年11月28日時点

©Tokyo Electric Power Company Holdings, Inc. All Rights Reserved. 無断複製・転載禁止 東京電力ホールディングス株式会社

4.オペレーティングフロアの連続ダストモニタの計測値（3号機）



								当該週の散布範囲
日	21 (日)	22 (月)	23 (火)	24 (水)	25 (木)	26 (金)	27 (土)	
10月	散布対象作業 ^{※4}	-	-	-	-	-	-	-
	散布面積合計 (m ²)	-	-	-	-	-	-	-
	平均散布量 (L/m ² ・回) ^{※1}	-	-	-	-	-	-	-
	連続ダストモニタの計測値 (Bq/cm ³) ^{※2}	2.45E-05 (最大) ND ^{※3} (最小)	4.03E-05 (最大) ND ^{※3} (最小)	2.54E-05 (最大) ND ^{※3} (最小)	3.05E-05 (最大) ND ^{※3} (最小)	4.24E-05 (最大) ND ^{※3} (最小)	4.04E-05 (最大) ND ^{※3} (最小)	3.24E-05 (最大) ND ^{※3} (最小)
日	28 (日)	29 (月)	30 (火)	31 (水)	1 (木)	2 (金)	3 (土)	
散布対象作業 ^{※4}	-	-	-	-	-	-	-	-
散布面積合計 (m ²)	-	-	-	-	-	-	-	-
平均散布量 (L/m ² ・回) ^{※1}	-	-	-	-	-	-	-	-
連続ダストモニタの計測値 (Bq/cm ³) ^{※2}	3.74E-05 (最大) ND ^{※3} (最小)	3.01E-05 (最大) ND ^{※3} (最小)	3.28E-05 (最大) ND ^{※3} (最小)	3.18E-05 (最大) ND ^{※3} (最小)	2.95E-05 (最大) ND ^{※3} (最小)	3.52E-05 (最大) ND ^{※3} (最小)	2.66E-05 (最大) ND ^{※3} (最小)	-
日	4 (日)	5 (月)	6 (火)	7 (水)	8 (木)	9 (金)	10 (土)	
散布対象作業 ^{※4}	-	-	-	-	-	-	-	-
散布面積合計 (m ²)	-	-	-	-	-	-	-	-
平均散布量 (L/m ² ・回) ^{※1}	-	-	-	-	-	-	-	-
連続ダストモニタの計測値 (Bq/cm ³) ^{※2}	3.86E-05 (最大) ND ^{※3} (最小)	3.32E-05 (最大) ND ^{※3} (最小)	3.83E-05 (最大) ND ^{※3} (最小)	3.44E-05 (最大) ND ^{※3} (最小)	2.17E-05 (最大) ND ^{※3} (最小)	3.92E-05 (最大) ND ^{※3} (最小)	2.88E-05 (最大) ND ^{※3} (最小)	-
日	11 (日)	12 (月)	13 (火)	14 (水)	15 (木)	16 (金)	17 (土)	
散布対象作業 ^{※4}	-	-	-	-	-	-	-	-
散布面積合計 (m ²)	-	-	-	-	-	-	-	-
平均散布量 (L/m ² ・回) ^{※1}	-	-	-	-	-	-	-	-
連続ダストモニタの計測値 (Bq/cm ³) ^{※2}	4.16E-05 (最大) ND ^{※3} (最小)	3.88E-05 (最大) ND ^{※3} (最小)	3.26E-05 (最大) ND ^{※3} (最小)	3.52E-05 (最大) ND ^{※3} (最小)	3.65E-05 (最大) ND ^{※3} (最小)	6.22E-05 (最大) ND ^{※3} (最小)	3.11E-05 (最大) ND ^{※3} (最小)	-
日	18 (日)	19 (月)	20 (火)	21 (水)	22 (木)	23 (金)	24 (土)	
散布対象作業 ^{※4}	-	-	-	-	-	-	-	-
散布面積合計 (m ²)	-	-	-	-	-	-	-	-
平均散布量 (L/m ² ・回) ^{※1}	-	-	-	-	-	-	-	-
連続ダストモニタの計測値 (Bq/cm ³) ^{※2}	2.76E-05 (最大) ND ^{※3} (最小)	3.81E-05 (最大) ND ^{※3} (最小)	3.18E-05 (最大) ND ^{※3} (最小)	2.70E-05 (最大) ND ^{※3} (最小)	3.25E-05 (最大) ND ^{※3} (最小)	2.84E-05 (最大) ND ^{※3} (最小)	3.35E-05 (最大) ND ^{※3} (最小)	-
日	25 (日)	26 (月)	27 (火)	28 (水)	29 (木)	30 (金)	1 (土)	
散布対象作業 ^{※4}	-	-	-	-	-	-	-	-
散布面積合計 (m ²)	-	-	-	-	-	-	-	-
平均散布量 (L/m ² ・回) ^{※1}	-	-	-	-	-	-	-	-
連続ダストモニタの計測値 (Bq/cm ³) ^{※2}	3.16E-05 (最大) ND ^{※3} (最小)	3.48E-05 (最大) ND ^{※3} (最小)	3.88E-05 (最大) ND ^{※3} (最小)	- (最大) - (最小)	- (最大) - (最小)	- (最大) - (最小)	- (最大) - (最小)	-

※1 平均散布量は作業前、作業後に分けて記載

※2 表記の連続ダストモニタ計測値は速報値

※3 ND=不検出

平成30年11月28日時点

※4 遍へい体設置完了に伴い定期・作業時散布は終了
