

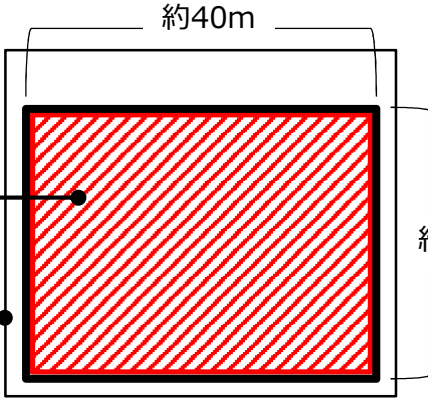
1号機飛散防止剤散布実績及び予定 3号機オペレーティングフロアの連続ダストモニタの計測値

2020/7/2

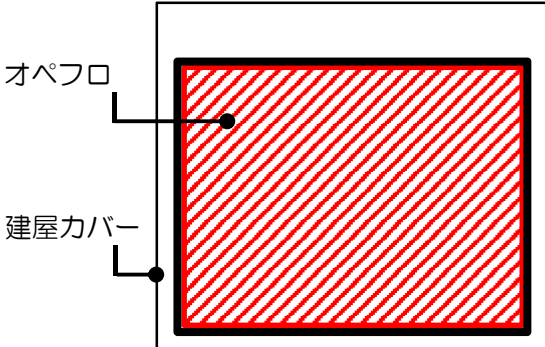
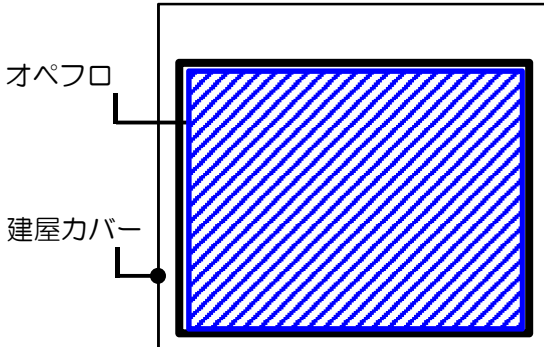
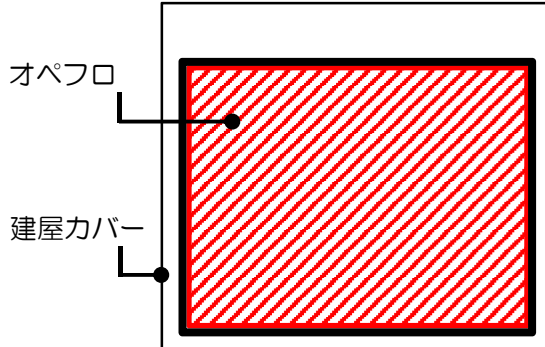


東京電力ホールディングス株式会社

1.定期散布（1号機）

定期散布	
目 的	オペレーティングフロア（以下、オペフロ）上へ飛散防止剤を定期的に散布し、ダストの飛散抑制効果を保持させることを目的とする。
頻 度	1回/月
標準散布量	1.5L/m ² 以上
濃 度	1/10
散布範囲	PN  【凡例】 ：散布範囲 約40m 約30m オペフロ 建屋カバー 
散布面積	1,234m ²


2.作業時散布・定期散布の実績及び予定（1号機）

作業時散布			
目 的	オペフロ上での（ガレキ撤去や除染等）作業に応じて、飛散防止剤を散布し、ダストの飛散を抑制することを目的とする		
標準散布量	1.5L/m ² 以上	濃 度	1/10
散布対象 作業	北側ガレキ撤去		
定期散布の実績及び予定			
計 画（6月）	実 績（6月）	計 画（7月）	
完了予定日：6月24・25日  	完了日：6月24・25日  	完了予定日：7月2・3日  	

【凡例】 ：計画散布範囲 ：実績散布範囲

2020年7月2日時点

3.作業時散布の実績及び予定（1号機）

									当該週の散布範囲
5月	月	24 (日)	25 (月)	26 (火)	27 (水)	28 (木)	29 (金)	30 (土)	
	散布対象作業	—	—	—	—	—	—	—	
	散布面積合計 (m2)	—	—	—	—	—	—	—	
	平均散布量 (L/m2・回)	—	—	—	—	—	—	—	
	連続ダストモニタの計測値 (Bq/cm3) ※1	3.33E-04 (最大) ND (最小)	1.82E-04 (最大) ND (最小)	1.77E-04 (最大) ND (最小)	1.46E-04 (最大) ND (最小)	2.11E-04 (最大) ND (最小)	2.06E-04 (最大) ND (最小)	3.14E-04 (最大) ND (最小)	
6月	月	31 (日)	1 (月)	2 (火)	3 (水)	4 (木)	5 (金)	6 (土)	
	散布対象作業	—	—	—	—	—	—	—	
	散布面積合計 (m2)	—	—	—	—	—	—	—	
	平均散布量 (L/m2・回)	—	—	—	—	—	—	—	
	連続ダストモニタの計測値 (Bq/cm3) ※1	2.46E-04 (最大) ND (最小)	1.29E-04 (最大) ND (最小)	2.25E-04 (最大) ND (最小)	1.79E-04 (最大) ND (最小)	1.81E-04 (最大) ND (最小)	2.72E-04 (最大) ND (最小)	1.74E-04 (最大) ND (最小)	
	月	7 (日)	8 (月)	9 (火)	10 (水)	11 (木)	12 (金)	13 (土)	
	散布対象作業	—	—	—	—	—	—	—	
	散布面積合計 (m2)	—	—	—	—	—	—	—	
	平均散布量 (L/m2・回)	—	—	—	—	—	—	—	
	連続ダストモニタの計測値 (Bq/cm3) ※1	2.48E-04 (最大) ND (最小)	1.42E-04 (最大) ND (最小)	1.47E-04 (最大) ND (最小)	1.42E-04 (最大) ND (最小)	1.83E-04 (最大) ND (最小)	9.90E-05 (最大) ND (最小)	1.33E-04 (最大) ND (最小)	
	月	14 (日)	15 (月)	16 (火)	17 (水)	18 (木)	19 (金)	20 (土)	
	散布対象作業	—	—	—	—	—	—	—	
	散布面積合計 (m2)	—	—	—	—	—	—	—	
	平均散布量 (L/m2・回)	—	—	—	—	—	—	—	
	連続ダストモニタの計測値 (Bq/cm3) ※1	1.76E-04 (最大) ND (最小)	1.30E-04 (最大) ND (最小)	1.35E-04 (最大) ND (最小)	1.38E-04 (最大) ND (最小)	1.23E-04 (最大) ND (最小)	2.70E-04 (最大) ND (最小)	1.57E-04 (最大) ND (最小)	
	月	21 (日)	22 (月)	23 (火)	24 (水)	25 (木)	26 (金)	27 (土)	
	散布対象作業	—	—	—	—	—	—	—	
	散布面積合計 (m2)	—	—	—	(定期散布実施)	(定期散布実施)	—	—	
	平均散布量 (L/m2・回)	—	—	—	(定期散布実施)	(定期散布実施)	—	—	
	連続ダストモニタの計測値 (Bq/cm3) ※1	1.38E-04 (最大) ND (最小)	2.10E-04 (最大) ND (最小)	1.62E-04 (最大) ND (最小)	8.47E-05 (最大) ND (最小)	2.12E-04 (最大) ND (最小)	1.35E-04 (最大) ND (最小)	1.02E-04 (最大) ND (最小)	
	月	28 (日)	29 (月)	30 (火)	1 (水)	2 (木)	3 (金)	4 (土)	
	散布対象作業	—	—	—	—	—	—	—	
	散布面積合計 (m2)	—	—	—	—	—	—	—	
	平均散布量 (L/m2・回)	—	—	—	—	—	—	—	
	連続ダストモニタの計測値 (Bq/cm3) ※1	1.33E-04 (最大) ND (最小)	1.57E-04 (最大) ND (最小)	1.02E-04 (最大) ND (最小)	(最大) (最小)	(最大) (最小)	(最大) (最小)	(最大) (最小)	

※1 表記の連続ダストモニタ計測値は速報値、ND=不検出

2020年6月30日時点

4.オペレーティングフロアの連続ダストモニタの計測値（3号機）



								当該週の散布範囲
5月	日	24 (日)	25 (月)	26 (火)	27 (水)	28 (木)	29 (金)	30 (土)
	散布対象作業 ^{※4}	—	—	—	—	—	—	—
	散布面積合計 (m2)	—	—	—	—	—	—	—
	平均散布量 (L/m2・回) ^{※1}	—	—	—	—	—	—	—
	連続ダストモニタの計測値 (Bq/cm3) ^{※2}	4.99E-05 (最大) ND ^{※3} (最小)	4.64E-05 (最大) ND ^{※3} (最小)	5.53E-05 (最大) ND ^{※3} (最小)	5.73E-05 (最大) ND ^{※3} (最小)	3.97E-05 (最大) ND ^{※3} (最小)	3.77E-05 (最大) ND ^{※3} (最小)	5.61E-05 (最大) ND ^{※3} (最小)
6月	日	31 (日)	1 (月)	2 (火)	3 (水)	4 (木)	5 (金)	6 (土)
	散布対象作業 ^{※4}	—	—	—	—	—	—	—
	散布面積合計 (m2)	—	—	—	—	—	—	—
	平均散布量 (L/m2・回) ^{※1}	—	—	—	—	—	—	—
	連続ダストモニタの計測値 (Bq/cm3) ^{※2}	3.96E-05 (最大) ND ^{※3} (最小)	4.31E-05 (最大) ND ^{※3} (最小)	4.10E-05 (最大) ND ^{※3} (最小)	5.40E-05 (最大) ND ^{※3} (最小)	4.20E-05 (最大) ND ^{※3} (最小)	5.69E-05 (最大) ND ^{※3} (最小)	4.47E-05 (最大) ND ^{※3} (最小)
	日	7 (日)	8 (月)	9 (火)	10 (水)	11 (木)	12 (金)	13 (土)
	散布対象作業 ^{※4}	—	—	—	—	—	—	—
	散布面積合計 (m2)	—	—	—	—	—	—	—
	平均散布量 (L/m2・回) ^{※1}	—	—	—	—	—	—	—
	連続ダストモニタの計測値 (Bq/cm3) ^{※2}	4.37E-05 (最大) ND ^{※3} (最小)	4.14E-05 (最大) ND ^{※3} (最小)	5.42E-05 (最大) ND ^{※3} (最小)	3.40E-05 (最大) ND ^{※3} (最小)	5.99E-05 (最大) ND ^{※3} (最小)	5.25E-05 (最大) ND ^{※3} (最小)	4.00E-05 (最大) ND ^{※3} (最小)
	日	14 (日)	15 (月)	16 (火)	17 (水)	18 (木)	19 (金)	20 (土)
	散布対象作業 ^{※4}	—	—	—	—	—	—	—
	散布面積合計 (m2)	—	—	—	—	—	—	—
	平均散布量 (L/m2・回) ^{※1}	—	—	—	—	—	—	—
	連続ダストモニタの計測値 (Bq/cm3) ^{※2}	4.84E-05 (最大) ND ^{※3} (最小)	3.37E-05 (最大) ND ^{※3} (最小)	3.42E-05 (最大) ND ^{※3} (最小)	4.96E-05 (最大) ND ^{※3} (最小)	3.67E-05 (最大) ND ^{※3} (最小)	4.74E-05 (最大) ND ^{※3} (最小)	4.16E-05 (最大) ND ^{※3} (最小)
	日	21 (日)	22 (月)	23 (火)	24 (水)	25 (木)	26 (金)	27 (土)
	散布対象作業 ^{※4}	—	—	—	—	—	—	—
	散布面積合計 (m2)	—	—	—	—	—	—	—
	平均散布量 (L/m2・回) ^{※1}	—	—	—	—	—	—	—
	連続ダストモニタの計測値 (Bq/cm3) ^{※2}	3.28E-05 (最大) ND ^{※3} (最小)	3.20E-05 (最大) ND ^{※3} (最小)	— (最大) — (最小)	— (最大) — (最小)	— (最大) — (最小)	— (最大) — (最小)	— (最大) — (最小)

※1 平均散布量は作業前、作業後に分けて記載

※2 表記の連続ダストモニタ計測値は速報値

※3 ND=不検出

2020年6月23日時点

※4 遮へい体設置完了に伴い定期・作業時散布は終了
