

# 1号機原子炉建屋カバー(残置部)解体の開始について

2020年12月24日



**TEPCO**

---

東京電力ホールディングス株式会社

# 1. 建屋カバー(残置部)解体

- 大型カバーを原子炉建屋に設置するため、干渉する建屋カバー(残置部)の解体を2020年12月19日より開始。
- 防風フェンス取り外し作業に伴う、オペフロの放射性物質濃度に有意な変化は無し。

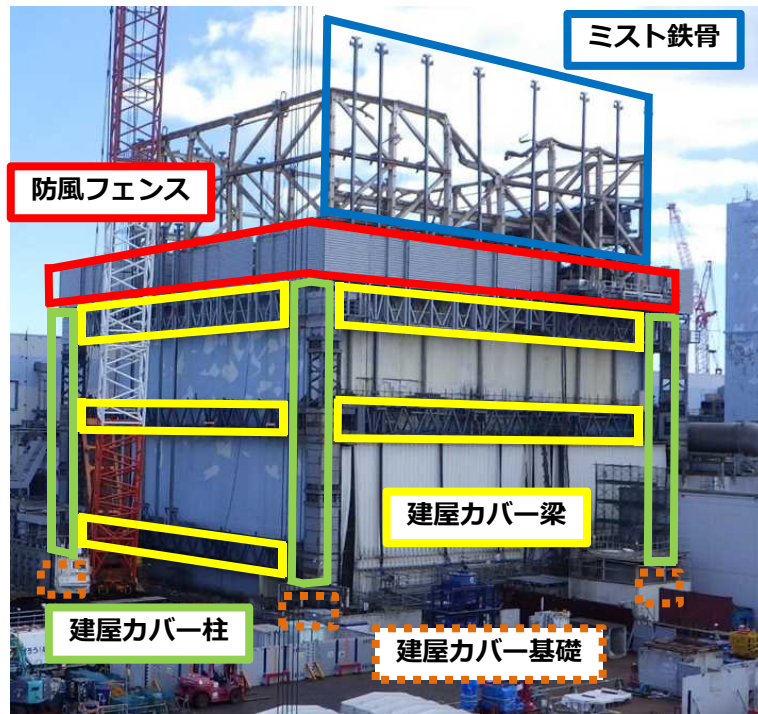


1号機原子炉建屋全景 (2020年3月時点)



防風フェンス取り外し状況 (2020年12月19日時点)

## 2. スケジュール

- 建屋カバー(残置部)解体は、2020年12月19日に開始し、2021年6月に完了予定。
- その後、2021年度上期より大型カバー設置工事に着手予定。

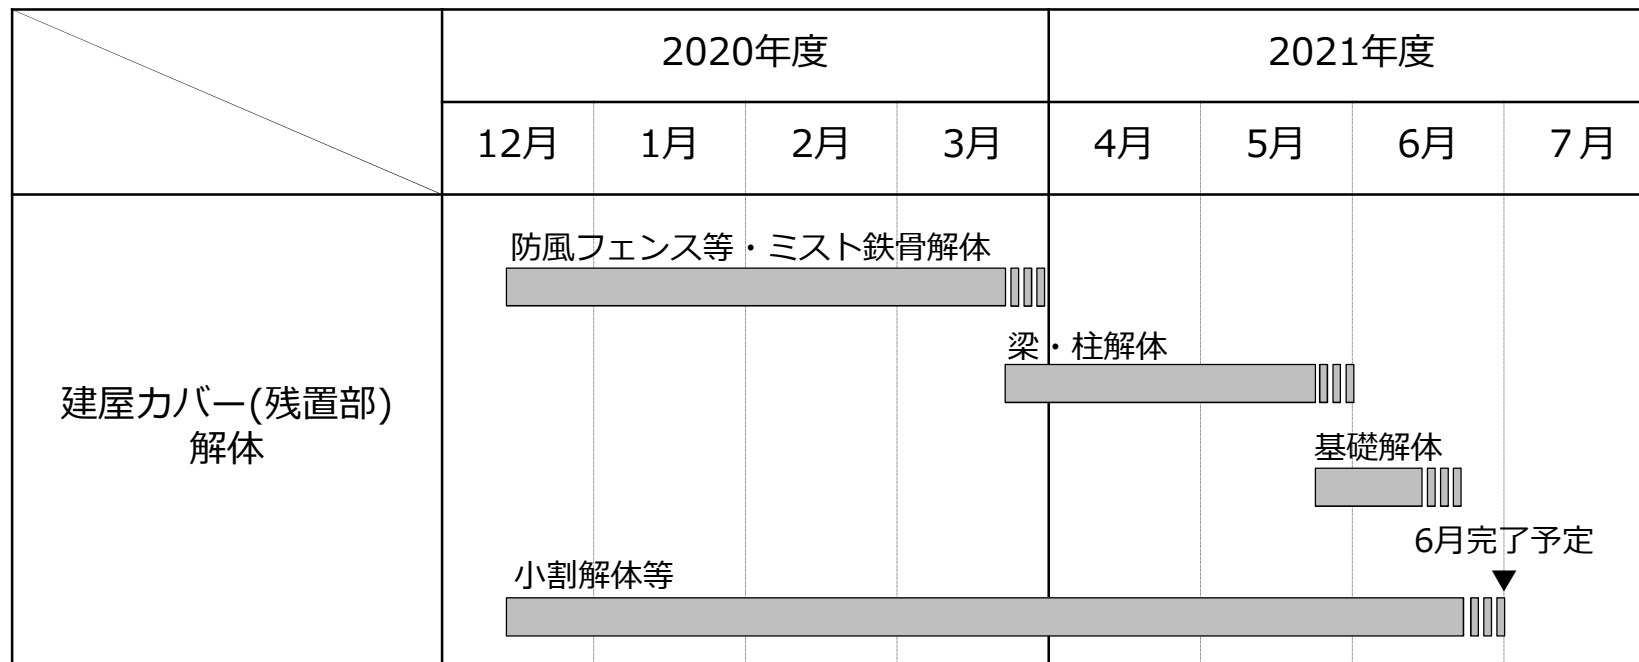

※上記スケジュールは工事進捗等により変更となる可能性がある
