

# 1号機原子炉建屋 建屋カバー（残置部）解体の状況について

2021年4月27日

---



**TEPCO**

東京電力ホールディングス株式会社

# 建屋カバー(残置部)解体の状況

- 大型カバーを原子炉建屋に設置するため、干渉する建屋カバー(残置部)の解体を2020年12月19日より開始。
- 4月下旬時点で梁・柱(上段部)を解体中。
- 4月下旬時点で大型カバー設置へ向けた仮設構台の組立て作業等を構外ヤードで実施中。

## 現時点

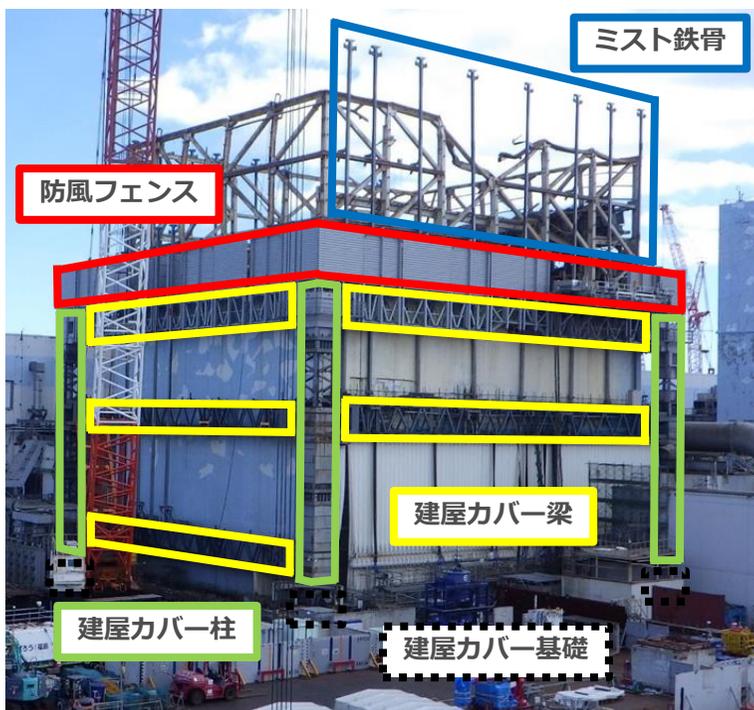

1号機原子炉建屋全景 (2020年3月時点)



1号機原子炉建屋全景 (2021年4月22日時点)

# スケジュール

- 現在、建屋カバー（残置部）の解体を進めており、その後、2021年度上期より大型カバー設置工事に着手する予定である。

	2020年度			2021年度						2022年度	2023年度	2024年度
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	下期		
中長期RM マイルストーン												2023年度頃 大型カバー設置完了
建屋カバー(残置部) 解体	防風フェンス等・ミスト鉄骨解体			梁・柱解体								
	小割解体等			基礎解体								
大型カバー設置	作業ヤード整備, 構外ヤード地組等			大型カバー設置工事 (準備作業等含む)								
				大型カバー付帯設備設置								
許認可				実施計画変更申請 (大型カバー)								
				実施計画変更申請 (付帯設備)								

※周辺工事との調整や現場状況等を踏まえて、工程は変更となる可能性がある
