

燃料デブリ取り出し準備

燃料デブリ取り出し準備 スケジュール

野 名	鹿 炉中長期実行プラン2024 目標工程	括り	作業内容	これまで1ヶ月の動きと今後6ヶ月の予定	2月							3月					4月			5月			6月			7月			8月			9月以降	備 考	
					23	24	25	26	27	28	1	2	9	16	23	30	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下			
			3号 (実 績) (予 定)	現場作業																														
					P/V／P/C/V健全性維持	圧力容器/格納容器の健全性維持	(実 績) ○腐食抑制対策 ・窒素ハブリングによる原子炉冷却水中の溶存酸素低減実施（継続）	検討・設計																										
							(予 定) ○腐食抑制対策 ・窒素ハブリングによる原子炉冷却水中の溶存酸素低減実施（継続）		現場作業	腐食抑制対策（窒素ハブリングによる原子炉冷却水中の溶存酸素低減）																								(継続実施)
			炉心状況把握	炉心状況把握	(実 績) ○事故関連factデータベースの更新（継続） ○炉内・格納容器内の状態に関する推定の更新（継続）	検討・設計	事故関連factデータベースの更新																											(継続実施)
					(予 定) ○事故関連factデータベースの更新（継続） ○炉内・格納容器内の状態に関する推定の更新（継続）		炉内・格納容器内の状態に関する推定の更新																										(継続実施)	
					(実 績) ○2号機燃料取扱機操作室調査の実施 ○2号機原子炉建屋内調査（地下階三角コーナの状況確認） ○3号機原子炉建屋内調査の実施	現場作業																												
(予 定)																																		
燃料デブリ取り出し準備	●燃料デブリの処理・処分方法の決定に向けた取り組み	取出後の処理料・デブリ 분리安定保管	燃料デブリ性状把握	(実 績) ○【研究開発】燃料デブリ性状把握のための分析・推定技術の開発 ・燃料デブリ性状の分析に必要な技術開発等（継続）	検討・設計	【研究開発】燃料デブリの性状把握のための分析・推定技術の開発 ・燃料デブリ性状の分析に必要な技術開発等																											(継続実施)	事業名称：燃料デブリの性状把握のための分析・推定技術の開発 期間：2025年度～2026年度
				(予 定) ○【研究開発】燃料デブリ性状把握のための分析・推定技術の開発 ・燃料デブリ性状の分析に必要な技術開発等（継続）																														
				現場作業																														
		燃料デブリ臨界管理技術の開発	燃料デブリ臨界管理技術の開発	(実 績) ○【研究開発】臨界管理方法の確立に関する技術開発 ・未臨界度測定・臨界近接監視のための技術開発（継続） ・臨界防止技術の開発（継続）	検討・設計																													
				(予 定) ○【研究開発】臨界管理方法の確立に関する技術開発 ・未臨界度測定・臨界近接監視のための技術開発（継続） ・臨界防止技術の開発（継続）		現場作業																												
				●段階的な取り出し規模の拡大（2号機）	燃料デブリ収納・移送・保管技術の開発	燃料デブリ収納・移送・保管技術の開発	(実 績) ○【研究開発】燃料デブリ収納・移送・保管技術の開発 粉状、スラリー・スラッジ状の燃料デブリ対応（継続） 燃料デブリ乾燥技術/システムの開発（完了）	検討・設計	【研究開発】粉状、スラリー・スラッジ状の燃料デブリ対応（粉状及びスラリー・スラッジの分析等）																									
(予 定) ○【研究開発】燃料デブリ収納・移送・保管技術の開発 粉状、スラリー・スラッジ状の燃料デブリ対応（継続）	現場作業																																	

凡 例

： 検討業務・設計業務・準備作業


： 現場作業予定

： 機器の運転継続のみで、現場作業（工事）がない場合

： 記載以降も作業や検討が継続する場合は、端を矢印で記載

： 工程調整中のもの

廃炉中長期実行プラン2024

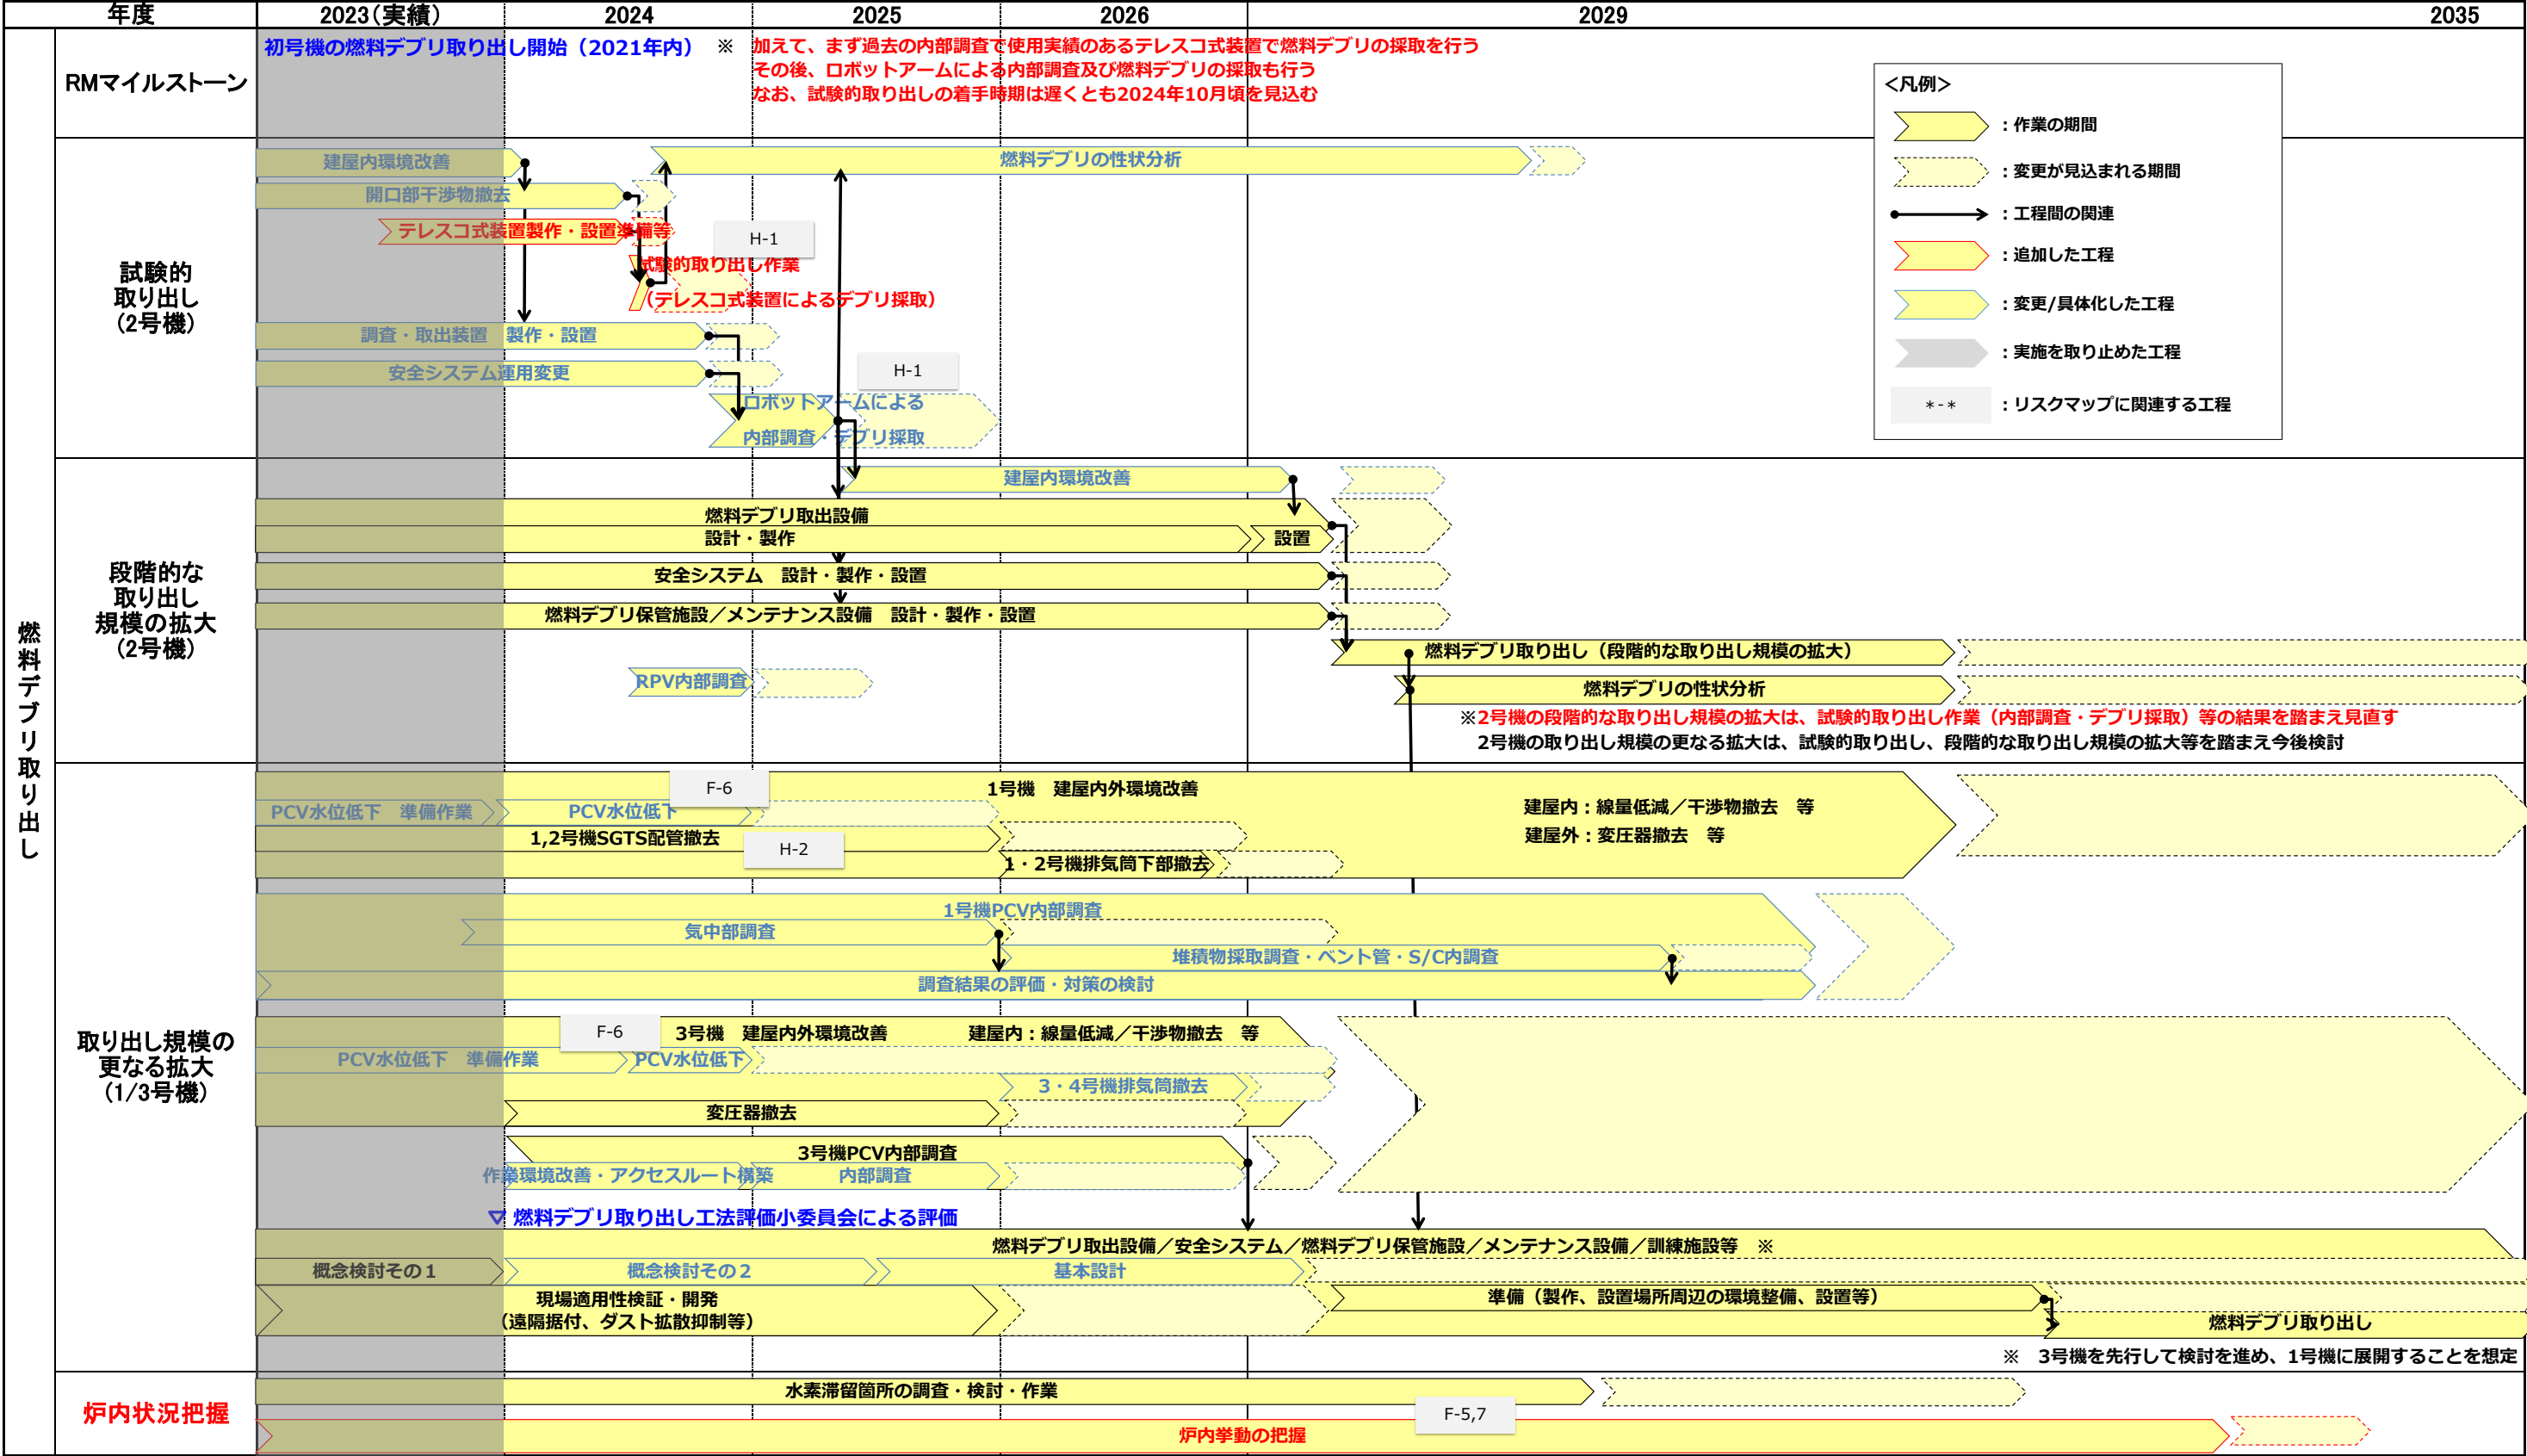

注：今後の検討に応じて、記載内容には変更があり得る
