

福島第一原子力発電所第4号機 燃料取扱機の上架作業の完了について

東京電力株式会社

平成25年7月25日



東京電力

1

作業実績及び予定

【作業実績】

- ・ 2013年5月29日 燃料取り出し用カバー鉄骨建方完了
- ・ 2013年6月7日～14日 天井クレーン部材の上架作業完了
- ・ 2013年7月10日～13日 燃料取扱機の上架作業完了

【今後の予定】

- ・ 2013年10月頃まで組立・試験を実施予定

状況写真①

①燃料取扱機 部材上架準備



(撮影日：2013年7月10日)

状況写真②


②燃料取扱機 部材吊り上げ



(撮影日：2013年7月10日)

状況写真③

③燃料取扱機 部材上架終了

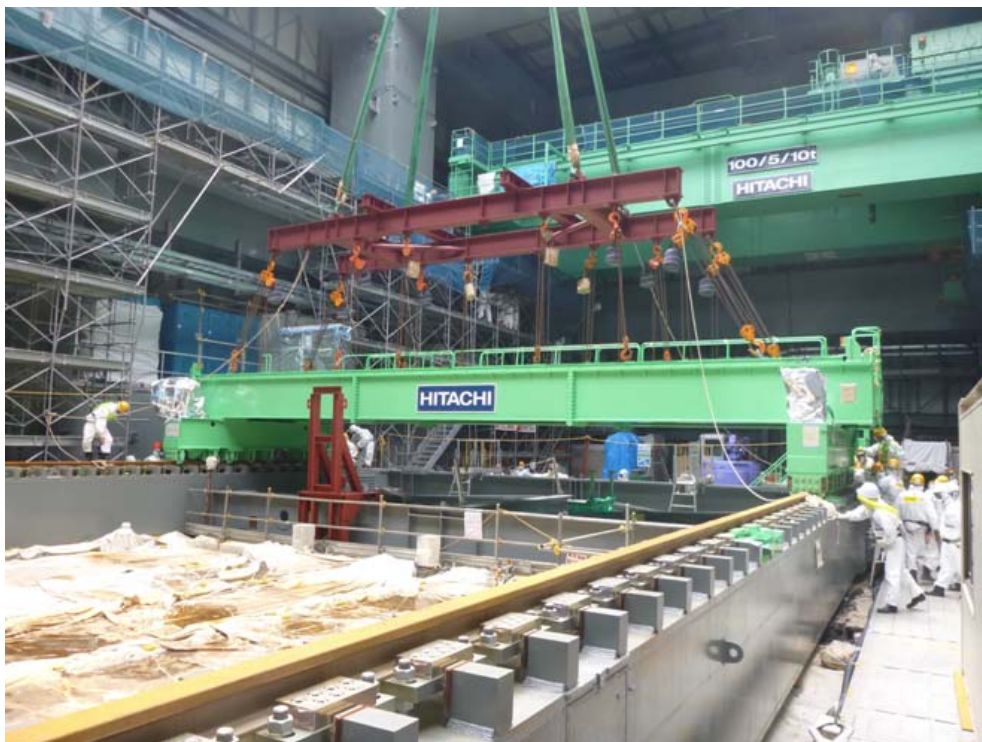

(撮影日：2013年7月10日)
