


# 平成28年熊本地震における 一般ガス事業者の対応状況

平成28年4月26日

一般社団法人 日本ガス協会

# 震度 5 弱以上のガス事業者(4月16日1時25分)

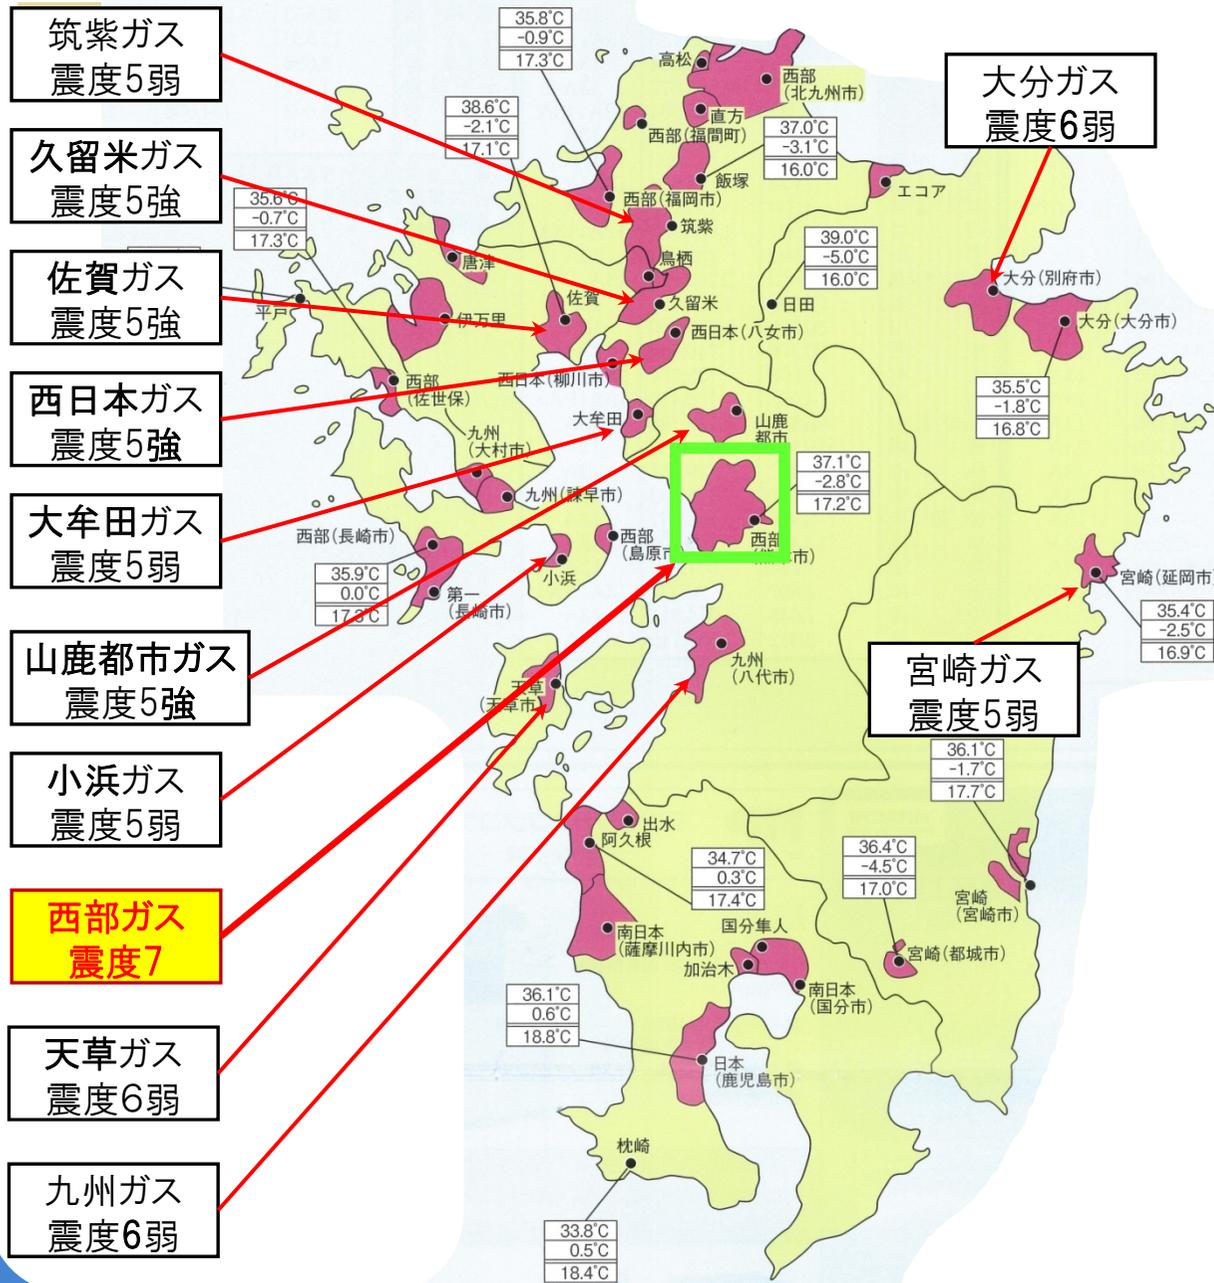

事業者	需要家数 (戸)	供給停止数 (戸)
筑紫ガス	39,763	なし
久留米ガス	30,423	なし
佐賀ガス	21,611	なし
西日本ガス	4,332	なし
大牟田ガス	12,456	なし
山鹿都市ガス	3,145	なし
小浜ガス	1,030	なし
西部ガス	1,107,962	約105,000 (低圧・中圧B)
天草ガス	4,773	なし
九州ガス	48,998	なし
大分ガス	74,285	なし
宮崎ガス	81,893	なし



# 初動対応状況

4月14日	
21時26分	熊本県熊本地方で震度7の地震発生
22時25分	日本ガス協会に対策本部を設置 西部ガスより一部地域で供給停止の連絡
23時30分	日本ガス協会から技術調査隊の派遣を決定
4月16日	
1時25分	熊本県熊本地方で震度7の地震発生(本震)
3時10分	西部ガスより約105,000戸供給停止の連絡 救援要請により日本ガス協会救援体制に変更
3時21分	日本ガス協会の各地方部会へ復旧応援隊の派遣要請
4月17日	
	中圧ガス導管の健全性確認作業開始 低圧ガス導管の健全性確認作業開始
4月19日	
	中圧ガス導管の健全性確認作業完了
4月20日	
	全中圧施設の復旧完了(供給再開日調整中の施設を除く) 低圧開栓作業開始

# 復旧作業状況

## (1) 復旧の体制

	4/25(月)
西部ガス復旧隊	1,965名
日本ガス協会復旧応援隊	2,676名
合計	4,641名

## (2) 中圧の復旧状況

中圧ラインの先行復旧を受け、中圧を供給するお客さまを先行して復旧。お客さま都合により供給再開日を調整中の施設を除き、4月20日をもって全施設復旧済み。

4月16日	済生会熊本病院、熊本大学医学部附属病院
17日	熊本赤十字病院、国立病院機構熊本医療センター、など6施設
18日	熊本県庁舎、熊本市庁舎、熊本市総合体育館、など24施設
19日	熊本地方合同庁舎、熊本県立総合体育館、など9施設
20日	K社、M社
21日	H社、Kホテル(供給再開日調整分)
22日	J社、K社(供給再開日調整分)

## (3) 低圧の復旧状況(4月25日18:00現在)

- 復旧対象件数 : 100,884戸
- 復旧済件数(累計) : 45,299戸
- 復旧率 : 44.9%

**以上**

平成28年4月26日

一般社団法人 日本ガス協会
