

サブドレン他強化対策

4m盤流入対策

(4m盤、7.5m盤、10m盤のフェーシング実施状況)

2017年3月30日



東京電力ホールディングス株式会社

©Tokyo Electric Power Company Holdings, Inc. All Rights Reserved. 無断複製・転載禁止 東京電力ホールディングス株式会社


0

1. 10m盤・7.5m盤・4m盤 フェーシングの実施状況



- ・フェーシング : 地表面をコンクリートやアスファルトで覆う。
- ・カバー : 仮設屋根を設置する。
- ・シート : 仮設シートを設置する。

・フェーシング状況	・カバー掛け状況	・シート掛け状況	・その他
: 施工済み (2017.3末)	: 施工済み (2017.3末)	: 施工済み (2017.3末)	: 2018年度以降着手予定
: 2017年度実施予定	: 2017年度実施予定	: 2017年度実施予定 →2017年度法面補修、フェーシング予定	

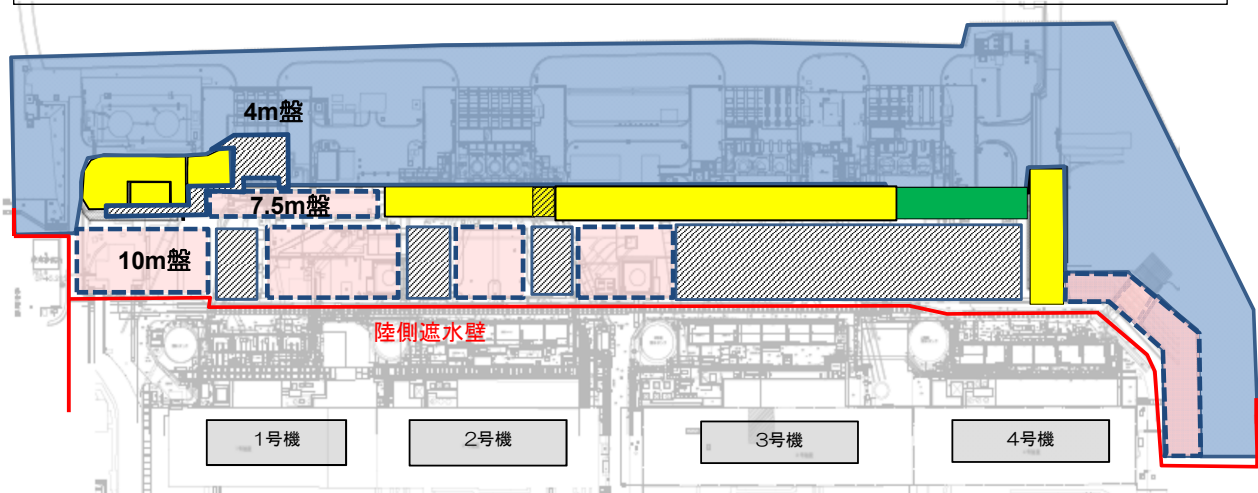

©Tokyo Electric Power Company Holdings, Inc. All Rights Reserved. 無断複製・転載禁止 東京電力ホールディングス株式会社

1

■工事の進捗状況：カバー設置

2017.2.7撮影



サブドレン移送ポンプ建屋周辺



中央法面



放水口周辺

1～4号機 海側フェーシング概要（2017年度末目標）

(㎡)

	全体面積	2017年3月 未施工済み	2017年度 工事予定	2017年度末 目標	2017年度末 割合 (%)
全エリア	65,000	42,130	7,790	49,920	77%
4m盤	40,000	39,000	1,000	40,000	100%
7.5m盤	5,000	3,130	70	3,200	64%
10m盤	20,000	0	6,720	6,720	34%
