

1号機飛散防止剤散布実績及び予定

3号機オペレーティングフロアの連続ダストモニタの計測値

2018年2月1日

TEPCO

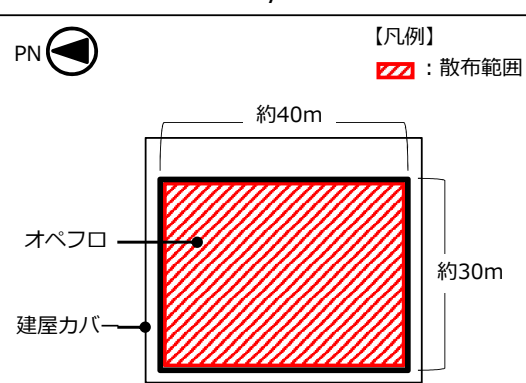
東京電力ホールディングス株式会社

©Tokyo Electric Power Company Holdings, Inc. All Rights Reserved.

無断複製・転載禁止 東京電力ホールディングス株式会社

1.定期散布（1号機）

TEPCO

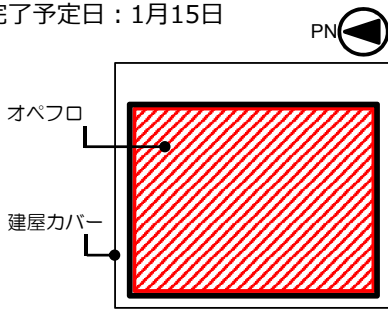
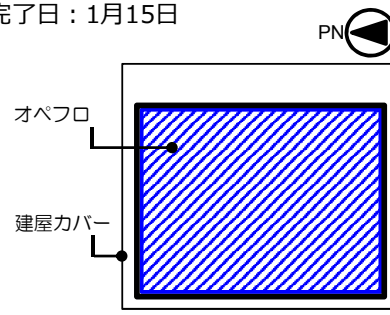
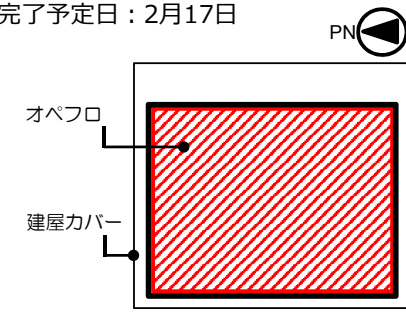
定期散布	
目 的	オペレーティングフロア（以下、オペフロ）上へ飛散防止剤を定期的に散布し、ダストの飛散抑制効果を保持させることを目的とする。
頻 度	1回/月
標準散布量	1.5L/m ² 以上
濃 度	1/10
散布範囲	
散布面積	1,234m ²

©Tokyo Electric Power Company Holdings, Inc. All Rights Reserved.

無断複製・転載禁止 東京電力ホールディングス株式会社

2.作業時散布・定期散布の実績及び予定（1号機）

TEPCO

作業時散布			
目 的	オペフロ上での（ガレキ撤去や除染等）作業に応じて、飛散防止剤を散布し、ダストの飛散を抑制することを目的とする		
標準散布量	1.5L/m ² 以上	濃 度	1/10
散布対象作業	北側ガレキ撤去		
定期散布の実績及び予定			
計 画（1月）	実 績（1月）	計 画（2月）	
完了予定日：1月15日 	完了日：1月15日 	完了予定日：2月17日 	

【凡例】：計画散布範囲 ：実績散布範囲

平成30年1月31日時点

©Tokyo Electric Power Company Holdings, Inc. All Rights Reserved.

無断複製・転載禁止 東京電力ホールディングス株式会社

2

3.作業時散布の実績及び予定（1号機）

TEPCO

当該週の散布範囲								
日	17（月）	18（火）	19（水）	20（木）	21（金）	22（土）	23（日）	
散布対象作業	-	-	-	-	-	-	-	-
散布面積合計（m ² ）	-	-	-	-	-	-	-	-
平均散布量（L/m ² 回）	-	-	-	-	-	-	-	-
連続ダストモニタの計測値（Bq/cm ³ ）※1	1.95E-04（最大） ND（最小）	1.94E-04（最大） ND（最小）	2.23E-04（最大） ND（最小）	2.27E-04（最大） ND（最小）	2.13E-04（最大） ND（最小）	1.94E-04（最大） ND（最小）	1.25E-04（最大） ND（最小）	-
日	24（月）	25（火）	26（水）	27（木）	28（金）	29（土）	30（日）	-
散布対象作業	-	-	-	-	-	-	-	-
散布面積合計（m ² ）	-	-	-	-	-	-	-	-
平均散布量（L/m ² 回）	-	-	-	-	-	-	-	-
連続ダストモニタの計測値（Bq/cm ³ ）※1	1.21E-04（最大） ND（最小）	1.13E-04（最大） ND（最小）	1.71E-04（最大） ND（最小）	1.25E-04（最大） ND（最小）	1.67E-04（最大） ND（最小）	1.47E-04（最大） ND（最小）	1.31E-04（最大） ND（最小）	-
日	31（月）	1（火）	2（水）	3（木）	4（金）	5（土）	6（日）	-
散布対象作業	-	-	-	-	-	-	-	-
散布面積合計（m ² ）	-	-	-	-	-	-	-	-
平均散布量（L/m ² 回）	-	-	-	-	-	-	-	-
連続ダストモニタの計測値（Bq/cm ³ ）※1	1.49E-04（最大） ND（最小）	1.54E-04（最大） ND（最小）	1.40E-04（最大） ND（最小）	1.23E-04（最大） ND（最小）	1.73E-04（最大） ND（最小）	1.56E-04（最大） ND（最小）	1.32E-04（最大） ND（最小）	-
日	7（月）	8（火）	9（水）	10（木）	11（金）	12（土）	13（日）	-
散布対象作業	-	-	-	-	-	-	-	-
散布面積合計（m ² ）	-	-	-	-	-	-	-	-
平均散布量（L/m ² 回）	-	-	-	-	-	-	-	-
連続ダストモニタの計測値（Bq/cm ³ ）※1	1.70E-04（最大） ND（最小）	1.80E-04（最大） ND（最小）	1.19E-04（最大） ND（最小）	1.17E-04（最大） ND（最小）	1.75E-04（最大） ND（最小）	1.41E-04（最大） ND（最小）	1.51E-04（最大） ND（最小）	-
日	14（月）	15（火）	16（水）	17（木）	18（金）	19（土）	20（日）	-
散布対象作業	-	-	-	-	-	-	-	-
散布面積合計（m ² ）	-	-	-	-	-	-	-	-
平均散布量（L/m ² 回）	-	-	-	-	-	-	-	-
連続ダストモニタの計測値（Bq/cm ³ ）※1	1.51E-04（最大） ND（最小）	1.39E-04（最大） ND（最小）	1.65E-04（最大） ND（最小）	7.84E-05（最大） ND（最小）	1.22E-04（最大） ND（最小）	1.10E-04（最大） ND（最小）	1.63E-04（最大） ND（最小）	-
日	21（月）	22（火）	23（水）	24（木）	25（金）	26（土）	27（日）	-
散布対象作業	-	北側ガレキ撤去	-	-	-	-	-	-
散布面積合計（m ² ）	-	100	-	-	-	-	-	-
平均散布量（L/m ² 回）	-	5.0	-	-	-	-	-	-
連続ダストモニタの計測値（Bq/cm ³ ）※1	1.63E-04（最大） ND（最小）	1.05E-04（最大） ND（最小）	6.03E-05（最大） ND（最小）	1.41E-04（最大） ND（最小）	1.10E-04（最大） ND（最小）	2.35E-04（最大） ND（最小）	1.12E-04（最大） ND（最小）	-
日	28（月）	29（火）	30（水）	31（木）	1（金）	2（土）	3（日）	-
散布対象作業	-	北側ガレキ撤去	北側ガレキ撤去	-	-	-	-	-
散布面積合計（m ² ）	-	50	50	-	-	-	-	-
平均散布量（L/m ² 回）	-	9.4	9.6	-	-	-	-	-
連続ダストモニタの計測値（Bq/cm ³ ）※1	1.54E-04（最大） ND（最小）	1.63E-04（最大） ND（最小）	1.39E-04（最大） ND（最小）	-（最大） -（最小）	-（最大） -（最小）	-（最大） -（最小）	-（最大） -（最小）	-

※ 表記の連続ダストモニタ計測値は速報値、ND 不検出

平成30年1月31日時点

©Tokyo Electric Power Company Holdings, Inc. All Rights Reserved.

無断複製・転載禁止 東京電力ホールディングス株式会社

3

4.オペレーティングフロアの連続ダストモニタの計測値（3号機）



									当該週の散布範囲
12月	日	17 (日)	18 (月)	19 (火)	20 (水)	21 (木)	22 (金)	23 (土)	-
	散布対象作業 ^{※4}	-	-	-	-	-	-	-	
	散布面積合計 (m ²)	-	-	-	-	-	-	-	
	平均散布量 (L/m ² ・回) ^{※1}	-	-	-	-	-	-	-	
	連続ダストモニタの計測値 (Bq/cm ³) ^{※2}	2.79E-05 (最大) ND ^{※3} (最小)	5.51E-05 (最大) ND ^{※3} (最小)	3.74E-05 (最大) ND ^{※3} (最小)	1.31E-04 (最大) ND ^{※3} (最小)	2.71E-05 (最大) ND ^{※3} (最小)	1.66E-04 (最大) ND ^{※3} (最小)	2.95E-05 (最大) ND ^{※3} (最小)	
	日	24 (日)	25 (月)	26 (火)	27 (水)	28 (木)	29 (金)	30 (土)	
	散布対象作業 ^{※4}	-	-	-	-	-	-	-	
	散布面積合計 (m ²)	-	-	-	-	-	-	-	
	平均散布量 (L/m ² ・回) ^{※1}	-	-	-	-	-	-	-	
	連続ダストモニタの計測値 (Bq/cm ³) ^{※2}	2.54E-05 (最大) ND ^{※3} (最小)	2.63E-05 (最大) ND ^{※3} (最小)	2.48E-05 (最大) ND ^{※3} (最小)	3.70E-05 (最大) ND ^{※3} (最小)	2.67E-05 (最大) ND ^{※3} (最小)	2.74E-05 (最大) ND ^{※3} (最小)	2.43E-05 (最大) ND ^{※3} (最小)	
	日	31 (日)	1 (月)	2 (火)	3 (水)	4 (木)	5 (金)	6 (土)	
	散布対象作業 ^{※4}	-	-	-	-	-	-	-	
1月	散布面積合計 (m ²)	-	-	-	-	-	-	-	-
	平均散布量 (L/m ² ・回) ^{※1}	-	-	-	-	-	-	-	
	連続ダストモニタの計測値 (Bq/cm ³) ^{※2}	2.39E-05 (最大) ND ^{※3} (最小)	2.50E-05 (最大) ND ^{※3} (最小)	3.33E-05 (最大) ND ^{※3} (最小)	3.84E-05 (最大) ND ^{※3} (最小)	2.94E-05 (最大) ND ^{※3} (最小)	1.81E-05 (最大) ND ^{※3} (最小)	2.02E-05 (最大) ND ^{※3} (最小)	
	日	7 (日)	8 (月)	9 (火)	10 (水)	11 (木)	12 (金)	13 (土)	
	散布対象作業 ^{※4}	-	-	-	-	-	-	-	
	散布面積合計 (m ²)	-	-	-	-	-	-	-	
	平均散布量 (L/m ² ・回) ^{※1}	-	-	-	-	-	-	-	
	連続ダストモニタの計測値 (Bq/cm ³) ^{※2}	2.40E-05 (最大) ND ^{※3} (最小)	3.25E-05 (最大) ND ^{※3} (最小)	3.24E-05 (最大) ND ^{※3} (最小)	2.86E-05 (最大) ND ^{※3} (最小)	2.91E-05 (最大) ND ^{※3} (最小)	2.66E-05 (最大) ND ^{※3} (最小)	3.05E-05 (最大) ND ^{※3} (最小)	
	日	14 (日)	15 (月)	16 (火)	17 (水)	18 (木)	19 (金)	20 (土)	
	散布対象作業 ^{※4}	-	-	-	-	-	-	-	
	散布面積合計 (m ²)	-	-	-	-	-	-	-	
	平均散布量 (L/m ² ・回) ^{※1}	-	-	-	-	-	-	-	
	連続ダストモニタの計測値 (Bq/cm ³) ^{※2}	2.54E-05 (最大) ND ^{※3} (最小)	2.37E-05 (最大) ND ^{※3} (最小)	2.79E-05 (最大) ND ^{※3} (最小)	3.20E-05 (最大) ND ^{※3} (最小)	2.46E-05 (最大) ND ^{※3} (最小)	3.18E-05 (最大) ND ^{※3} (最小)	2.53E-05 (最大) ND ^{※3} (最小)	
	日	21 (日)	22 (月)	23 (火)	24 (水)	25 (木)	26 (金)	27 (土)	
	散布対象作業 ^{※4}	-	-	-	-	-	-	-	-
	散布面積合計 (m ²)	-	-	-	-	-	-	-	
	平均散布量 (L/m ² ・回) ^{※1}	-	-	-	-	-	-	-	
	連続ダストモニタの計測値 (Bq/cm ³) ^{※2}	2.82E-05 (最大) ND ^{※3} (最小)	2.53E-05 (最大) ND ^{※3} (最小)	2.14E-05 (最大) ND ^{※3} (最小)	3.70E-05 (最大) ND ^{※3} (最小)	4.02E-05 (最大) ND ^{※3} (最小)	2.51E-05 (最大) ND ^{※3} (最小)	2.67E-05 (最大) ND ^{※3} (最小)	
	日	28 (日)	29 (月)	30 (火)	31 (水)	1 (木)	2 (金)	3 (土)	
	散布対象作業 ^{※4}	-	-	-	-	-	-	-	
	散布面積合計 (m ²)	-	-	-	-	-	-	-	
	平均散布量 (L/m ² ・回) ^{※1}	-	-	-	-	-	-	-	
	連続ダストモニタの計測値 (Bq/cm ³) ^{※2}	2.39E-05 (最大) ND ^{※3} (最小)	4.29E-05 (最大) ND ^{※3} (最小)	2.99E-05 (最大) ND ^{※3} (最小)	- (最大) - (最小)	- (最大) - (最小)	- (最大) - (最小)	- (最大) - (最小)	

※1 平均散布量は作業前・作業後に分けて記載 ※2 表記の連続ダストモニタ計測値は速報値 ※3 ND=不検出 平成30年1月31日時点
※4 進めし休設置完了に伴い定期・作業時散布は終了
