


循環注水冷却スケジュール（1/2）

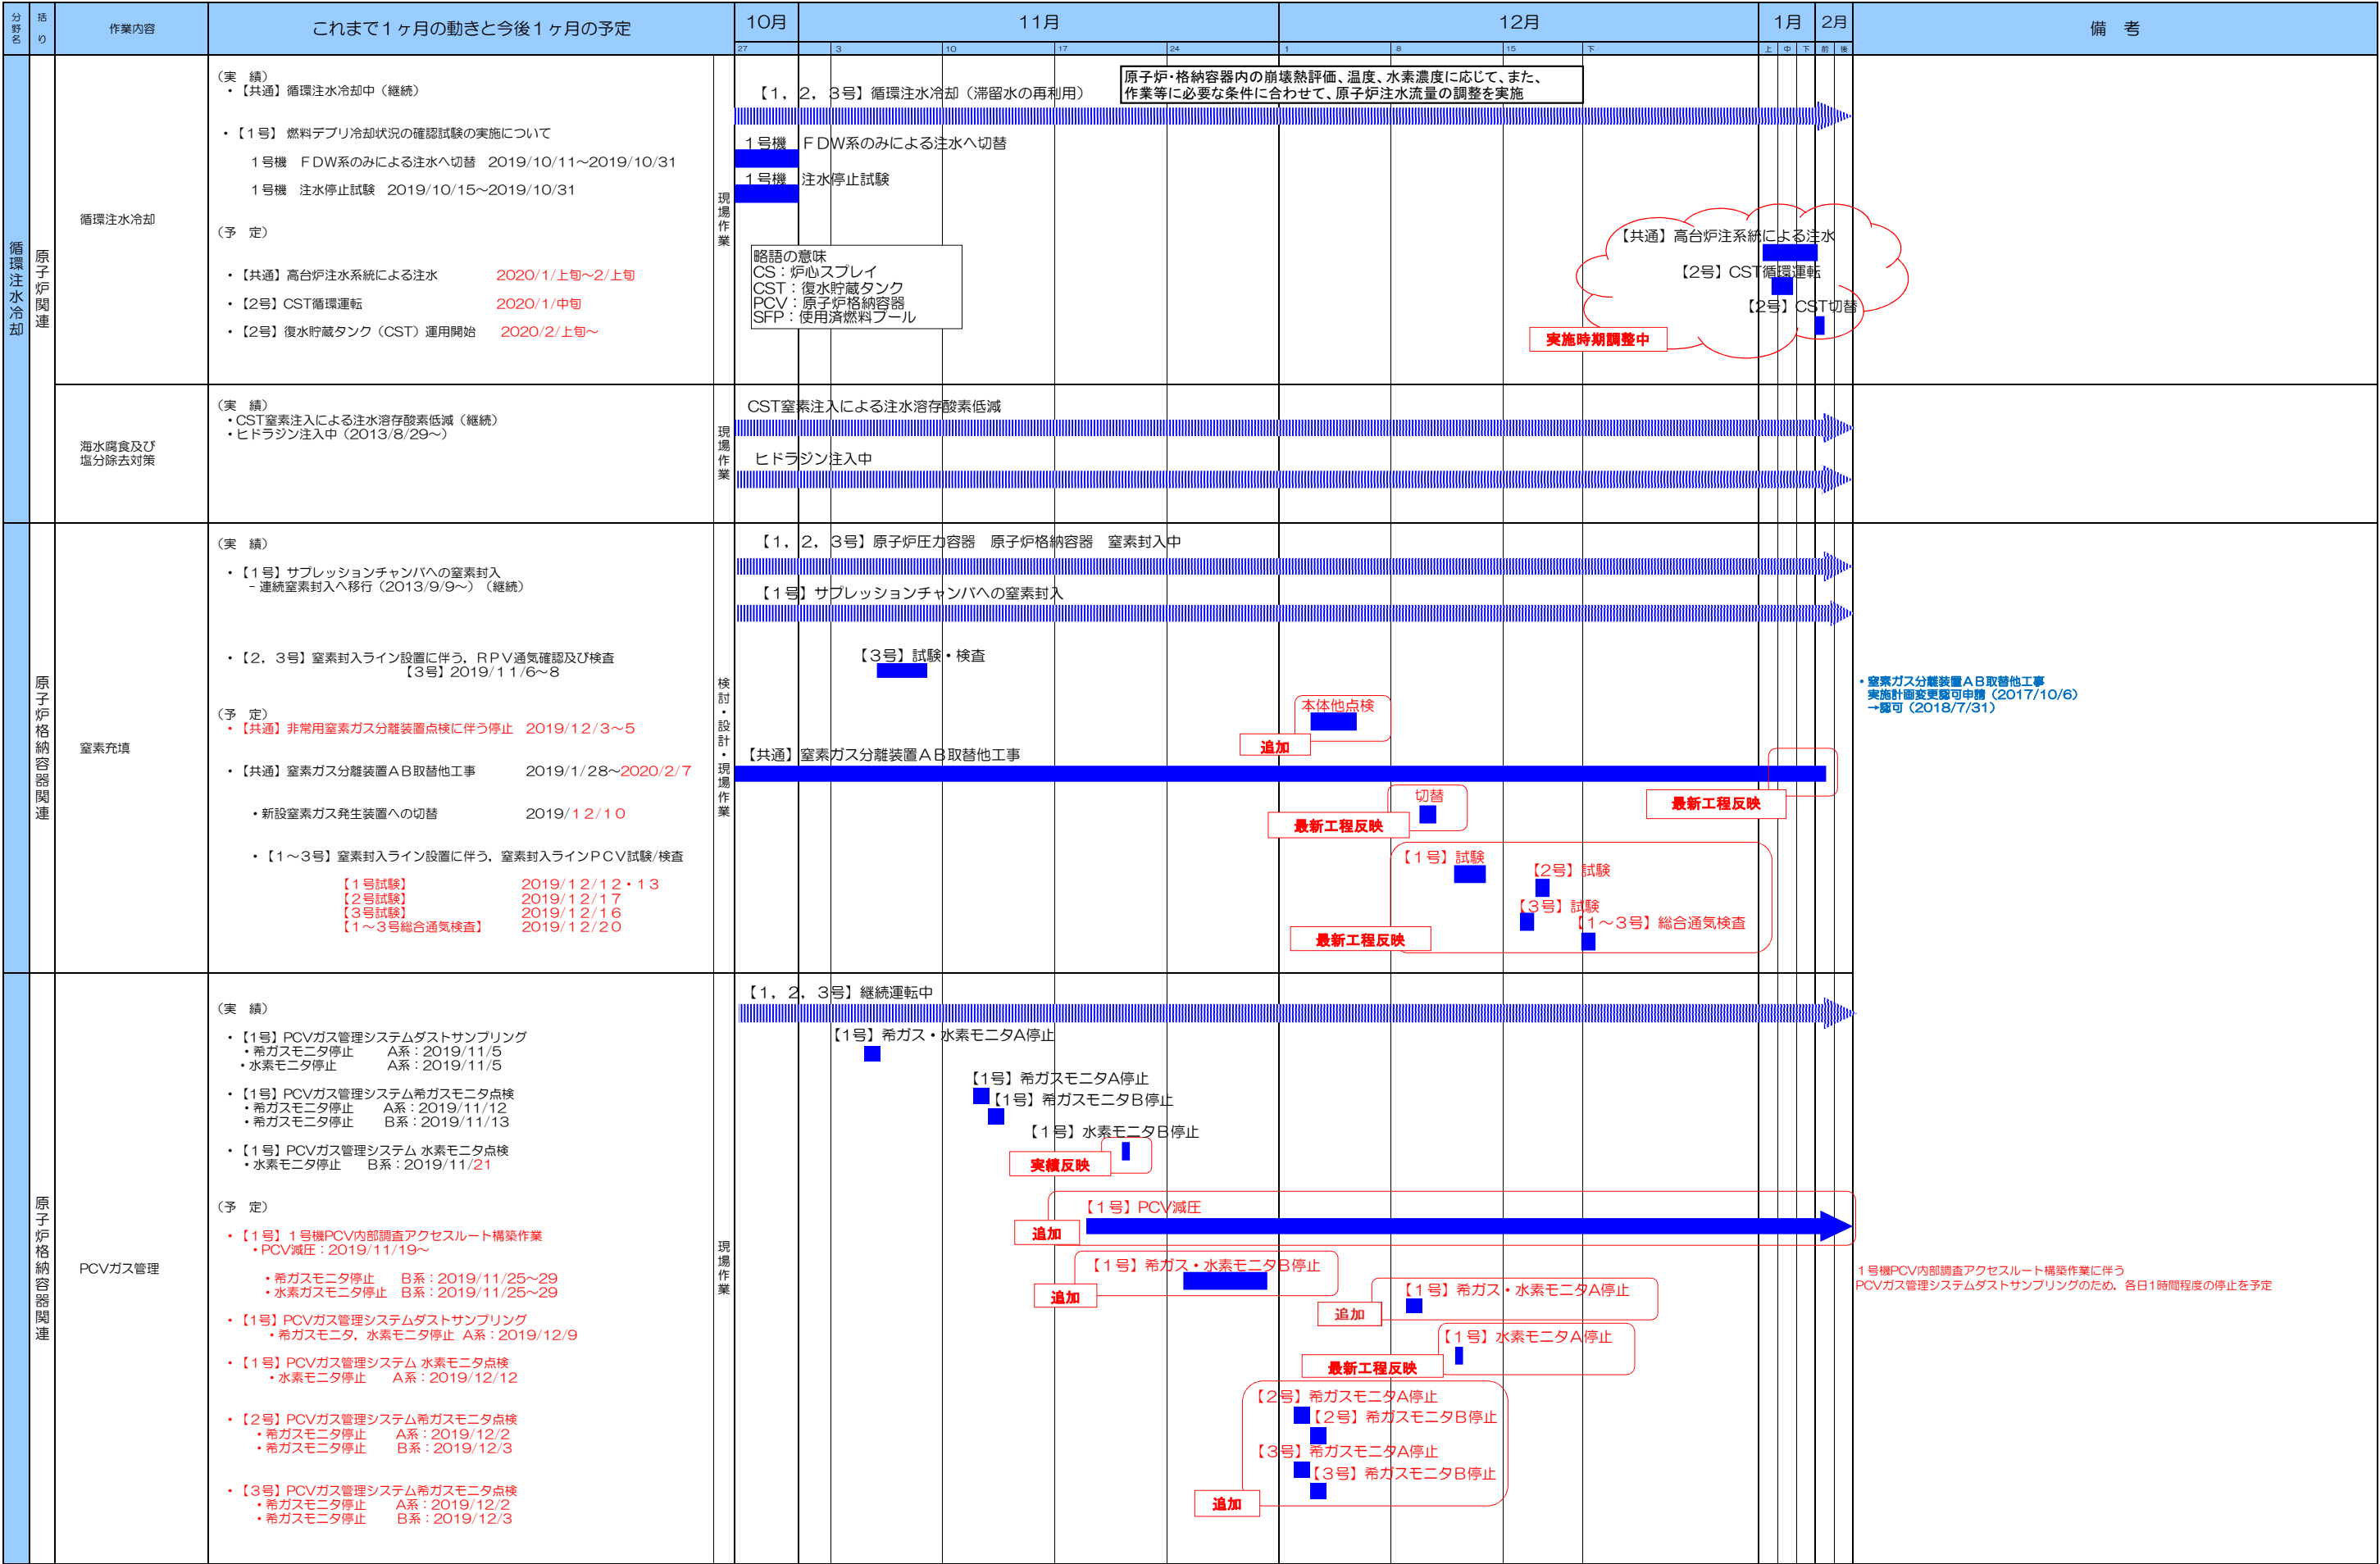

循環注水冷却スケジュール（2/2）

分野別	括り	作業内容	これまで1ヶ月の動きと今後1ヶ月の予定	10月	11月					12月				1月	2月	備 考			
				27	3	10	17	24	1	8	15	下	上	中	下		節	後	
使用済燃料プール関連		使用済燃料プール循環冷却	(実 績) ・【共通】循環冷却中(継続)	現場作業	【1, 2, 3号】循環冷却中														
		使用済燃料プールへの注水冷却	(実 績) ・【共通】使用済燃料プールへの非常時注水手段としてコンクリートポンプ車等の現場配備(継続)		現場作業	【1, 2, 3号】蒸発量に応じて、内部注水を実施													
		海水腐食及び塩分除去対策(使用済燃料プール薬注&塩分除去)	(実 績) ・【共通】プール水質管理中(継続)			検討・設計・現場作業	【1, 2, 3, 4号】ヒドラジン等注入による防												
					【1, 2, 3, 4号】プール水質管理														
