

1号機飛散防止剤散布実績及び連続ダストモニタ計測値

2021/04/27



東京電力ホールディングス株式会社

TEPCO

PN 


【凡例】
：散布範囲

約40m




約30m

オペフロ

建屋カバ

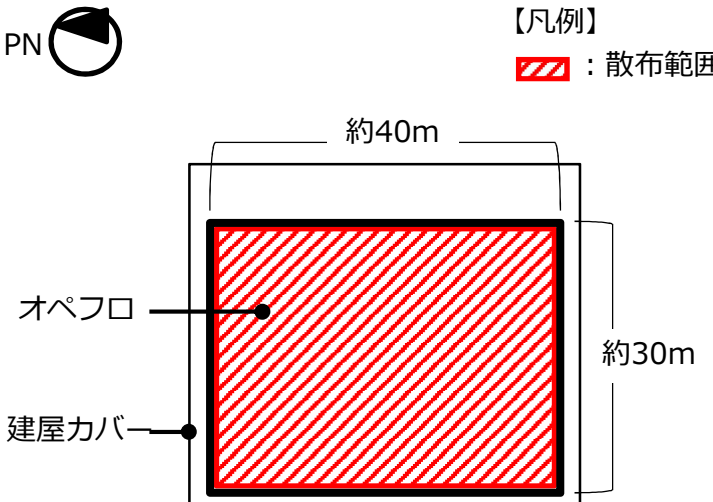

2.作業時散布・定期散布の実績及び予定（1号機）

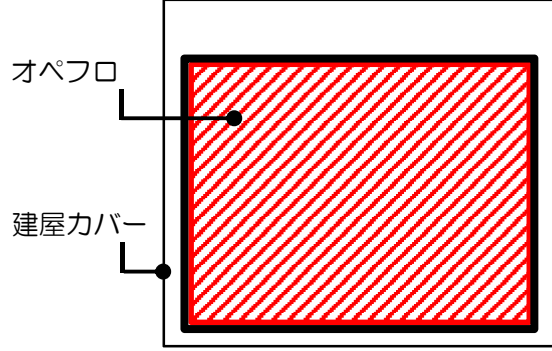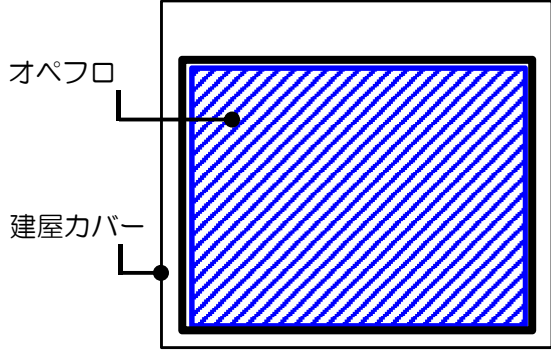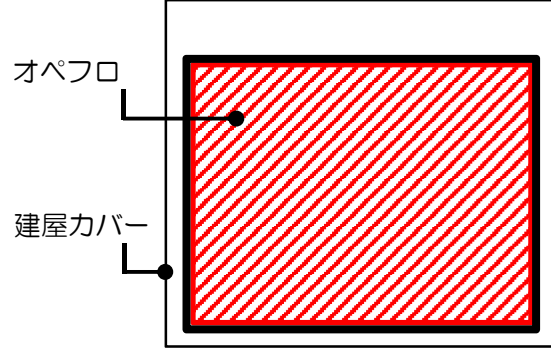
作業時散布			
目 的	オペフロ上での（ガレキ撤去や除染等）作業に応じて、飛散防止剤を散布し、ダストの飛散を抑制することを目的とする。		
標準散布量	1.5L/m ² 以上	濃 度	1/10
散布対象 作業	ガレキ撤去		
定期散布の実績及び予定			
計画（4月）	実績（4月）	計画（5月）	
完了予定日：4月10・23日 PN 	完了日：4月10・23日 PN 	完了予定日：5月17・18日 PN 	
			

【凡例】 ：計画散布範囲 ：実績散布範囲


2021年4月27日時点

3.作業時散布の実績及び予定（1号機）

								当該週の散布範囲
3月	月	21 (日)	22 (月)	23 (火)	24 (水)	25 (木)	26 (金)	27 (土)
	散布対象作業	—	—	—	—	—	—	—
	散布面積合計 (m2)	—	—	—	—	—	—	—
	平均散布量 (L/m2・回)	—	—	—	—	—	—	—
	連続ダストモニタの計測値 (Bq/cm3) ※1	5.91E-05 (最大) ND (最小)	7.75E-05 (最大) ND (最小)	9.65E-05 (最大) 8.91E-07 (最小)	1.54E-04 (最大) ND (最小)	8.34E-05 (最大) ND (最小)	8.30E-05 (最大) ND (最小)	1.07E-04 (最大) ND (最小)
	月	28 (日)	29 (月)	30 (火)	31 (水)	1 (木)	2 (金)	3 (土)
	散布対象作業	—	—	—	—	—	—	—
	散布面積合計 (m2)	—	—	—	—	—	—	—
	平均散布量 (L/m2・回)	—	—	—	—	—	—	—
	連続ダストモニタの計測値 (Bq/cm3) ※1	8.84E-05 (最大) ND (最小)	5.58E-05 (最大) ND (最小)	6.94E-05 (最大) ND (最小)	1.21E-04 (最大) ND (最小)	1.02E-04 (最大) ND (最小)	9.12E-05 (最大) ND (最小)	8.85E-05 (最大) ND (最小)
4月	月	4 (日)	5 (月)	6 (火)	7 (水)	8 (木)	9 (金)	10 (土)
	散布対象作業	—	—	—	—	—	—	—
	散布面積合計 (m2)	—	—	—	—	—	—	(定期散布実施)
	平均散布量 (L/m2・回)	—	—	—	—	—	—	(定期散布実施)
	連続ダストモニタの計測値 (Bq/cm3) ※1	1.18E-04 (最大) ND (最小)	1.21E-04 (最大) ND (最小)	1.02E-04 (最大) ND (最小)	9.93E-05 (最大) ND (最小)	9.39E-05 (最大) ND (最小)	7.48E-05 (最大) ND (最小)	8.30E-05 (最大) ND (最小)
	月	11 (日)	12 (月)	13 (火)	14 (水)	15 (木)	16 (金)	17 (土)
	散布対象作業	—	—	—	—	—	—	—
	散布面積合計 (m2)	—	—	—	—	—	—	—
	平均散布量 (L/m2・回)	—	—	—	—	—	—	—
	連続ダストモニタの計測値 (Bq/cm3) ※1	1.05E-04 (最大) ND (最小)	1.26E-04 (最大) ND (最小)	8.29E-05 (最大) ND (最小)	9.12E-05 (最大) ND (最小)	1.37E-04 (最大) ND (最小)	9.66E-05 (最大) ND (最小)	7.75E-05 (最大) ND (最小)
	月	18 (日)	19 (月)	20 (火)	21 (水)	22 (木)	23 (金)	24 (土)
	散布対象作業	—	—	—	—	—	—	—
	散布面積合計 (m2)	—	—	—	—	—	(定期散布実施)	—
	平均散布量 (L/m2・回)	—	—	—	—	—	(定期散布実施)	—
	連続ダストモニタの計測値 (Bq/cm3) ※1	1.13E-04 (最大) ND (最小)	1.73E-04 (最大) ND (最小)	8.30E-05 (最大) ND (最小)	1.29E-04 (最大) ND (最小)	1.35E-04 (最大) ND (最小)	1.07E-04 (最大) ND (最小)	9.65E-05 (最大) ND (最小)
	月	25 (日)	26 (月)	27 (火)	28 (水)	29 (木)	30 (金)	1 (土)
	散布対象作業	—	—	—	—	—	—	—
	散布面積合計 (m2)	—	—	—	—	—	—	—
	平均散布量 (L/m2・回)	—	—	—	—	—	—	—
	連続ダストモニタの計測値 (Bq/cm3) ※1	6.39E-05 (最大) ND (最小)	(最大) (最小)	(最大) (最小)	(最大) (最小)	(最大) (最小)	(最大) (最小)	(最大) (最小)



10日



23日

※1 表記の連続ダストモニタ計測値は速報値、ND=不検出

2021年4月25日時点
