

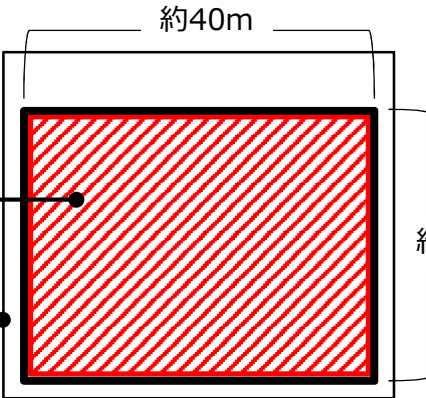
1号機飛散防止剤散布実績及び連続ダストモニタ計測値

2021/09/30

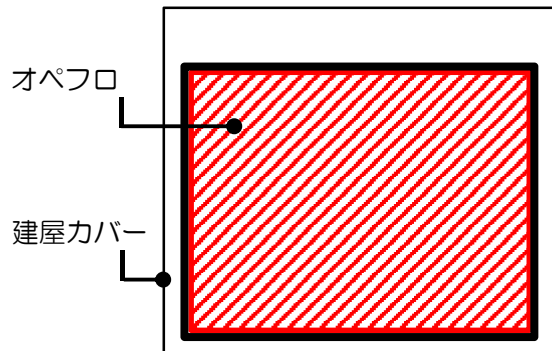
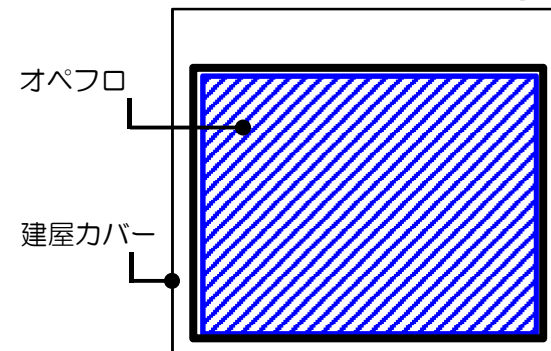
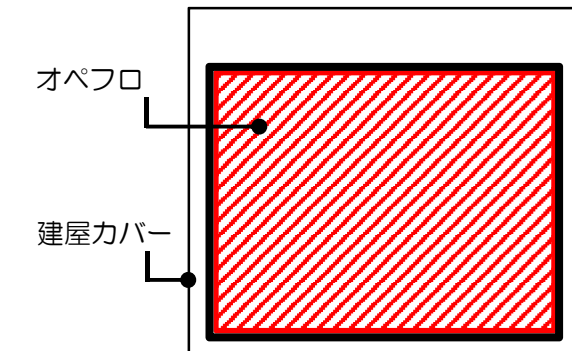


東京電力ホールディングス株式会社

1.定期散布（1号機）

定期散布	
目 的	オペレーティングフロア（以下、オペフロ）上へ飛散防止剤を定期的に散布し、ダストの飛散抑制効果を保持させることを目的とする。
頻 度	1回/月
標準散布量	1.5L/m ² 以上
濃 度	1/10
散布範囲	PN  【凡例】  : 散布範囲 約40m 約30m オペフロ 建屋カバー 
散布面積	1,234m ²


2.作業時散布・定期散布の実績及び予定（1号機）

作業時散布			
目 的	オペフロ上での（ガレキ撤去や除染等）作業に応じて、飛散防止剤を散布し、ダストの飛散を抑制することを目的とする。		
標準散布量	1.5L/m ² 以上	濃 度	1/10
散布対象 作業	ガレキ撤去		
定期散布の実績及び予定			
計画（9月）	実績（9月）	計画（10月）	
完了予定日：9月9・10日 オペフロ 建屋カバー 	完了日：9月9・10日 オペフロ 建屋カバー 	完了予定日：10月6・7日 オペフロ 建屋カバー 	

【凡例】 ：計画散布範囲 ：実績散布範囲

2021年9月30日時点

3.作業時散布の実績及び予定（1号機）

									当該週の散布範囲
8月	月	22 (日)	23 (月)	24 (火)	25 (水)	26 (木)	27 (金)	28 (土)	
	散布対象作業	—	—	—	—	—	—	—	
	散布面積合計 (m2)	—	—	—	—	—	—	—	
	平均散布量 (L/m2・回)	—	—	—	—	—	—	—	
	連続ダストモニタの計測値 (Bq/cm3) ※1	9.89E-05 (最大) ND (最小)	7.76E-05 (最大) ND (最小)	1.15E-04 (最大) ND (最小)	7.43E-05 (最大) 6.44E-07 (最小)	9.33E-05 (最大) ND (最小)	9.88E-05 (最大) ND (最小)	7.71E-05 (最大) ND (最小)	
	月	29 (日)	30 (月)	31 (火)	1 (水)	2 (木)	3 (金)	4 (土)	
	散布対象作業	—	—	—	—	—	—	—	
	散布面積合計 (m2)	—	—	—	—	—	—	—	
	平均散布量 (L/m2・回)	—	—	—	—	—	—	—	
	連続ダストモニタの計測値 (Bq/cm3) ※1	9.34E-05 (最大) ND (最小)	5.81E-05 (最大) ND (最小)	8.07E-05 (最大) ND (最小)	7.71E-05 (最大) ND (最小)	8.52E-05 (最大) ND (最小)	5.26E-05 (最大) ND (最小)	6.88E-05 (最大) ND (最小)	
9月	月	5 (日)	6 (月)	7 (火)	8 (水)	9 (木)	10 (金)	11 (土)	
	散布対象作業	—	—	—	—	—	—	—	
	散布面積合計 (m2)	—	—	—	—	(定期散布実施)	(定期散布実施)	—	
	平均散布量 (L/m2・回)	—	—	—	—	(定期散布実施)	(定期散布実施)	—	
	連続ダストモニタの計測値 (Bq/cm3) ※1	7.77E-05 (最大) ND (最小)	9.62E-05 (最大) ND (最小)	9.87E-05 (最大) ND (最小)	8.25E-05 (最大) ND (最小)	6.81E-05 (最大) ND (最小)	9.61E-05 (最大) ND (最小)	1.15E-04 (最大) 8.87E-07 (最小)	
	月	12 (日)	13 (月)	14 (火)	15 (水)	16 (木)	17 (金)	18 (土)	
	散布対象作業	—	—	—	—	—	—	—	
	散布面積合計 (m2)	—	—	—	—	—	—	—	
	平均散布量 (L/m2・回)	—	—	—	—	—	—	—	
	連続ダストモニタの計測値 (Bq/cm3) ※1	6.71E-05 (最大) ND (最小)	1.18E-04 (最大) ND (最小)	6.90E-05 (最大) ND (最小)	6.34E-05 (最大) ND (最小)	7.17E-05 (最大) ND (最小)	7.16E-05 (最大) ND (最小)	8.51E-05 (最大) ND (最小)	
	月	19 (日)	20 (月)	21 (火)	22 (水)	23 (木)	24 (金)	25 (土)	
	散布対象作業	—	—	—	—	—	—	—	
	散布面積合計 (m2)	—	—	—	—	—	—	—	
	平均散布量 (L/m2・回)	—	—	—	—	—	—	—	
	連続ダストモニタの計測値 (Bq/cm3) ※1	1.10E-04 (最大) ND (最小)	1.29E-04 (最大) ND (最小)	8.79E-05 (最大) ND (最小)	8.52E-05 (最大) ND (最小)	7.78E-05 (最大) ND (最小)	7.44E-05 (最大) ND (最小)	7.98E-05 (最大) ND (最小)	
	月	26 (日)	27 (月)	28 (火)	29 (水)	30 (木)	1 (金)	2 (土)	
	散布対象作業	—	—	—	—	—	—	—	
	散布面積合計 (m2)	—	—	—	—	—	—	—	
	平均散布量 (L/m2・回)	—	—	—	—	—	—	—	
	連続ダストモニタの計測値 (Bq/cm3) ※1	1.07E-04 (最大) ND (最小)	8.25E-05 (最大) ND (最小)	9.33E-05 (最大) ND (最小)	(最大) (最小)	(最大) (最小)	(最大) (最小)	(最大) (最小)	

※1 表記の連続ダストモニタ計測値は速報値、ND=不検出

2021年9月28日時点
