


労働環境改善スケジュール

分類	活り	作業内容	これまで1ヶ月の動きと今後6ヶ月の予定	10月		11月				12月			1月	2月	3月	4月	5月以降	備考				
				24	31	7	14	21	28	上	中	下	上	中	下	上	中		下			
労働環境改善	防護装備	1 防護装備の適正化検討	(実績) ・DS2マスク不要エリアの拡大の運用 ・全面マスク用アノラックの導入	検討・設計																		
			(予定) ・DS2マスク不要エリアの拡大の運用 ・全面マスク用アノラックの導入	現場作業																		
			※管理対象区域を3つのゾーンに区分し、各区分に応じた防護装備を着用することで、作業時の負荷軽減による作業性の向上を図る	現場作業																		
				現場作業																		
				現場作業																		
				現場作業																		
				現場作業																		
労働環境改善	人身安全	2 重傷災害撲滅、全災害発生状況の把握	(実績) ・協力企業との情報共有、安全施策の検討・評価 ・安全衛生推進協議会の開催：災害事例等の再発防止対策の周知等 ・作業毎の安全施策の実施（TBM-KY等） ・熱中症予防対策の実施（4～10月） ・福島第一原子力発電所における熱中症予防対策の実施状況の報告	現場作業																		
			(予定) ・協力企業との情報共有、安全施策の検討・評価 ・安全衛生推進協議会の開催：災害事例等の再発防止対策の周知等 ・作業毎の安全施策の実施（TBM-KY等） ・熱中症予防対策の実施（4～10月）	現場作業																		
				現場作業																		
				現場作業																		
				現場作業																		
				現場作業																		
				現場作業																		
労働環境改善	健康管理	3 長期健康管理の実施	(実績) ・検査対象者・医療機関等からの問い合わせ対応及び検査費用の精算手続き ・2021年度対象者（社員）への「白内障検査」（柏崎刈羽）実施 ・2021年度対象者（社員）への「白内障検査」（本社）実施	現場作業																		
			(予定) ・検査対象者・医療機関等からの問い合わせ対応及び検査費用の精算手続き	現場作業																		
				現場作業																		
				現場作業																		
				現場作業																		
				現場作業																		
				現場作業																		
労働環境改善	健康管理	4 継続的な医療職の確保と患者搬送の迅速化	(実績) ・1F救急医療室の2021年12月までの医師確保完了（固定医師1名+ローテーション支援医師） ・1F救急医療室の1～3月の勤務医師調整	検討・設計																		
			(予定) ・1F救急医療室の1～3月の勤務医師調整 ・1F救急医療室の4～6月の勤務医師調整	現場作業																		
				現場作業																		
				現場作業																		
				現場作業																		
				現場作業																		
				現場作業																		
労働環境改善	健康管理	5 感染症対策の実施	(実績) ・新型コロナウイルス感染症対策の実施 ・インフルエンザ予防接種の実施	現場作業																		
			(予定) ・新型コロナウイルス感染症対策の実施 ・インフルエンザ予防接種の実施	現場作業																		
				現場作業																		
				現場作業																		
				現場作業																		
				現場作業																		
				現場作業																		
労働環境改善	要員管理	6 作業員の確保状況と地元雇用率の実態把握	(実績) ・作業員の確保状況と地元雇用率についての調査・集計	検討・設計																		
			(予定) ・作業員の確保状況と地元雇用率についての調査・集計	現場作業																		
				現場作業																		
				現場作業																		
				現場作業																		
				現場作業																		
				現場作業																		
労働環境改善	要員管理	7 労働環境・就労実態に関する企業との取り組み	(実績) ・労働環境・就労実態に関する意見交換及び実態把握 ・意見交換及び実態把握に基づく解決策の検討・実施・結果のフィードバック ・相談窓口への連絡（処遇・労働条件等）への対応 ・作業員へのアンケートによる実態把握	検討・設計																		
			(予定) ・労働環境・就労実態に関する意見交換及び実態把握 ・意見交換及び実態把握に基づく解決策の検討・実施・結果のフィードバック ・相談窓口への連絡（処遇・労働条件等）への対応 ・作業員へのアンケートによる実態把握	現場作業																		
				現場作業																		
				現場作業																		
				現場作業																		
				現場作業																		
				現場作業																		

2021年11月17日15時現在で、福島第一原子力発電所で働く社員及び協力企業作業員等において、新型コロナウイルス累計感染者数は、104名(社員10名、派遣社員1名、協力企業作業員92名、取引先企業従業員1名)、うち、9月2日以降の累計感染者数はゼロ
視察者の受入れは、緊急事態宣言の解除に伴い、10月1日より再開

分野名	活り	作業内容	これまで1ヶ月の動きと今後6ヶ月の予定		10月		11月				12月			1月	2月	3月	4月	5月以降	備考
			24	31	7	14	21	28	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	

労働環境改善

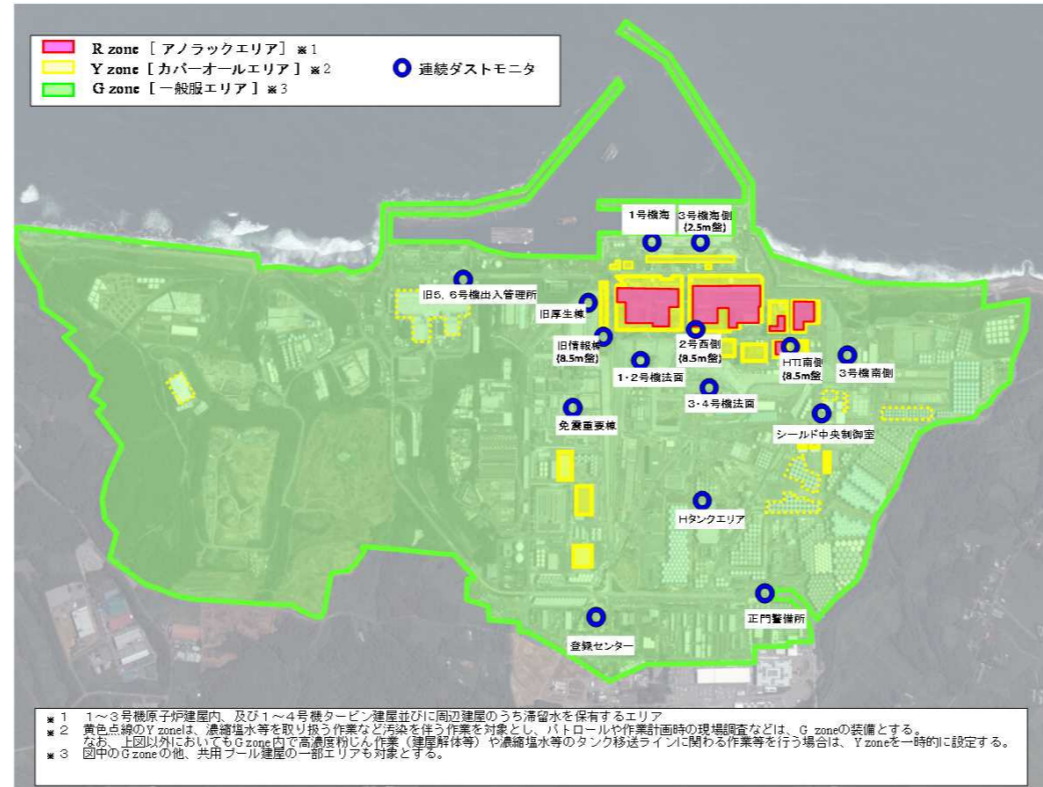

管理対象区域の運用区分 レイアウト

提供：日本ベースイメージング、©DigitalGlobe
