


労働環境改善スケジュール

分野	項目	作業内容	これまで1ヶ月の動きと今後6ヶ月の予定	12月		1月				2月			3月	4月	5月	6月	7月以降	備考			
				19	26	2	9	16	23	30	上	中	下	上	中	下	上		中	下	
労働環境改善	防護装備	1 防護装備の適正化検討 (実績) ・DS2マスク不要エリアの拡大の運用 ・全面マスク用アノラックの導入 (予定) ・DS2マスク不要エリアの拡大の運用 ・全面マスク用アノラックの導入 ※管理対象区域を3つのゾーンに区分し、各区分に応じた防護装備を着用することで、作業時の負荷軽減による作業性の向上を図る	検討・設計															全面マスク用アノラックの導入 仕様確定・発注手続き 最新工程反映			
			現場作業																	試作品改良・試着テスト3回目 最新工程反映 (継続実施)	
																					全面マスク用アノラックの使用 (継続実施)
																					DS2マスク不要エリアの拡大の運用 (継続実施)
労働環境改善	ヒューマンエラー防止	2 ヒューマンエラー発生防止 (実績) ・安全衛生推進協議会の開催：協力企業に対するヒューマンエラー発生防止の意識向上と基本動作の徹底等 (予定) ・安全衛生推進協議会の開催：協力企業に対するヒューマンエラー発生防止の意識向上と基本動作の徹底等	現場作業																協力企業に対するヒューマンエラー発生防止の意識向上と基本動作の徹底等 (継続実施)		
労働環境改善	人身安全	3 重傷災害撲滅、全災害発生状況の把握 (実績) ・協力企業との情報共有、安全施策の検討・評価 ・安全衛生推進協議会の開催：災害事例等の再発防止対策の周知等 ・作業毎の安全施策の実施（TBM-KY等） (予定) ・協力企業との情報共有、安全施策の検討・評価 ・安全衛生推進協議会の開催：災害事例等の再発防止対策の周知等 ・作業毎の安全施策の実施（TBM-KY等）	現場作業																情報共有、安全施策の検討・評価 (継続実施)		
労働環境改善	健康管理	4 長期健康管理の実施 (実績) ・検査対象者・医療機関等からの問い合わせ対応及び検査費用の精算手続き (予定) ・検査対象者・医療機関等からの問い合わせ対応及び検査費用の精算手続き	現場作業																健康相談受付 (継続実施)		
																				【検査受診期間】検査対象者・医療機関等からの問い合わせ対応及び検査費用精算手続き (継続実施)	
労働環境改善	健康管理	5 継続的な医療職の確保と患者搬送の迅速化 (実績) ・1F救急医療室の2022年3月までの医師確保完了（固定医師1名+0-7-703支援医師） ・1F救急医療室の1~3月の勤務医師調整 (予定) ・1F救急医療室の4~6月の勤務医師調整 ・1F救急医療室の7~9月の勤務医師調整	検討・設計																1F救急医療室の1~3月の勤務医師調整 実績反映 1F救急医療室の4~6月の勤務医師調整 1F救急医療室の7~9月の勤務医師調整		
			現場作業																		1F救急医療室3月までの医師確保完了 新規追加 (継続実施)
労働環境改善	健康管理	6 感染症対策の実施 (実績) ・新型コロナウイルス感染症対策の実施 ・インフルエンザ予防接種の実施 (予定) ・新型コロナウイルス感染症対策の実施 ・インフルエンザ予防接種の実施	現場作業																新型コロナウイルス感染症対策の実施 (継続実施)		
																				インフルエンザ予防接種の実施 2022年1月26日15時現在で、福島第一原子力発電所で働く社員及び協力企業作業員等において、新型コロナウイルス累計感染者数は、112名(社員13名、派遣社員1名、協力企業作業員97名、取引先企業従業員1名)のうち、9月2日以降の累計感染者数はゼロ。また、3回目の職域接種について検討中を開始視察者の受け入れは、1月25日より中止(当面の間)	
労働環境改善	要員管理	7 作業員の確保状況と地元雇用率の実態把握 (実績) ・作業員の確保状況と地元雇用率についての調査・集計 (予定) ・作業員の確保状況と地元雇用率についての調査・集計	検討・設計																作業員の確保状況調査依頼 作業員の確保状況集約 作業員の確保状況(12月実績/2月予定)と地元雇用率(12月実績)についての調査・集計 作業員の確保状況(1月実績/3月予定)と地元雇用率(1月実績)についての調査・集計 作業員の確保状況(2月実績/4月予定)と地元雇用率(2月実績)についての調査・集計		
			現場作業																		労働環境・就労実態に関する意見交換及び実態把握、解決策の検討・実施・結果のフィードバック (継続実施)
労働環境改善	要員管理	8 労働環境・就労実態に関する企業との取り組み (実績) ・労働環境・就労実態に関する意見交換及び実態把握 ・意見交換及び実態把握に基づく解決策の検討・実施・結果のフィードバック ・相談窓口への連絡(処遇・労働条件等)への対応 ・作業員へのアンケートによる実態把握 (予定) ・労働環境・就労実態に関する意見交換及び実態把握 ・意見交換及び実態把握に基づく解決策の検討・実施・結果のフィードバック ・相談窓口への連絡(処遇・労働条件等)への対応 ・作業員へのアンケートによる実態把握	検討・設計																労働環境・就労実態に関する意見交換及び実態把握、解決策の検討・実施・結果のフィードバック (継続実施)		
			現場作業																		作業員へのアンケート(第12回) 最新工程反映 公表(1/27)

分野 名 括 り	作業内容	これまで1ヶ月の動きと今後6ヶ月の予定		12月		1月		2月		3月	4月	5月	6月	7月以降	備考
		19	26	2	9	16	23	30	上	中	下	上	中	下	

労働環境改善

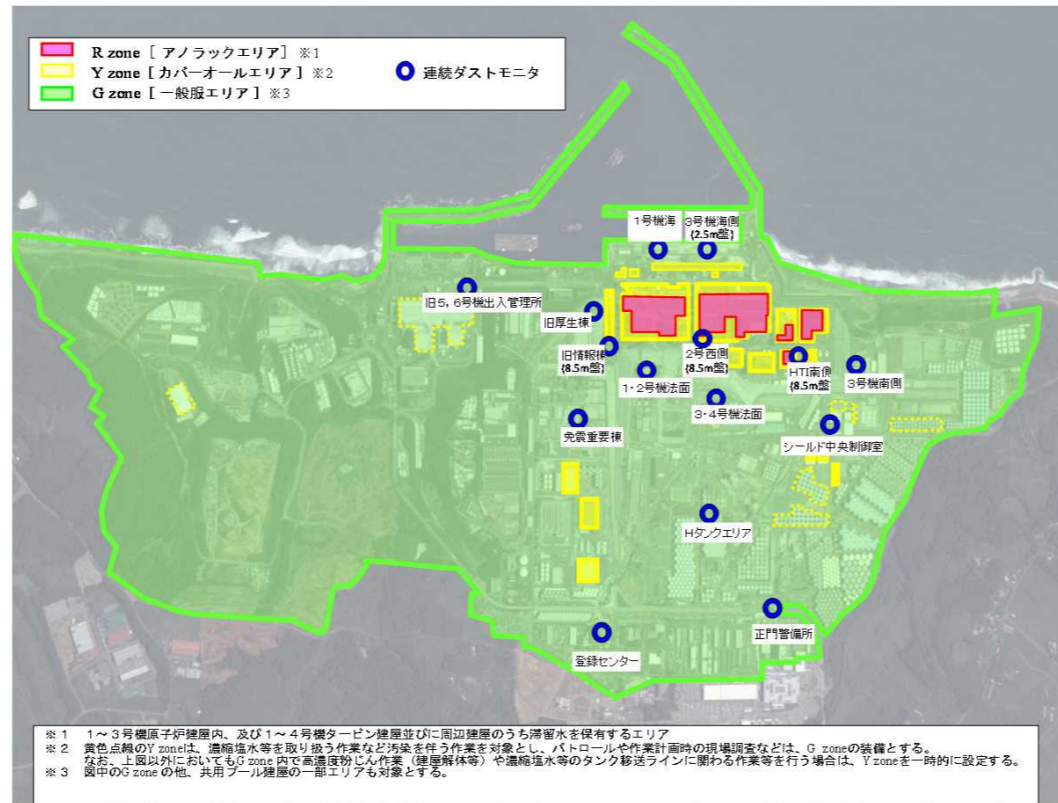

管理対象区域の運用区分 レイアウト

提供：日本スペースイメージング, ©DigitalGlobe
