

労働環境改善スケジュール


分野	項目	作業内容	これまで1ヶ月の動きと今後6ヶ月の予定	3月		4月				5月			6月	7月	8月	9月	10月以降	備考		
				28	2	9	10	23	30	7	14	21	28	5	12	19	26			
防護装備	1	防護装備の適正化検討	<p>(実績)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>DS2マスクを着用せずに作業する運用の定着、推進</li> </ul> <p>(予定)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>DS2マスクを着用せずに作業する運用の定着、推進</li> </ul> <p>※管理対象区域を3つのゾーンに区分し、各区分に応じた防護装備を着用することで、作業時の負荷軽減による作業性の向上を図る</p>	現場作業														(継続実施)		
ヒューマンエラー防止	2	ヒューマンエラー発生防止	<p>(実績)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>安全衛生推進協議会の開催：協力企業に対するヒューマンエラー発生防止の意識向上と基本動作の徹底等</li> </ul> <p>(予定)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>安全衛生推進協議会の開催：協力企業に対するヒューマンエラー発生防止の意識向上と基本動作の徹底等</li> </ul>	現場作業															(継続実施)	
																			四半期毎に実施している不適合やヒューマンエラーの分析結果を踏まえ、安全衛生推進協議会にて四半期に一回程度、協力企業に対しヒューマンエラー発生防止の意識向上と基本動作の徹底等を啓発予定	
人身安全	3	重傷災害撲滅、全災害発生状況の把握	<p>(実績)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>協力企業との情報共有、安全施策の検討・評価</li> <li>安全衛生推進協議会の開催：災害事例等の再発防止対策の周知等</li> <li>作業毎の安全施策の実施（TBM-KY等）</li> <li>熱中症予防対策の実施（4～10月）</li> <li>2022年度災害発生状況、2023年度安全活動計画（4/27公表）</li> </ul> <p>(予定)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>協力企業との情報共有、安全施策の検討・評価</li> <li>安全衛生推進協議会の開催：災害事例等の再発防止対策の周知等</li> <li>作業毎の安全施策の実施（TBM-KY等）</li> <li>熱中症予防対策の実施（4～10月）</li> </ul>	現場作業															(継続実施)	
																			新規追加 ▼2022年度災害発生状況、2023年度安全活動計画（4/27公表） 新規追加 熱中症予防対策の実施（4～10月） (10月まで継続実施)	
労働環境改善	4	長期健康管理の実施	<p>(実績)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>検査対象者・医療機関等からの問い合わせ対応及び検査費用の精算手続き</li> <li>2023年度対象者（社員）への「がん検査」案内に向けた準備</li> </ul> <p>(予定)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>検査対象者・医療機関等からの問い合わせ対応及び検査費用の精算手続き</li> </ul>	現場作業															(継続実施)	
																			【検査受診期間】検査対象者・医療機関等からの問い合わせ対応及び検査費用精算手続き、2023年度「がん検査」案内準備(社員) (継続実施)	
健康管理	5	継続的な医療職の確保と患者搬送の迅速化	<p>(実績)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1F救急医療室の2023年7月までの医師確保完了（固定医師1名＋ローテーション支援医師）</li> <li>1F救急医療室の5～7月の勤務医師調整</li> </ul> <p>(予定)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1F救急医療室の8～10月の勤務医師調整</li> <li>1F救急医療室の11～1月の勤務医師調整</li> </ul>	検討・設計															新規追加 (10月まで継続実施)	
																			1F救急医療室の5～7月の勤務医師調整 1F救急医療室の8～10月の勤務医師調整 1F救急医療室の11～1月の勤務医師調整 1F救急医療室7月までの医師確保完了 新規追加	
労働環境改善	6	感染症対策の実施	<p>(実績)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>新型コロナウイルス感染症対策の実施</li> </ul> <p>(予定)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>新型コロナウイルス感染症対策の実施</li> </ul>	現場作業																2023年4月26日現在、福島第一原子力発電所で働く社員及び協力企業作業員等において、新型コロナウイルス累計感染者数は、前回公表値（3月29日現在）から11名(社員2名、協力企業作業員9名)増加し、1,702名(社員282名、協力企業作業員1,475名、取引先企業従業員3名、派遣社員2名)
労働環境改善	7	作業員の確保状況と地元雇用率の実態把握	<p>(実績)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>作業員の確保状況と地元雇用率についての調査・集計</li> </ul> <p>(予定)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>作業員の確保状況と地元雇用率についての調査・集計</li> </ul>	検討・設計																
																			▼作業員の確保状況調査依頼 作業員の確保状況集約▼ ▽作業員の確保状況調査依頼 作業員の確保状況集約 ▽作業員の確保状況調査依頼	
労働環境改善	8	労働環境・就労実態に関する企業との取り組み	<p>(実績)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>労働環境・就労実態に関する意見交換及び実態把握</li> <li>意見交換及び実態把握に基づく解決策の検討・実施</li> <li>相談窓口への連絡（処遇・労働条件等）への対応</li> </ul> <p>(予定)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>労働環境・就労実態に関する意見交換及び実態把握</li> <li>意見交換及び実態把握に基づく解決策の検討・実施</li> <li>相談窓口への連絡（処遇・労働条件等）への対応</li> </ul>	検討・設計																(継続実施)
																				労働環境・就労実態に関する意見交換及び実態把握、解決策の検討・実施・結果のフィードバック

区分 括り	作業内容	これまで1ヶ月の動きと今後6ヶ月の予定		3月					4月					5月			6月		7月		8月		9月		10月以降		備考
		26	2	9	16	23	30	6	13	20	27	4	11	18	25	1	8	15	22	29	5	12	19	26			

廃炉中長期実行プラン2023

年度		2022(実績)	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
その他	その他	管理対象区域内の企業棟整備（計画的に順次整備する）												
		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>&lt;凡例&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><span style="display: inline-block; width: 20px; height: 10px; background-color: yellow; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></span> : 作業の期間</li> <li><span style="display: inline-block; width: 20px; height: 10px; border: 1px dashed black; margin-right: 5px;"></span> : 変更が見込まれる期間</li> <li><span style="display: inline-block; width: 20px; height: 10px; border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black; margin-right: 5px;"></span> : 工程間の関連</li> <li><span style="display: inline-block; width: 20px; height: 10px; background-color: orange; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></span> : 追加した工程</li> <li><span style="display: inline-block; width: 20px; height: 10px; background-color: lightgreen; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></span> : 変更した工程</li> <li><span style="display: inline-block; width: 20px; height: 10px; background-color: gray; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></span> : 実施を取り止めた工程</li> </ul> </div>												

注：今後の検討に応じて、記載内容には変更があり得る

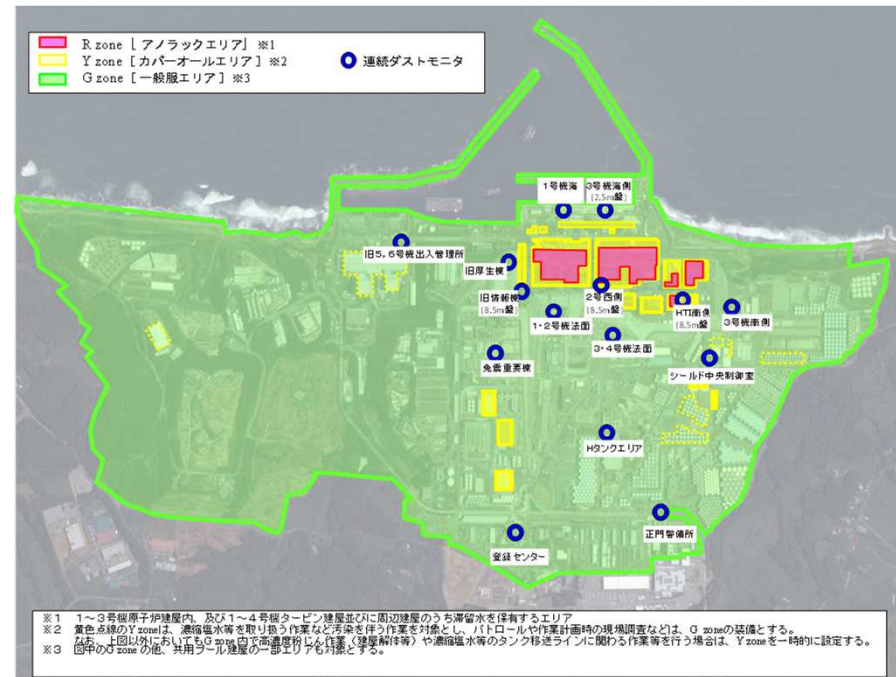

管理対象区域の運用区分 レイアウト 提供：日本スペースイメージング、©DigitalGlobe
