

労働環境改善スケジュール

分野	括り	作業内容	これまで1ヶ月の動きと今後6ヶ月の予定	4月		5月				6月			7月	8月	9月	10月	11月以降	備考		
				23	30	7	14	21	28	上	中	下	上	中	下	上	中		下	
労働環境改善	防護装備	1 防護装備の適正化検討	(実績) ・DS2マスク不要作業でのDS2マスクを着用しない運用の定着、推進 ・DS2マスクを着用せずに作業する運用の定着、推進	現場作業				記載変更 DS2マスク不要作業でのDS2マスクを着用しない運用の定着、推進 DS2マスクを着用せずに作業する運用の定着、推進										(継続実施)		
			(予定) ・DS2マスク不要作業でのDS2マスクを着用しない運用の定着、推進 ・DS2マスクを着用せずに作業する運用の定着、推進																	
	ヒューマンエラー防止	2 ヒューマンエラー発生防止	(実績) ・安全衛生推進協議会の開催：協力企業に対するヒューマンエラー発生防止の意識向上と基本動作の徹底等	現場作業			新規追加 2022年度4Qにおける信頼喪失に繋がる事象・ヒューマンエラー等の発生状況及びヒューマンパフォーマンスツールの活用について説明(5/11)												(継続実施)	
			(予定) ・安全衛生推進協議会の開催：協力企業に対するヒューマンエラー発生防止の意識向上と基本動作の徹底等																	
	人身安全	3 重傷災害撲滅、全災害発生状況の把握	(実績) ・協力企業との情報共有、安全施策の検討・評価 ・安全衛生推進協議会の開催：災害事例等の再発防止対策の周知等 ・作業毎の安全施策の実施(TBM-KY等) ・熱中症予防対策の実施(4~10月) ・2022年度災害発生状況、2023年度安全活動計画(4/27公表)	現場作業			▼2022年度災害発生状況、2023年度安全活動計画(4/27公表)			情報共有、安全施策の検討・評価									(継続実施)	
			(予定) ・協力企業との情報共有、安全施策の検討・評価 ・安全衛生推進協議会の開催：災害事例等の再発防止対策の周知等 ・作業毎の安全施策の実施(TBM-KY等) ・熱中症予防対策の実施(4~10月)																	
	健康管理	4 長期健康管理の実施	(実績) ・検査対象者・医療機関等からの問い合わせ対応及び検査費用の精算手続き	現場作業						健康相談受付										(継続実施)
			(予定) ・検査対象者・医療機関等からの問い合わせ対応及び検査費用の精算手続き																	
健康管理	5 継続的な医療職の確保と患者搬送の迅速化	(実績) ・1F救急医療室の2023年7月までの医師確保完了(固定医師1名+ローテーション支援医師)	検討・設計																	
		(予定) ・1F救急医療室の8~10月の勤務医師調整 ・1F救急医療室の11~1月の勤務医師調整																		
健康管理	6 感染症対策の実施	(実績) ・新型コロナウイルス感染症対策の実施	現場作業																	
		(予定) ・新型コロナウイルス感染症対策の実施																		
要員管理	7 作業員の確保状況と地元雇用率の実態把握	(実績) ・作業員の確保状況と地元雇用率についての調査・集計	検討・設計			▼作業員の確保状況調査依頼			作業員の確保状況集約											
		(予定) ・作業員の確保状況と地元雇用率についての調査・集計																		
労働環境改善	8 労働環境・就労実態に関する企業との取り組み	(実績) ・労働環境・就労実態に関する意見交換及び実態把握 ・意見交換及び実態把握に基づく解決策の検討・実施・結果のフィードバック ・相談窓口への連絡(処遇・労働条件等)への対応	検討・設計						労働環境・就労実態に関する意見交換及び実態把握、解決策の検討・実施、結果のフィードバック										(継続実施)	
		(予定) ・労働環境・就労実態に関する意見交換及び実態把握 ・意見交換及び実態把握に基づく解決策の検討・実施・結果のフィードバック ・相談窓口への連絡(処遇・労働条件等)への対応																		

2023年5月7日現在、福島第一原子力発電所で働く社員及び協力企業作業員等において、新型コロナウイルス累計感染者数は、前回公表値(4月26日現在)から1名(社員1名)増加し、1,763名(社員283名、協力企業作業員1,475名、取引先企業従業員3名、派遣社員2名)


区分 名	作業内容	これまで1ヶ月の動きと今後6ヶ月の予定		4月		5月				6月		7月	8月	9月	10月	11月以降	備考
		23	30	7	14	21	28	上	中	下	上	中	下	上	中	下	

廃炉中長期実行プラン2023

年度	2022(実績)	2023	2024	2025	2028	2034	
	その他		管理対象区域内の企業棟整備 (計画的に順次整備する)				

<凡例>

- 作業の期間
- 変更が見込まれる期間
- 工程間の関連
- 追加した工程
- 変更した工程
- 実施を取り止めた工程

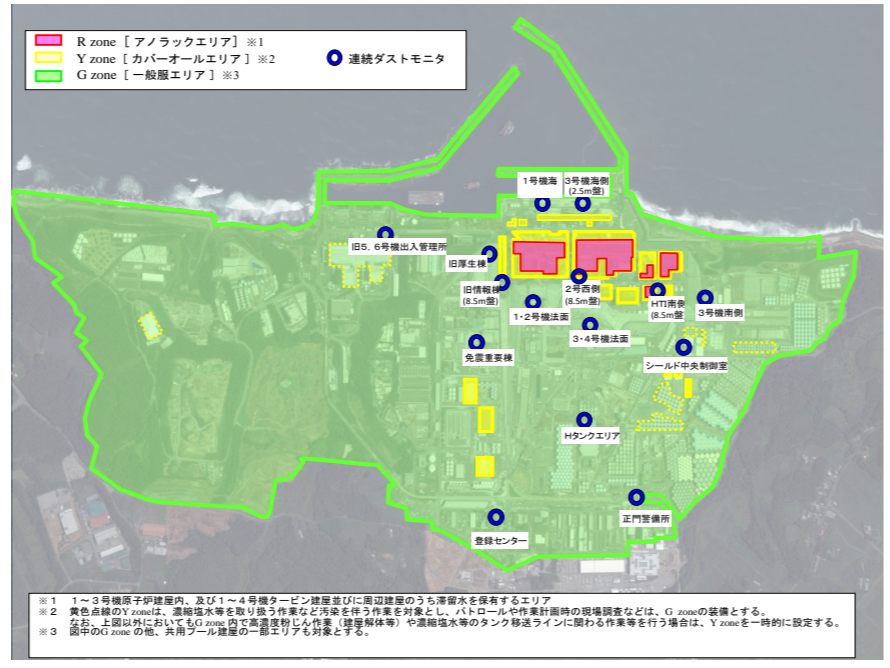

注：今後の検討に応じて、記載内容には変更があり得る

管理対象区域の運用区分 レイアウト 提供：日本スペースイメージング、©DigitalGlobe

労働環境改善
