

労働環境改善スケジュール


分野名	括り	作業内容	これまで1ヶ月の動きと今後6ヶ月の予定	5月		6月				7月			8月	9月	10月	11月	12月以降	備考	
				21	28	4	11	18	25	上	中	下	上	中	下	上	中		下
労働環境改善	防護装備	1 防護装備の適正化検討	<p>(実績)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>DS2マスク不要作業でのDS2マスクを着用しない運用の定着、推進</li> </ul> <p>(予定)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>DS2マスク不要作業でのDS2マスクを着用しない運用の定着、推進</li> </ul> <p>※管理対象区域を3つのゾーンに区分し、各区分に応じた防護装備を着用することで、作業時の負荷軽減による作業性の向上を図る</p>	現場作業	DS2マスク不要作業でのDS2マスクを着用しない運用の定着、推進														(継続実施)
	ヒューマンエラー防止	2 ヒューマンエラー発生防止	<p>(実績)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>安全衛生推進協議会の開催：協力企業に対するヒューマンエラー発生防止の意識向上と基本動作の徹底等</li> </ul> <p>(予定)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>安全衛生推進協議会の開催：協力企業に対するヒューマンエラー発生防止の意識向上と基本動作の徹底等</li> </ul>	現場作業	協力企業に対するヒューマンエラー発生防止の意識向上と基本動作の徹底等														(継続実施)
	人身安全	3 重傷災害撲滅、全災害発生状況の把握	<p>(実績)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>協力企業との情報共有、安全施策の検討・評価</li> <li>安全衛生推進協議会の開催：災害事例等の再発防止対策の周知等</li> <li>作業毎の安全施策の実施（TBM-KY等）</li> <li>熱中症予防対策の実施（4～10月）</li> </ul> <p>(予定)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>協力企業との情報共有、安全施策の検討・評価</li> <li>安全衛生推進協議会の開催：災害事例等の再発防止対策の周知等</li> <li>作業毎の安全施策の実施（TBM-KY等）</li> <li>熱中症予防対策の実施（4～10月）</li> </ul>	現場作業	情報共有、安全施策の検討・評価 熱中症予防対策の実施（4～10月）														(継続実施)
		4 長期健康管理の実施	<p>(実績)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>検査対象者・医療機関等からの問い合わせ対応及び検査費用の精算手続き</li> <li>2023年度対象者（退職者及び協力企業作業員）への検査案内に向けた準備</li> </ul> <p>(予定)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>検査対象者・医療機関等からの問い合わせ対応及び検査費用の精算手続き</li> <li>2023年度対象者（退職者及び協力企業作業員）への検査案内に向けた準備</li> </ul>	現場作業	健康相談受付 【検査受診期間】検査対象者・医療機関等からの問い合わせ対応及び検査費用精算手続き、2023年度対象者（退職者及び協力企業作業員）への検査案内に向けた準備														(継続実施)
健康管理	5 継続的な医療職の確保と患者搬送の迅速化	<p>(実績)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1F救急医療室の2023年7月までの医師確保完了（固定医師1名＋ローテーション支援医師）</li> </ul> <p>(予定)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1F救急医療室の8～10月の勤務医師調整</li> <li>1F救急医療室の11～1月の勤務医師調整</li> </ul>	検討・設計	1F救急医療室の8～10月の勤務医師調整														1F救急医療室の11～1月の勤務医師調整	
	6 感染症対策の実施	<p>(実績)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>新型コロナウイルス感染症対策の実施</li> </ul> <p>(予定)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>新型コロナウイルス感染症対策の実施</li> </ul>	現場作業	新型コロナウイルス感染症対策の実施														最新工程反映 対策終了時期調整中	
要員管理	7 作業員の確保状況と地元雇用率の実態把握	<p>(実績)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>作業員の確保状況と地元雇用率についての調査・集計</li> </ul> <p>(予定)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>作業員の確保状況と地元雇用率についての調査・集計</li> </ul>	検討・設計	▼作業員の確保状況調査依頼 作業員の確保状況集約▼ 作業員の確保状況(5月実績/7月予定)と地元雇用率(5月実績)についての調査・集計														作業員の確保状況集約 ▼作業員の確保状況調査依頼 作業員の確保状況(7月実績/9月予定)と地元雇用率(7月実績)についての調査・集計	
	8 労働環境・就労実態に関する企業との取り組み	<p>(実績)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>労働環境・就労実態に関する意見交換及び実態把握</li> <li>意見交換及び実態把握に基づく解決策の検討・実施・結果のフィードバック</li> <li>相談窓口への連絡（処遇・労働条件等）への対応</li> </ul> <p>(予定)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>労働環境・就労実態に関する意見交換及び実態把握</li> <li>意見交換及び実態把握に基づく解決策の検討・実施・結果のフィードバック</li> <li>相談窓口への連絡（処遇・労働条件等）への対応</li> </ul>	検討・設計	労働環境・就労実態に関する意見交換及び実態把握、解決策の検討・実施・結果のフィードバック														(継続実施)	

2023年6月7日現在、福島第一原子力発電所で働く社員及び協力企業作業員等において、新型コロナウイルス累計感染者数は、前回公表値(4月26日現在)から1名(社員1名)増加し、1,769名(社員283名、協力企業作業員1,475名)、取引先企業従業員8名、派遣社員2名)

分野名	括弧	作業内容	これまで1ヶ月の動きと今後6ヶ月の予定		5月		6月			7月			8月	9月	10月	11月	12月以降	備考
			21	28	4	11	18	25	上	中	下	上	中	下	上	中	下	

廃炉中長期実行プラン2023

年度		2022(実績)	2023	2024	2025	2028	2034
その他	その他	管理対象区域内の企業棟整備 (計画的に順次整備する)					
		<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 40%;"> <p>&lt;凡例&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><span style="display: inline-block; width: 20px; height: 10px; background-color: yellow; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></span> : 作業の期間</li> <li><span style="display: inline-block; width: 20px; height: 10px; background-color: lightyellow; border: 1px dashed black; margin-right: 5px;"></span> : 変更が見込まれる期間</li> <li><span style="display: inline-block; width: 20px; height: 10px; border-left: 1px solid black; margin-right: 5px;"></span> : 工程間の関連</li> <li><span style="display: inline-block; width: 20px; height: 10px; background-color: orange; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></span> : 追加した工程</li> <li><span style="display: inline-block; width: 20px; height: 10px; background-color: yellow; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></span> : 変更した工程</li> <li><span style="display: inline-block; width: 20px; height: 10px; background-color: gray; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></span> : 実施を取り止めた工程</li> </ul> </div> <div style="width: 55%;"> <p>注：今後の検討に応じて、記載内容には変更があり得る</p> </div> </div>					

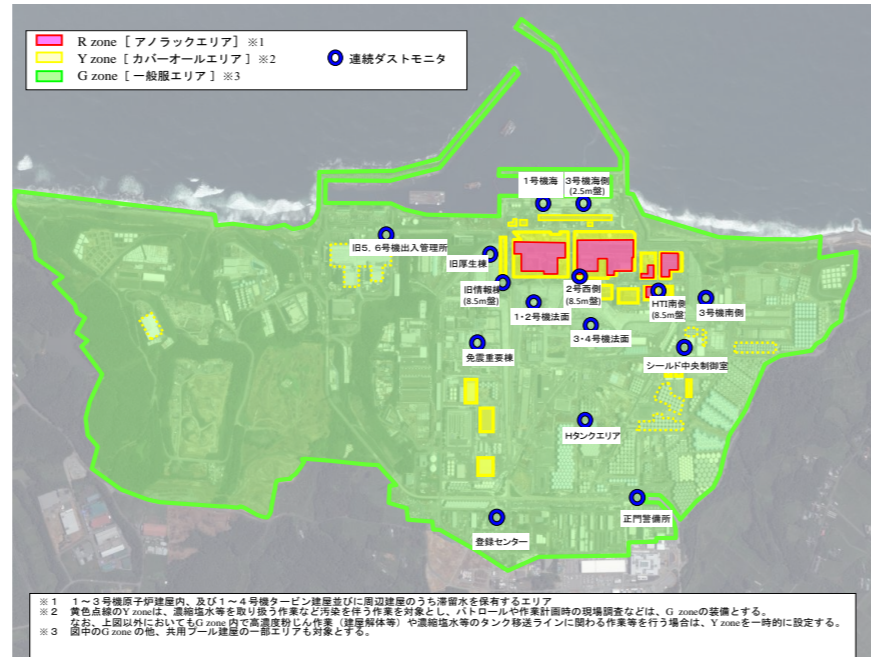

管理対象区域の運用区分 レイアウト 提供：日本スペースイメージング、©DigitalGlobe

労働環境改善
